



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना निर्देशकको कार्यालय  
हरिहरभवन, ललितपुर



RURAL ENTERPRISE AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT (REED)

Office of the Project Director

Hariharbhawan, Lalitpur

प्रथम त्रैमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०७९/८०

स्वागतम्

मिति: २०७९/०७/२४

स्थान: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार

# प्रस्तुतीको खाका

१. आयोजनाको संक्षिप्त परिचय
२. चालु आ.व २०७९/८० को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा
३. आयोजनाको दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था
४. प्रगति कम हुनुका कारणहरु
५. आयोजनाको हाल सम्मको कार्यान्वयन अवस्था
६. आयोजना कार्यान्वयनका समस्याहरु

# आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी



# आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

## आयोजना

## ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना सम्झौता मिति

२१ डिसेम्बर २०२० (२०७७ पुष ६)

आयोजना प्रभावकारी भएको मिति

१९ मार्च २०२१ (२०७७ चैत्र ६)

आयोजना समाप्ती मिति

१५ जुलाई २०२५ (२०८२ आषाढ ३१)

आयोजना अवधि

सन् २०२१ - २०२५ सम्म (५ वर्ष )

आयोजनाको कुल लागत  
(मिलियन अमेरिकी डलर)

१२० (दातृ निकाय: ८०, लाभग्राहीको योगदान: ४०)

दातृ निकाय

विश्व बैंक

आयोजना कार्यान्वयन निकाय

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

आयोजना लागू हुने प्रदेश संख्या

६ (प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम)

आयोजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक कोरिडोर

५ (मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ-रोल्पा राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग)

आयोजना लागू हुने पालिका संख्या

१७१

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय संख्या/रहने स्थान

४ (पाख्रिबास, बर्दिबास, बुटवल, डडेल्धुरा)

# आयोजनाको लक्ष्य एवं उद्देश्य

## आयोजना विकास लक्ष्य

ग्रामीण उत्पादक समूहहरूलाई बजार पहुँचका लागि **बजार सम्बन्धन सुदृढीकरण**, **उद्यमशील वातावरणको निर्माण** र कोभिड-१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनर्स्थापनाका लागि **रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना**

## उद्देश्यहरू

- उत्पादनमूलक साझेदारी (Productive Partnership)को माध्यमबाट कृषि बजार श्रृंखला मजबुत गर्ने
- उद्यमशीलता विकासका लागि संघीय संरचनामा आवश्यक **नीतिगत खाका**, उपयुक्त संरचनाहरू, **संस्थागत क्षमता विकास** र अन्य सहयोगी सेवाहरूमा सहयोग पुऱ्याउने
- कोभिड १९ को असरबाट प्रभावित **खाद्य आपूर्ति श्रृंखला** लाई मजबुत पार्दै **स्थानीय अर्थव्यवस्थामा सुधार** गर्ने

# आयोजनाका सम्भागहरु तथा लागत

सम्भागहरु	बजेट (\$)
सम्भाग १ : ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकहरुको बजार आवद्धता सुनिश्चित गर्ने	४० मिलियन
सम्भाग २ : संघीय संरचनामा उद्यमशीलताको वातावरण सुदृढ बनाउने	८ मिलियन
□ सम्भाग २ क : प्रादेशिक तथा स्थानिय सरकार एवं सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि	५ मिलियन
□ सम्भाग २ ख : कृषिसंग सम्बन्धित संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने	३ मिलियन
सम्भाग ३ : कोभिड १९ को असहज परिस्थितबाट अवरूद्ध खाद्य श्रृंखला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनस्थापना तथा प्रवर्द्धन	२२ मिलियन
सम्भाग ४ : आयोजना व्यवस्थापन	१० मिलियन
सम्भाग ५ : आकस्मिक प्रतिकार्यका कृयाकलापहरु संचालन	०

आयोजनाको जम्मा लागत (मिलियन अमेरिकि डलर): १२० (करिब १४ अर्ब २३ करोड रुपैया)

विश्व बैंक ऋण सहयोग (मिलियन अमेरिकि डलर): ८० (करिब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैया)

लाभग्राहीको योगदान (मिलियन अमेरिकी डलर): ४० (करिब ४ अर्ब ७४ करोड रुपैया)

# आयोजनाको कार्यक्षेत्र



आर्थिक कोरिडोर	प्रदेश	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय
मध्य पहाडी लोकमार्ग	प्रदेश नं. १	७	२२	पाखिबास
	बाग्मती	६	१८	
मध्य पहाडी लोकमार्ग	गण्डकी	५	२१	बुटवल
भालुवाङ-रोल्पा लोकमार्ग	लुम्बिनी	४	९	
हुलाकी राजमार्ग	प्रदेश नं. २	८	८४	बर्दिबास
पूर्व पश्चिम राजमार्ग				
महाकाली राजमार्ग	सुदूरपश्चिम	५	१७	डडेल्धुरा
जम्मा		३५	१७१	

# आयोजना लागू हुने स्थानीय तहहरू

आयोजना निर्देशक समितिको २०७८/०५/११ को निर्णयबाट स्विकृत

राजमार्ग	प्रदेश	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	जिल्ला/स्थानीय तहको नाम
मध्य पहाडी	प्रदेश नं. १	पाख्रिबास, धनकुटा	७	२२	पाँचथर: फालेलुङ, याङवरक, हिलिहाङ, <b>फिदिम</b> ; तेह्रथुम: आठराई, फेदाप, <b>म्याङलुङ</b> , <b>लालीगुराँस</b> ; धनकुटा: छथर जोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाख्रिबास; भोजपुर: अरुण, पौवादुङ्गा, टेम्केमैयुङ, <b>भोजपुर</b> ; खोटाङ: रावा बेसी, साकेला, <b>हलेसी तुवाचुङ</b> , <b>दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी</b> ; ओखलढुङ्गा: मानेभञ्ज्याङ; उदयपुर : <b>कटारी</b>
			६	१८	सिन्धुली: गोलन्जोर, फिक्कल; रामेछाप: खाँडादेवी, सुनापति, <b>मन्थली</b> ; काभ्रेपलाञ्चोक: भुम्लु, चौरीदेउराली; सिन्धुपाल्चोक: ईन्द्रावती, <b>मेलम्ची</b> , <b>चौतारा साँगाचोकगढी</b> ; नुवाकोट: लिखु, म्यागङ, पञ्चकन्या, शिवपुरी, <b>बिदुर</b> ; धादिङ्ग: नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरा सुन्दरी, <b>निलकण्ठ</b>
	गण्डकी	५	२१	गोरखा: आरुघाट, भीमसेन थापा, सिरानचोक, बारपाक सुलिकोट, <b>पालुङटार</b> ; लम्जुङ: <b>मध्य नेपाल</b> , <b>राईनास</b> , <b>सुन्दरबजार</b> ; कास्की: माछापुच्छ्रे, मादी, रुपा, अन्नपूर्ण, <b>पोखरा</b> ; पर्वत: मोदी, <b>कुश्मा</b> ; बागलुङ: वडिगाड, काठेखोला, <b>निसीखोला</b> , <b>बागलुङ</b> , <b>ढोरपाटन</b> , <b>गल्कोट</b>	
भालुवाङ-रोल्पा	लुम्बिनी	रुपन्देही	४	९	दाङ्ग: राप्ती; अर्घाखाँची: <b>शितगंगा</b> ; प्युठान: ऐरावती, माण्डवी, सरुमारानी, <b>प्यूठान</b> , <b>स्वर्गद्वारी</b> ; रोल्पा: सुनिलस्मृति, <b>रोल्पा</b>
हुलाकी पूर्व पश्चिम	प्रदेश नं. २	बर्दिबास, महोत्तरी	८	८४	सप्तरी: अग्नीसाइर कृष्णासवरन, रुपनी, तिरहुत, बलान-बिहुल, राजगढ, बिष्णुपुर महादेवा, <b>राजबिराज</b> , <b>हनुमाननगर</b> कंकालिनी, कञ्चनरूप, खडक, शम्भुनाथ, सुरुङ्गा, बोदेबरसाईन, डाक्नेश्वरी; सिराहा: नरहा, औरही, नवराजपुर, बरियारपट्टी, भगवानपुर, अर्नमा, मिर्चैया, धनगढीमाई, गोलबजार, कर्जन्हा, लहान, सिरहा; धनुषा: कमला, सबैला, धनुषाधाम, गणेशमान-चारनाथ, सहिदनगर, मिथिला, विदेह, <b>जनकपुर</b> ; महोत्तरी: पिपरा, महोत्तरी, सम्सी, सोनमा, एकडारा, बर्दिबास, गौशाला, जलेश्वर, मनरा, सिस्वा, रामगोपालपुर; सर्लाही: बागमती, गोडैता, ब्रम्हापुरी, कौडेना, रामनगर, पर्सा, हरिवन, ईश्वरपुर, लालबन्दी, बलरा, मलंगवा; रौतहट: गुजरा, वृन्दावन, चन्द्रपुर, गढीमाई, गौर, मौलापुर, परोहा, राजदेवी, राजपुर, बारा: पचरौता, फेटा, आदर्श कोतवाल, बारागढी, प्रसौनी, सिम्रौनगढ, कोल्हवी, निजगढ, महागढीमाई, <b>जितपुर-सिमरा</b> , <b>कलैया</b> ; पर्सा: बिन्दबासिनी जगरनाथपुर, जिराभवानी, पटेर्वा सुगौली, सखुवा प्रसौनी, ठोरी, <b>बहुदरमाई</b> , <b>वीरगञ्ज</b>
महाकाली			सुदूरपश्चिम	डडेल्धुरा	५
			३५	१७१	नोट: कालो रङ्गले जिल्ला, हरियोले गाउँपालिका, रातोले नगरपालिका, आकासे निलोले उपमहानगरपालिका र गाढा निलोले महानगरपालिका जनाउने गरि संकेत गरिएको छ।



१४०

उत्पादन साझेदारी



५७००

अल्पकालिन ग्रामिण रोजगारी- कोभिड १९  
प्रतिकार्य

१००

साना तथा मझौला उद्यम

आयोजनाको अपेक्षित  
उपलब्धि

कृषक पालिकास्तर कृषि तथा पशुपन्छी  
सेवा केन्द्र, बजार तथा मूल्यऋखला  
पूर्वाधारबाट ३५०० कृषक  
लाभान्वित ।

२४००००

साना उत्पादक कृषक तथा ग्रामिण  
उत्पादकहरु

३५%

महिला लाभग्राही


८६

सरकारी निकाय  
६- प्रादेशिक तथा ८० स्थानिय तह

# आयोजनाको संगठन संरचना




# आयोजनाको संस्थागत संरचना

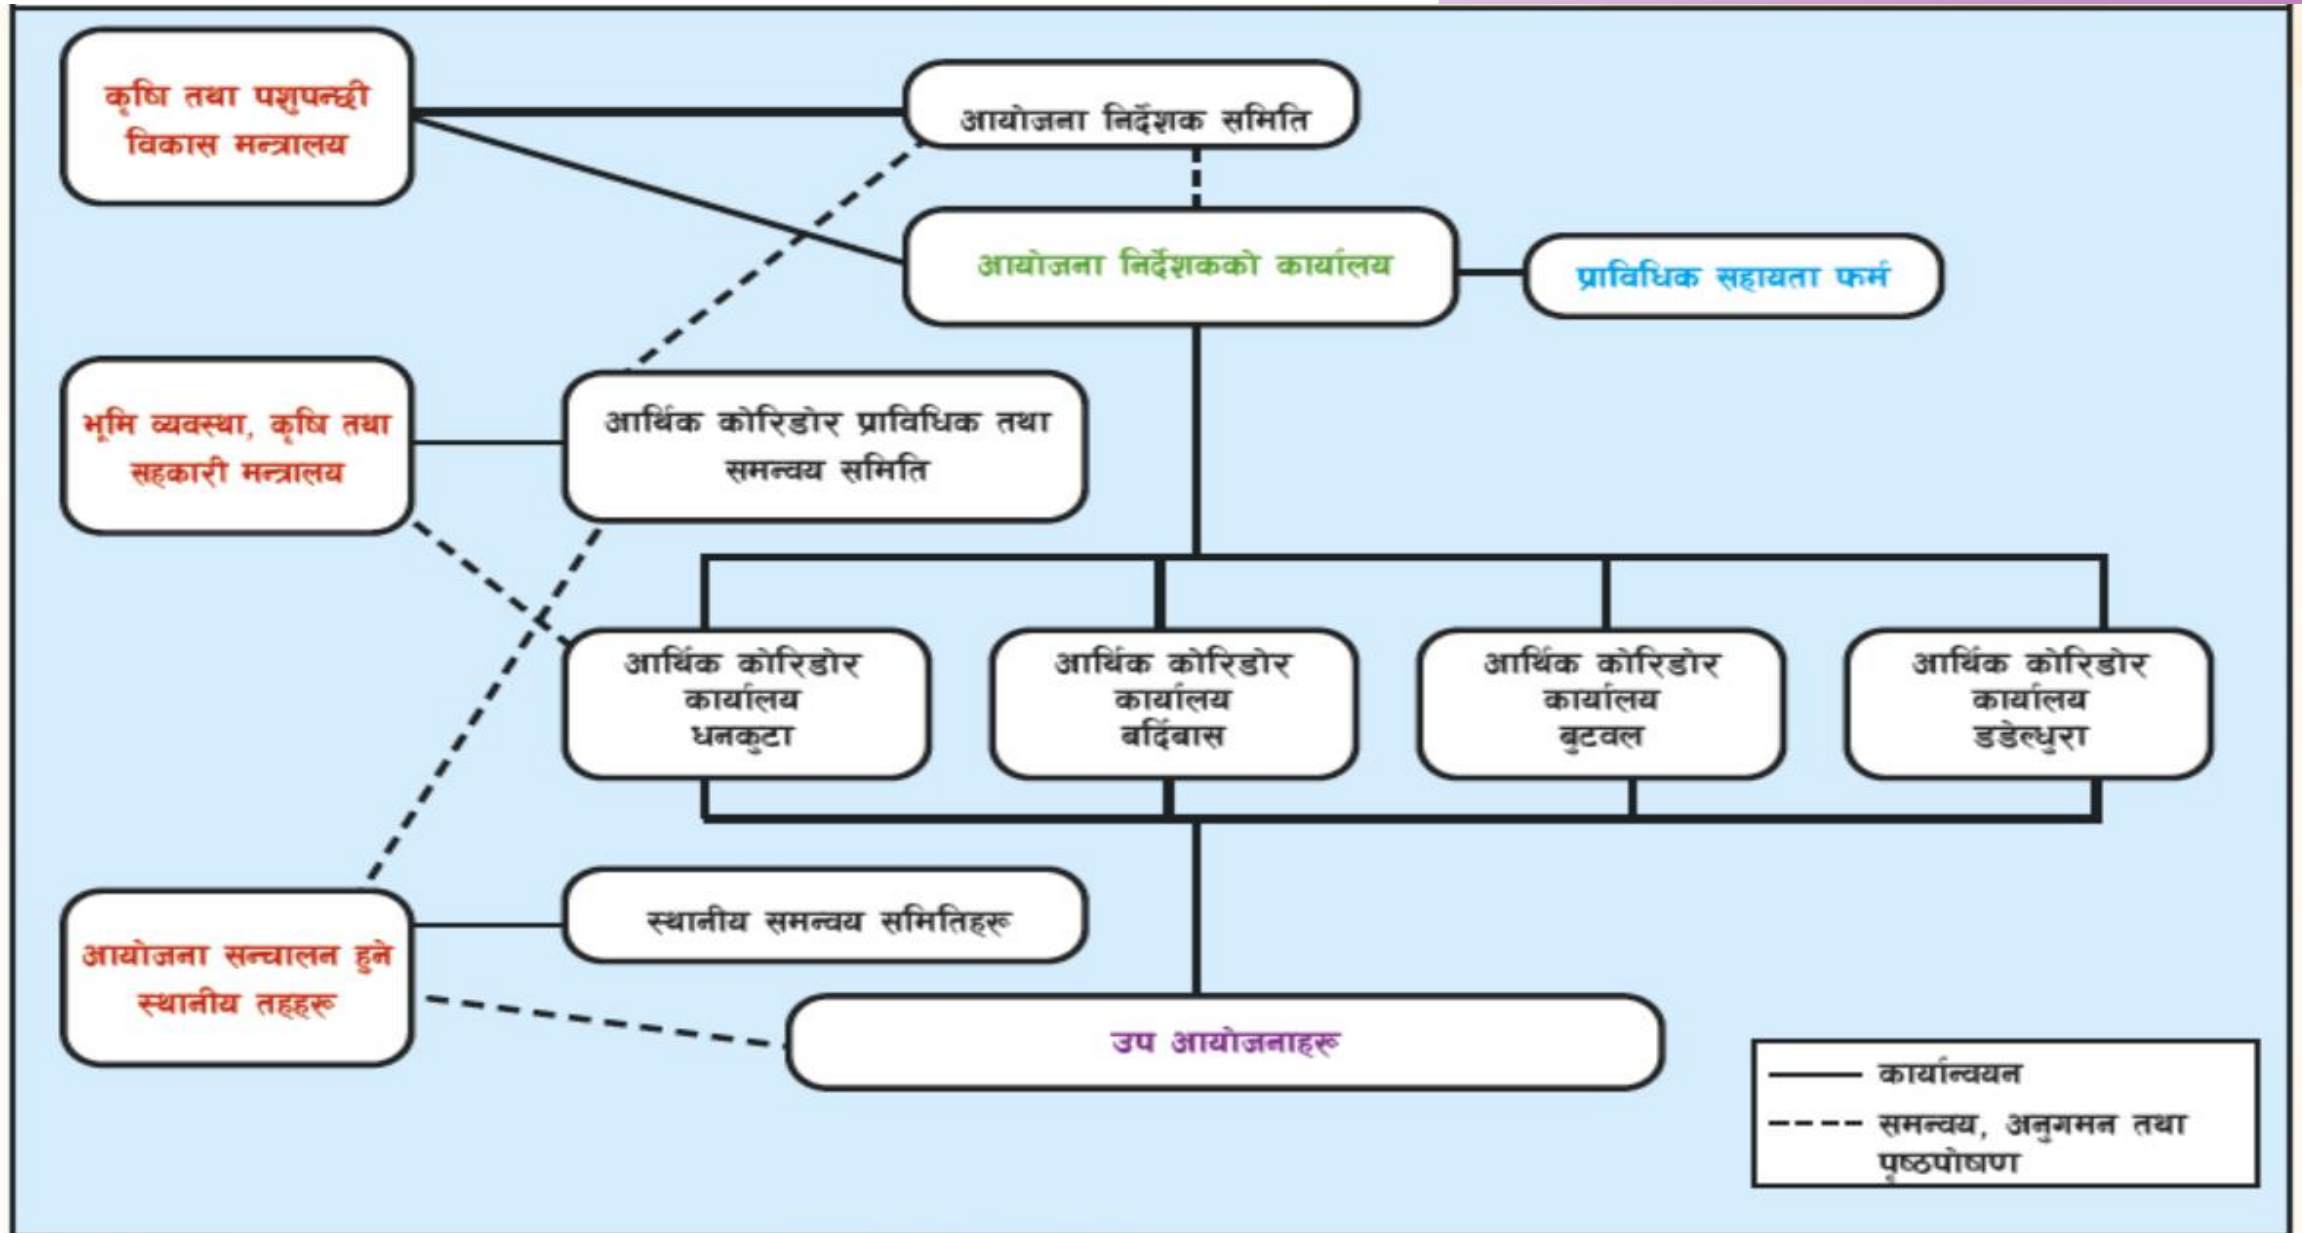

# दरबन्दी तथा पदपूर्ती विवरण

क्र. सं.	पद	स्विकृत दरबन्दी	पदपूर्ती रिक्त	सेवा प्रकार	क्र. सं.	पद	स्विकृत दरबन्दी	धनकुटा		बाँदेबास		बुटवल		डडेल्धुरा		सेवा प्रकार
								पदपूर्ती	रिक्त	पदपूर्ती	रिक्त	पदपूर्ती	रिक्त	पदपूर्ती	रिक्त	
१	प्राविधिक तर्फ				१	प्राविधिक तर्फ										
	रा.प.प्र.प्रा.	१	१	०	स्थायी	रा.प.द्वि.प्रा.	१	१	०	१	०	१	०	१	०	स्थायी
	रा.प.द्वि.प्रा.	३	३	०	स्थायी	रा.प.तृ.प्रा. (कृषि/पशुपन्डी)	३	१	२	२	१	३	०	१	२	स्थायी
	रा.प.तृ.प्रा.	४	३	१	स्थायी											
	रा.प.अनं.प्रा.	१	१	०	स्थायी	रा.प.अनं.द्वि.प्रा.	१०	०	१०	०	१०	०	१०	०	१०	करार
	रा.प.अनं.द्वि.प्रा.	२	२	०	करार											
२	प्रशासन तर्फ				२	प्रशासन तर्फ										
	रा.प.तृ.लेखा	१	१	०	स्थायी	रा.प.अनं.प्र./द्वि	२	२	०	१	१	२	०	१	१	स्थायी
	रा.प.अनं.प्र.	२	२	१	स्थायी	कम्प्युटर अपरेटर	१	१	०	१	०	१	०	१	०	करार
	कम्प्युटर अपरेटर	३	३	०	करार	सवारी चालक	२	२	०	२	०	२	०	२	०	करार
	सवारी चालक	४	४	०	करार	कार्यालय सहयोगी	२	२	०	२	०	२	०	२	०	करार
	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	करार											
	<b>जम्मा</b>	<b>२५</b>	<b>२३</b>	<b>२</b>		<b>जम्मा</b>	<b>२१</b>	<b>९</b>	<b>१२</b>	<b>९</b>	<b>१२</b>	<b>११</b>	<b>१०</b>	<b>८</b>	<b>१३</b>	


# आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा हालसम्म पार गरिएका मुख्य खुडकिलाहरु

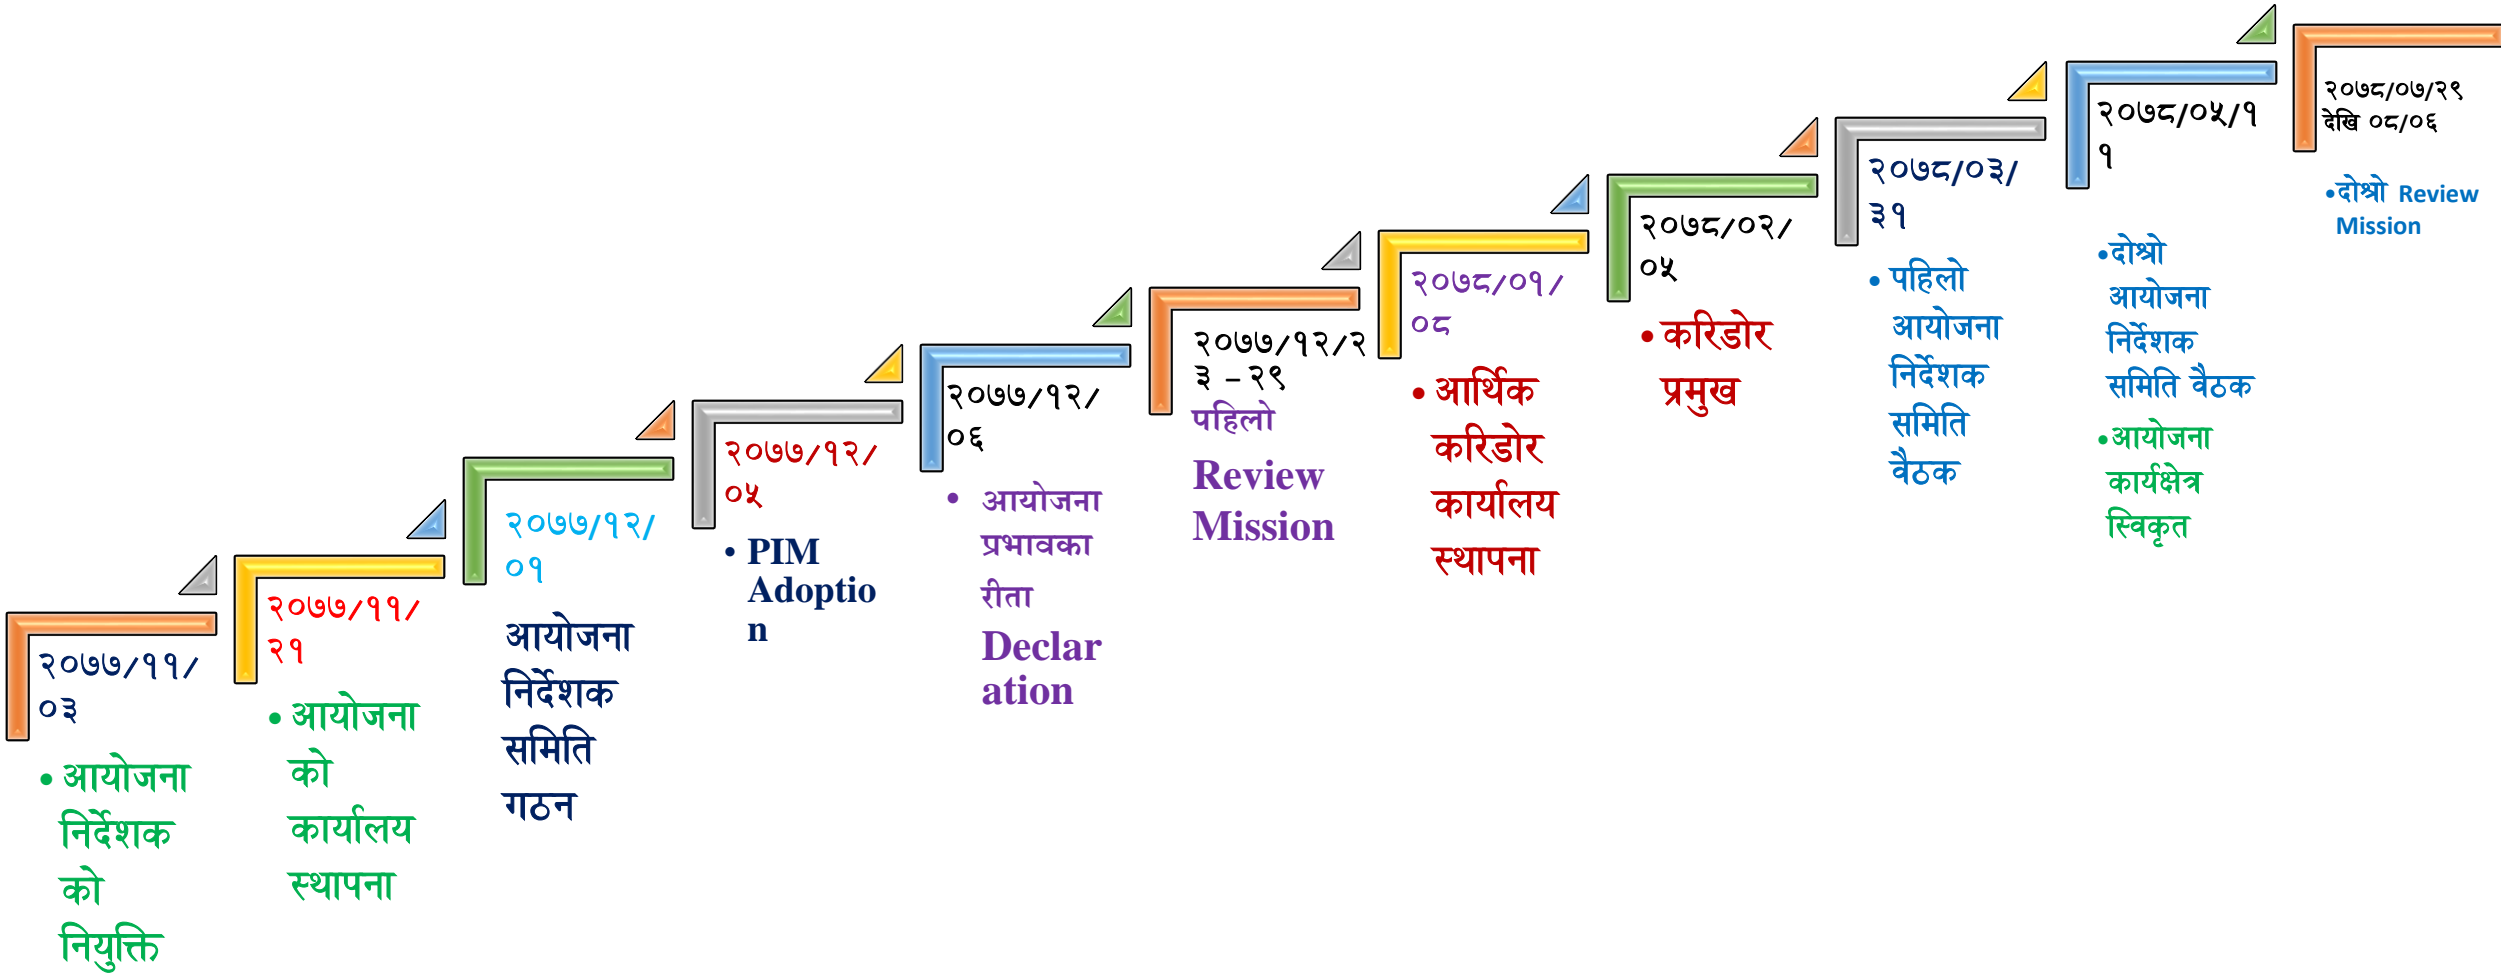

# आयोजनाको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण




# आयोजनाको बजेट विनियोजन अवस्था

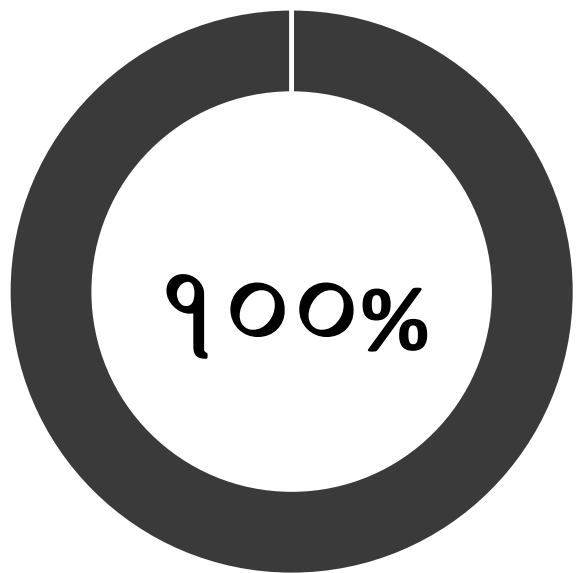


राष्ट्रिय बजेट

रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड

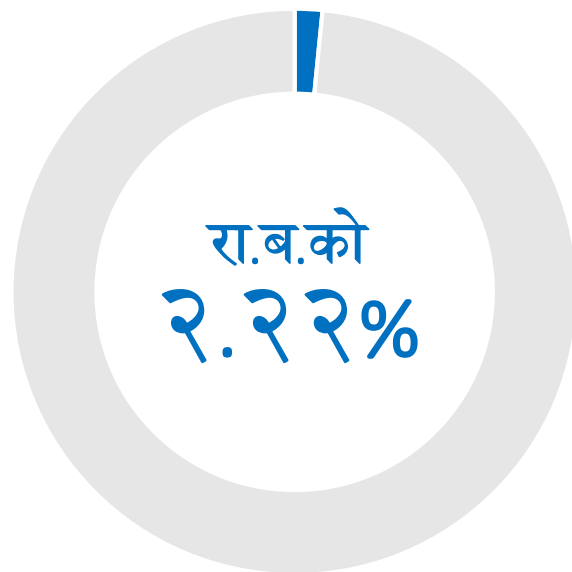

संघिय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय


रु ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख

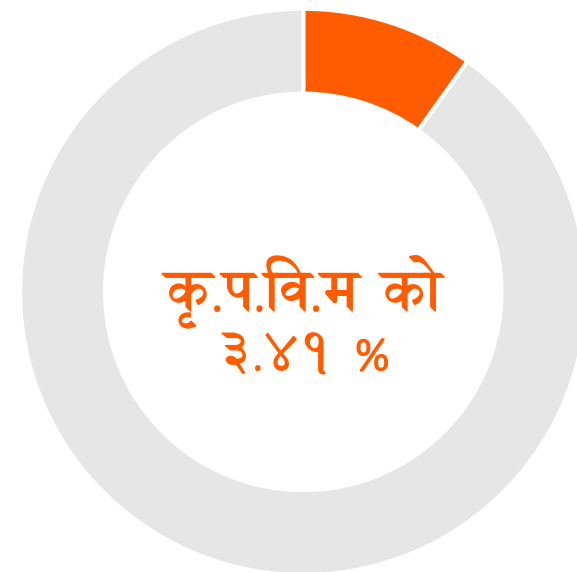

आयोजनाको बजेट



रु १ अर्ब २४ करोड १२ लाख

# कार्यालय अनुसार आ.व. २०७८/७९ को बजेट

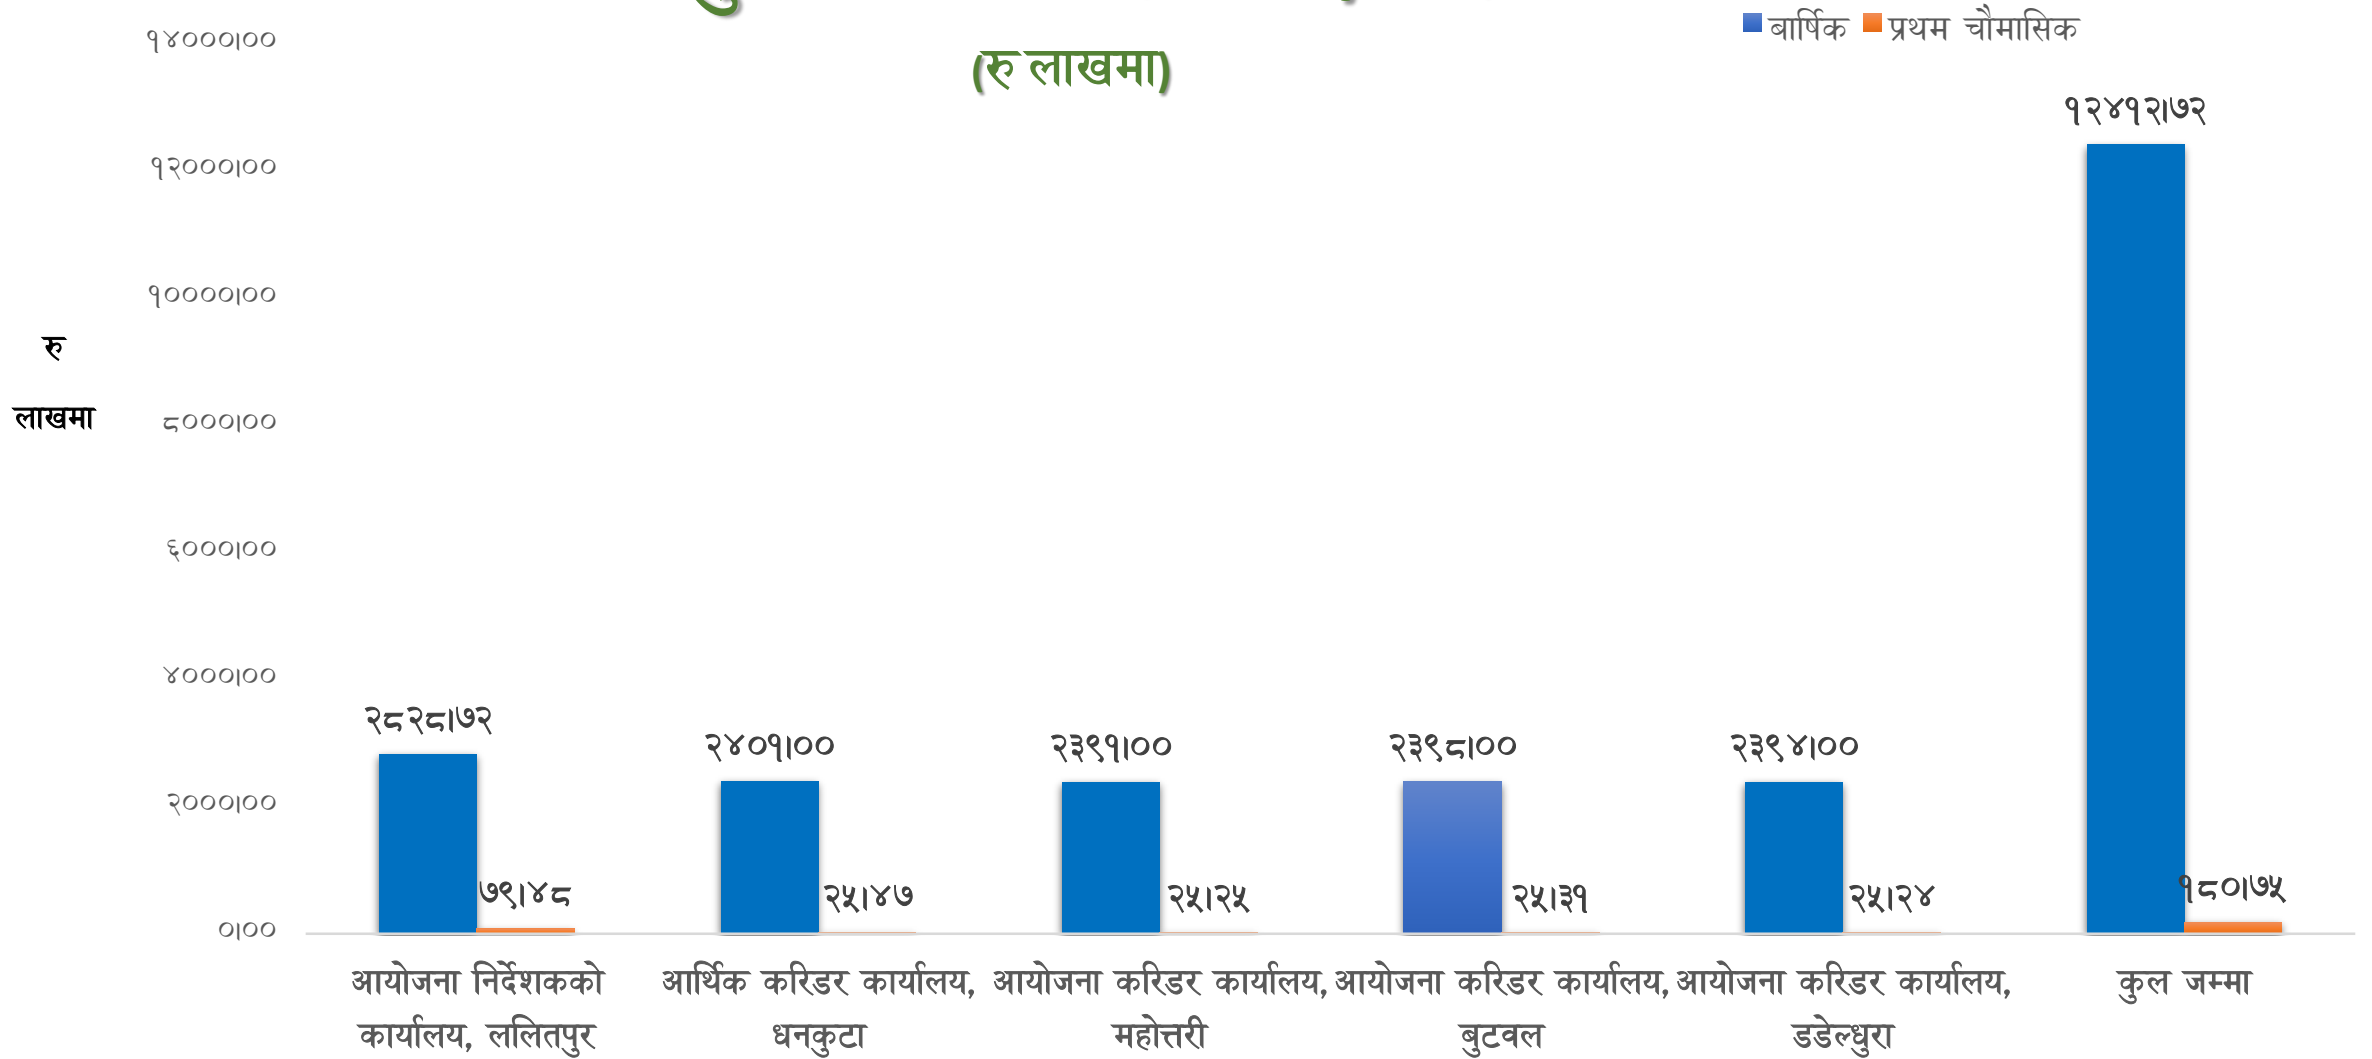



# श्रोतगत र चालु/पूजिगत बजेट विवरण

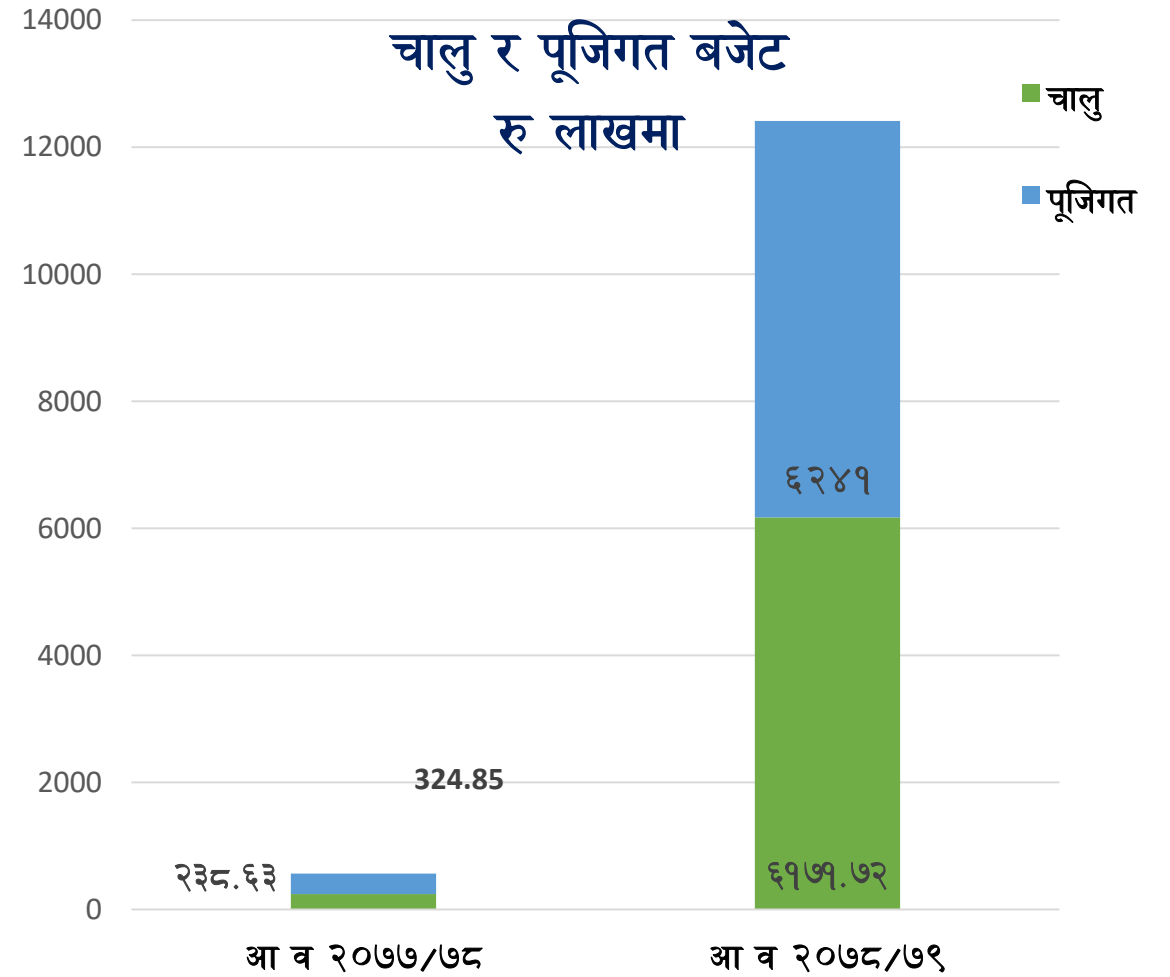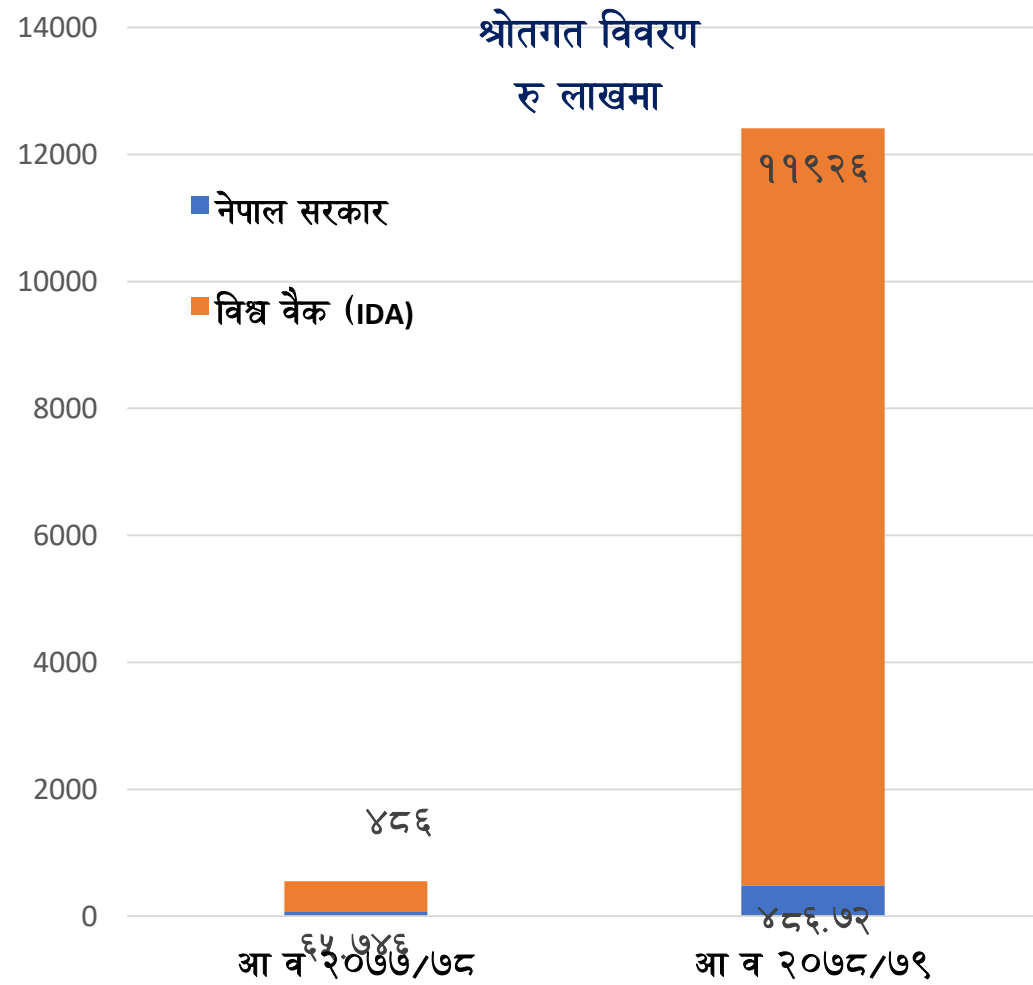


# प्रस्तावित मुख्य कृयाकलापहरु (बजेट रु लाखमा) (आयोजना निर्देशकको कार्यालय)

कृयाकलापहरु	बजेट
सवारी साधन (४ पाङ्गे २, मोटरसाइकल २, स्कुटर २)	१७८.१
Photocopy, printer, projector, Laptop, Desktop, AC	३८.६
परामर्श सेवा (Procurement, Finance, Social Safeguard, Environment, M&E Specialist )	९०
स्थायी कर्मचारीको तलब/भत्ता	८३.८९
करार सेवा (कम्प्युटर अपरेटर, कृषि प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, हसचा )	४७.७६
गोष्ठी/अन्तरक्रिया/कार्यक्रम अनुगमन योजना तर्जुमा, समिक्षा, तीनै तहका सरकारहरूसंगको अन्तरक्रिया, उप आयोजनाहरु स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, बैठकहरु, सरोकारवालाहरूसंग अन्तरक्रिया	१३१.१४
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण सहयोग सेवा केन्द्रहरु निर्माण, मूल्य श्रृंखला सम्बन्धी संरचनाहरु, प्रादेशिक कृषि बजारहरु सूचना प्रकासन, DPR तयारी र कार्यविधि/निर्देशिकाहरु तयारी	६१
उष्ण प्रदेशिय बागवानी केन्द्र सर्लाहीलाई Center of Excellence का रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार	३००
मध्यस्थकर्ता संस्था मार्फत साना तथा मझौला व्यवसाय विकास मध्यस्थकर्ता संस्थाको परामर्श सेवा	३२५
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं सम्बन्धित निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि (परामर्श सेवा) तीनै तहका कृषि सम्बन्धि निकायका Capacity Enhancement Need Assessment (CENA) तयारी	१४९.९४
प्राविधिक सहायता फर्म (TA Firm) को परामर्श सेवा	८०४.०६




# आर्थिक करिडोर कार्यालय

कृयाकलापहरु	बजेट
सवारी साधन (४ पाङ्गे २, मोटरसाइकल ५, स्कुटर २)	१३१.९
Photocopy, printer, projector, Laptop, Desktop, AC	२२.८५
स्थायी कर्मचारीको तलब/भत्ता	४०.०७
करार सेवा (कम्प्युटर अपरेटर, कृषि प्राविधिक १० जना, कार्यालय सहयोगी, हसचा )	४६.७७
गोष्ठी/अन्तरक्रिया/कार्यक्रम अनुगमन योजना तर्जुमा, समिक्षा, अन्तरक्रिया, उप आयोजनाहरु स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, ECTCC/ LCC बैठकहरु, सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया	३.५
स्थानीय तहहरुमा कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण सहयोग सेवा केन्द्रहरु निर्माण प्रति करिडोर १० वटा मूल्य श्रृंखला सम्बन्धी संरचनाहरु ५ वटा	१००० २५०
Capacity Enhancement Need Assessment (CENA) प्रतिवेदन अनुसार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सन्चालन	७०
उत्पादक संस्थाहरुलाई Start up Grant सहयोग	६००
कृषक समूह सहकारीहरुलाई व्यवसायिक योजना तयारी क्षमता विकास	२०

# कार्यालयगत प्रथम त्रैमासिक खर्च विवरण

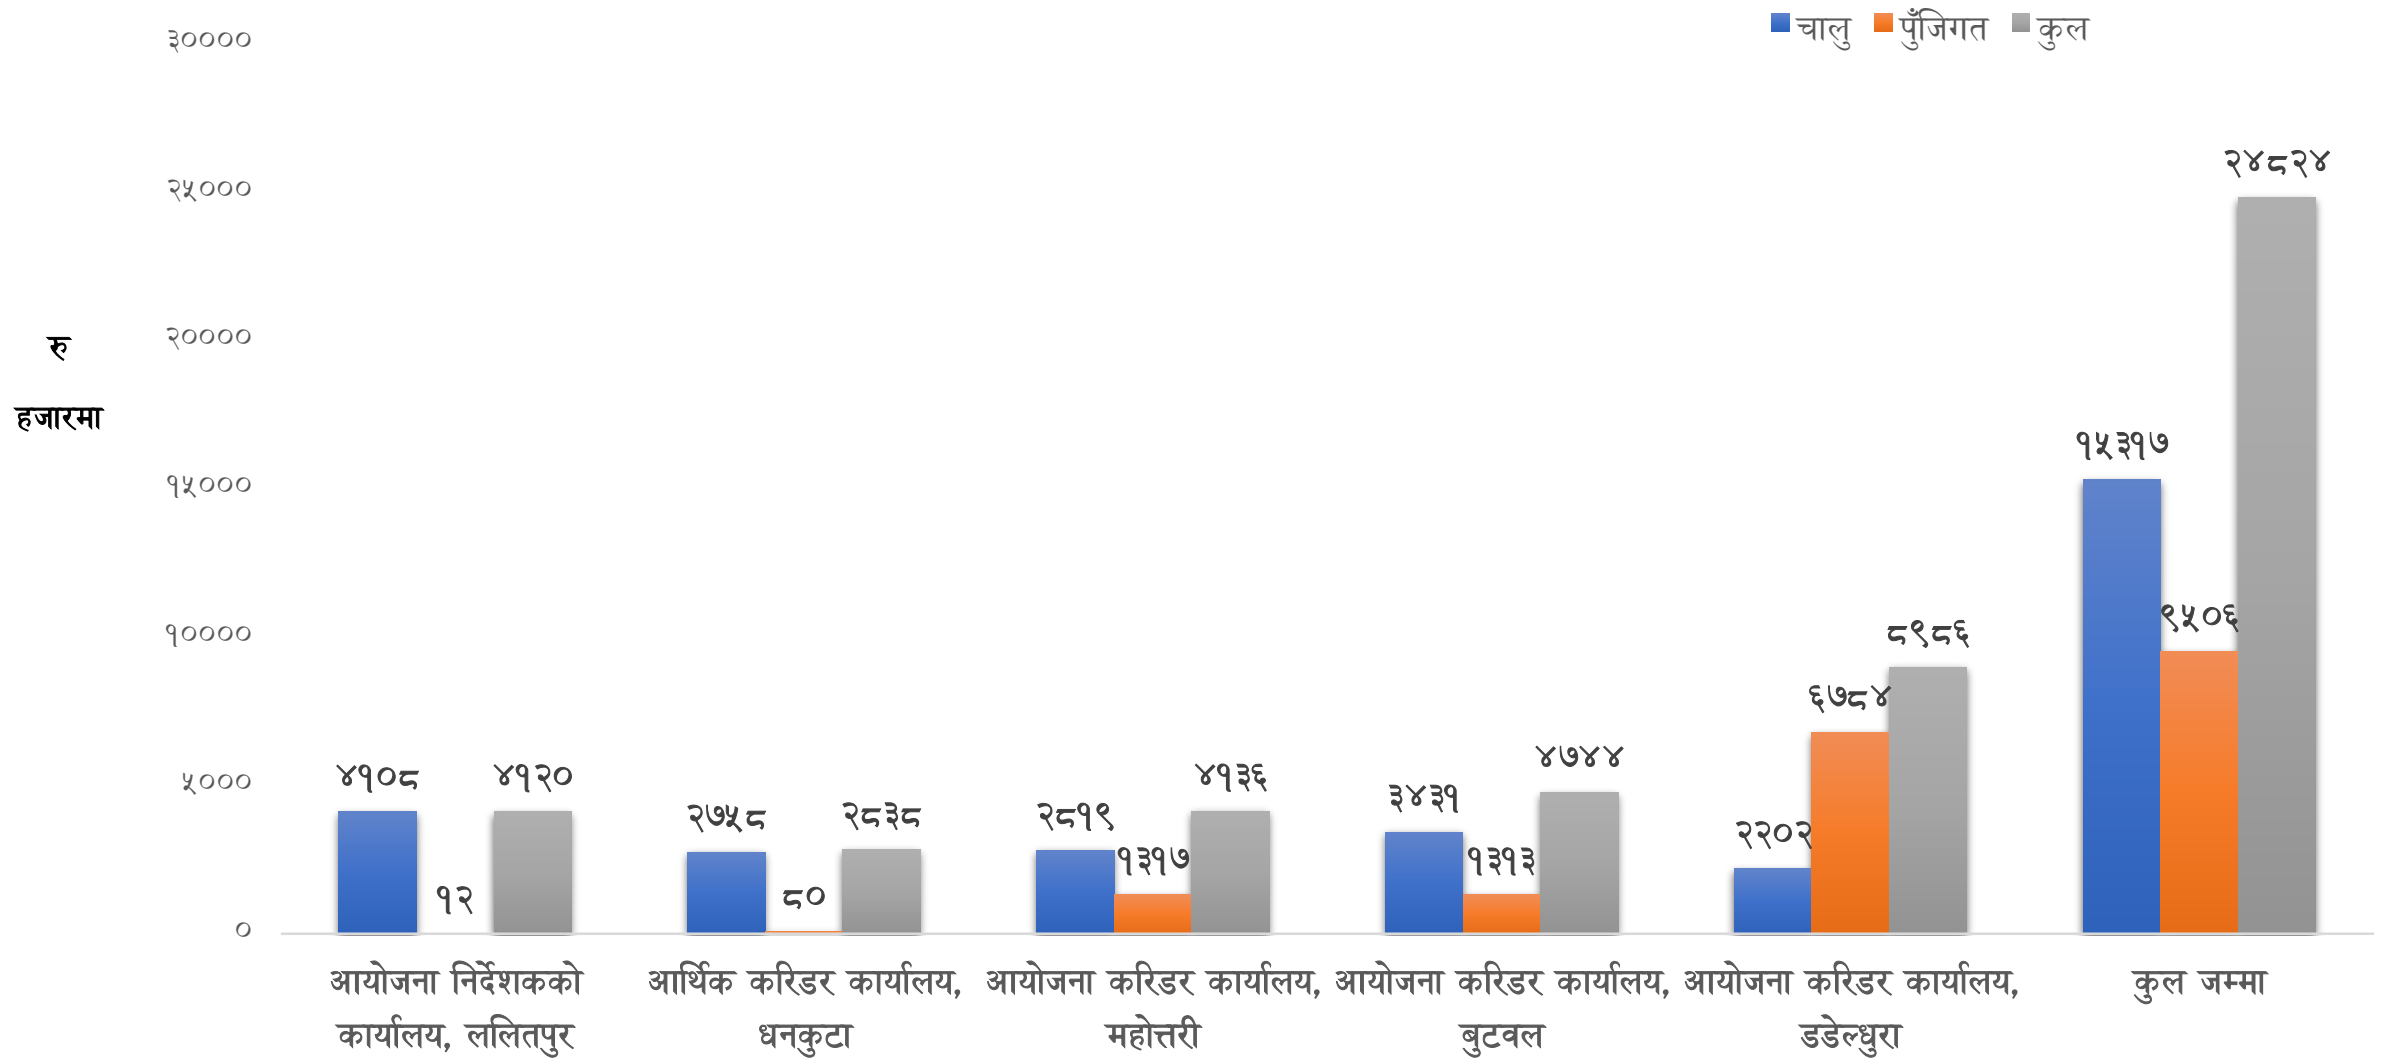

# आ.व.२०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक एकमुष्ट प्रगति विवरण

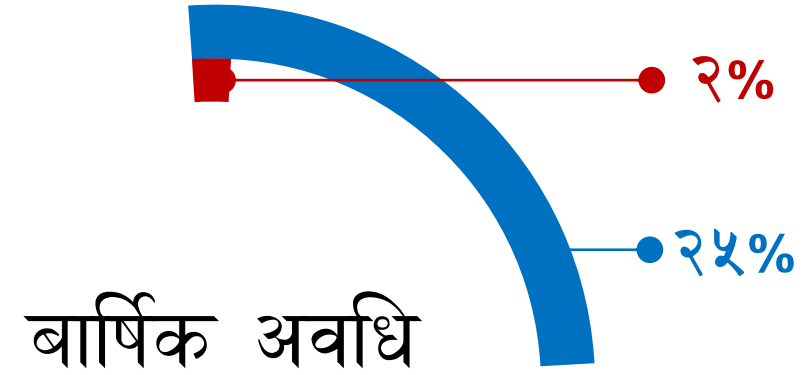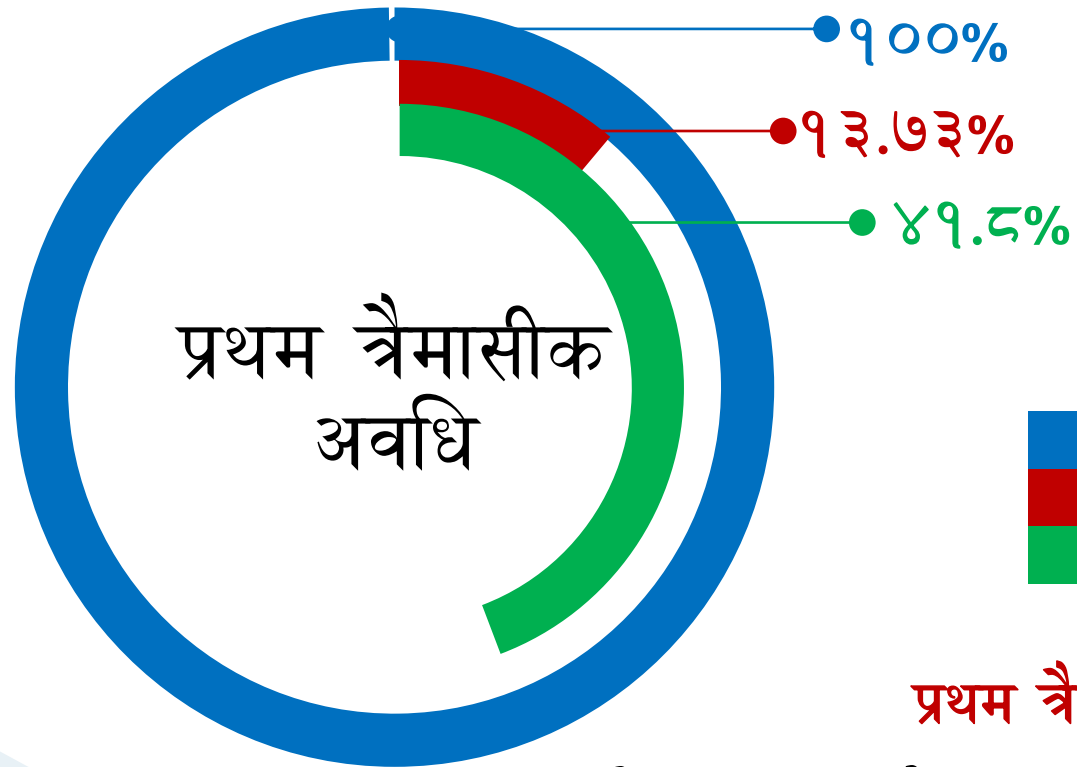


## प्रथम त्रैमासिक बजेट विवरण

कुल बजेट: रु १८ करोड ७ लाख ५४ हजार (पुजिगत: ५१ %, चालु: ४९ %)

असोज मसान्त सम्म कुल खर्च: रु २ करोड ४८ लाख २३ हजार

हालसम्म (कार्तिक १५ सम्म) रु ३ करोड ८७ लाख ५८ हजार


# कार्यालयगत प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

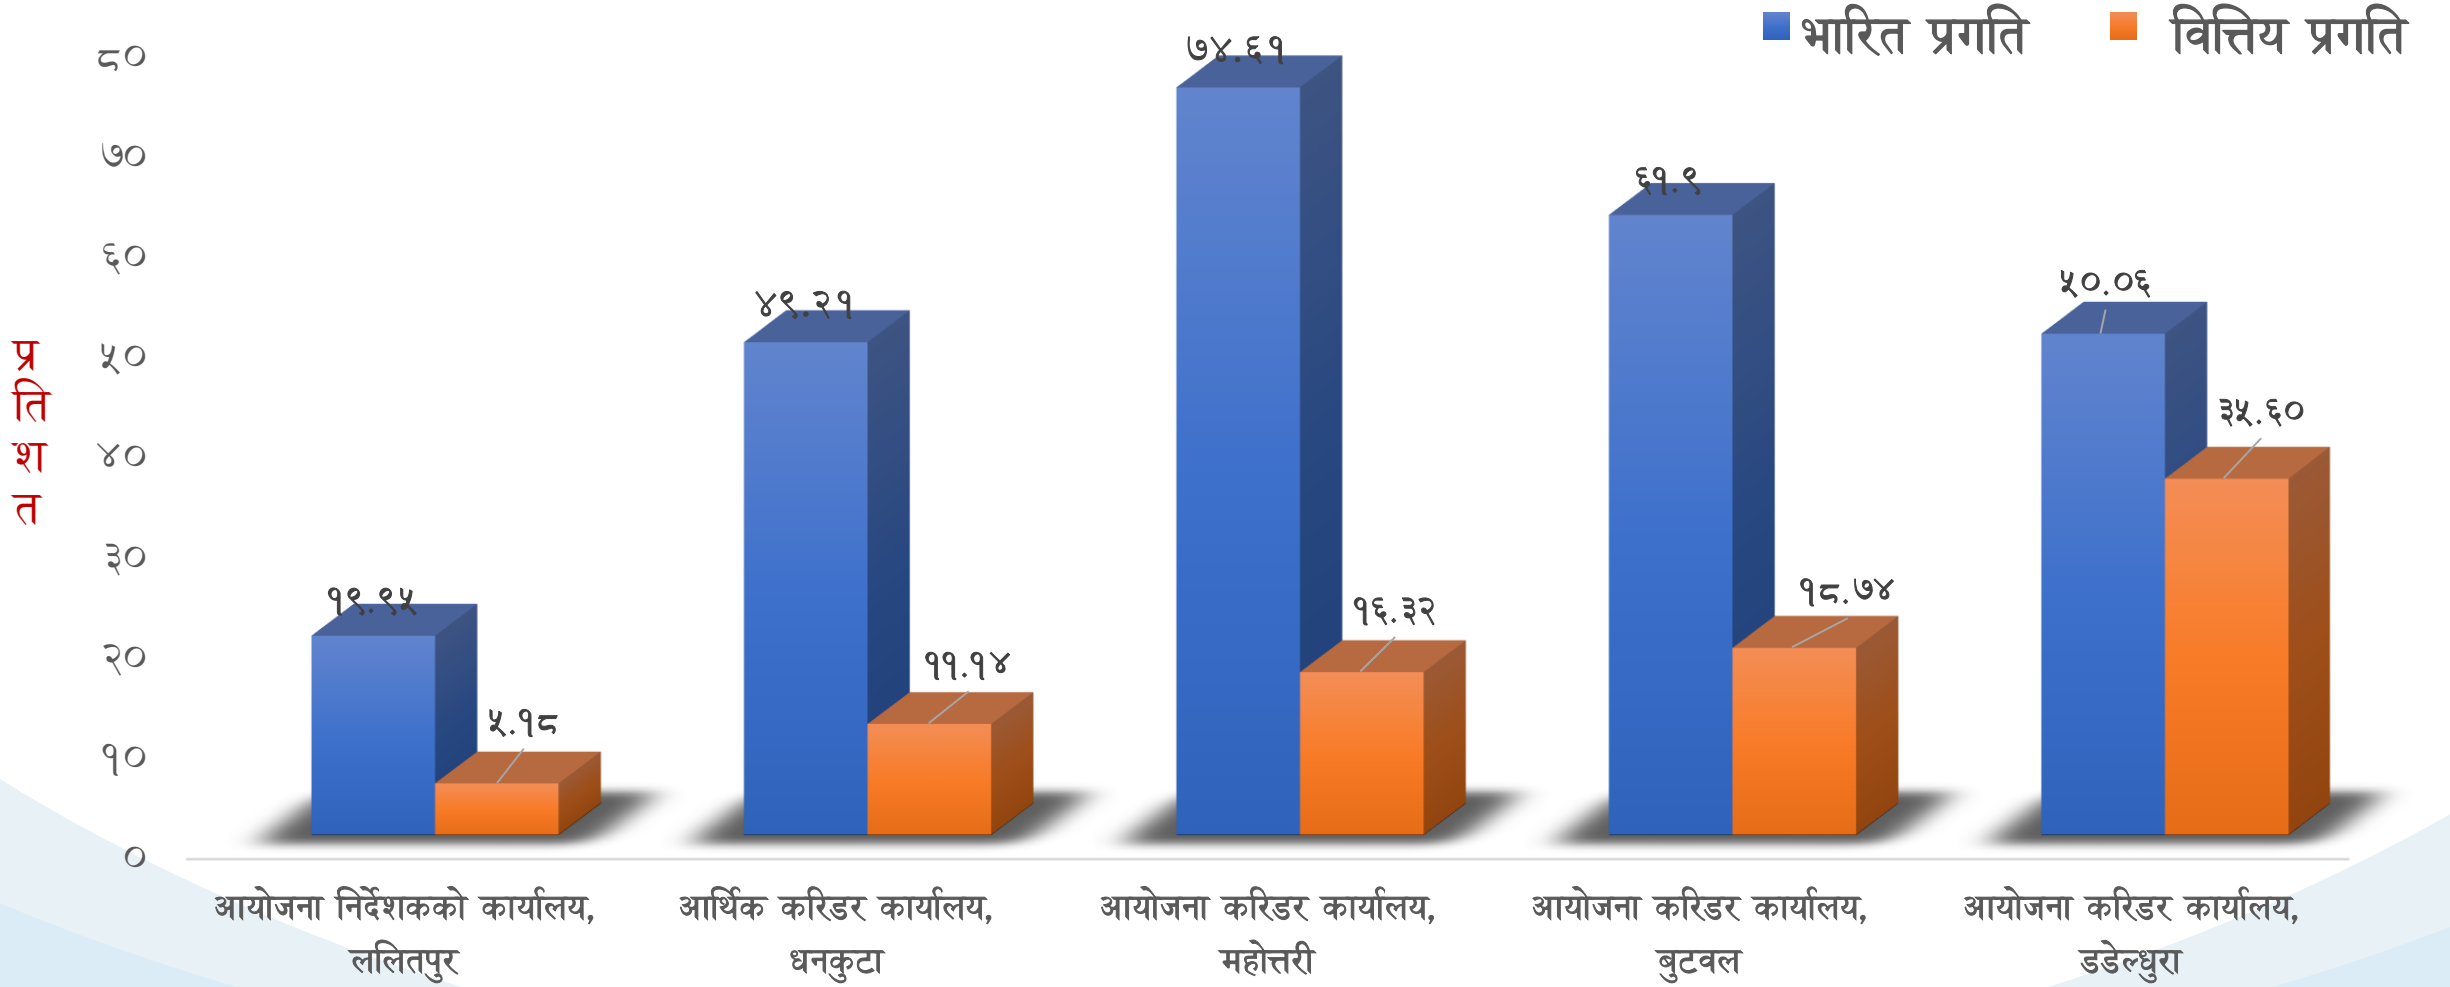

# आ.व.२०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

कार्यालयको नाम	प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट	प्रथम त्रैमासिक पूँजिगत		प्रथम त्रैमासिक चालु		कुल	त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
	जम्मा	बजेट	निकासा/ खर्च	बजेट	निकासा/ खर्च	निकासा/ खर्च	
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	७९४७८.००	२५६५०.००	१२.००	५३८२८.००	४१०७.५१	४११९.५१	५.१८
आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	२५४७२.००	१६५५५.००	७९.९९००	८९१७.००	२७५७.८३	२८३७.८२	११.१४
आर्थिक करिडर कार्यालय, महोत्तरी	२५२५०.००	१६५५५.००	१३१७.००	८७९०.००	२८१९.००	४१३६.००	१६.३२
आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	२५३१४.००	१६५५५.००	१३१३.००	८७५९.००	३४३१.००	४७४४.००	१८.७४
आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	२५२४०.००	१६५५५.००	६७८४.४३	८६८५.००	२२०१.८७	८९८६.३०	३५.६०
जम्मा	१८०७५४.००	९१८७०.००	९५०६.४२	८८९७९.००	१५३१७.२१	२४८२३.६३	१३.७३

# आयोजनाको प्रमुख सूचकहरुको हालसम्मको समग्र प्रगति अवस्था

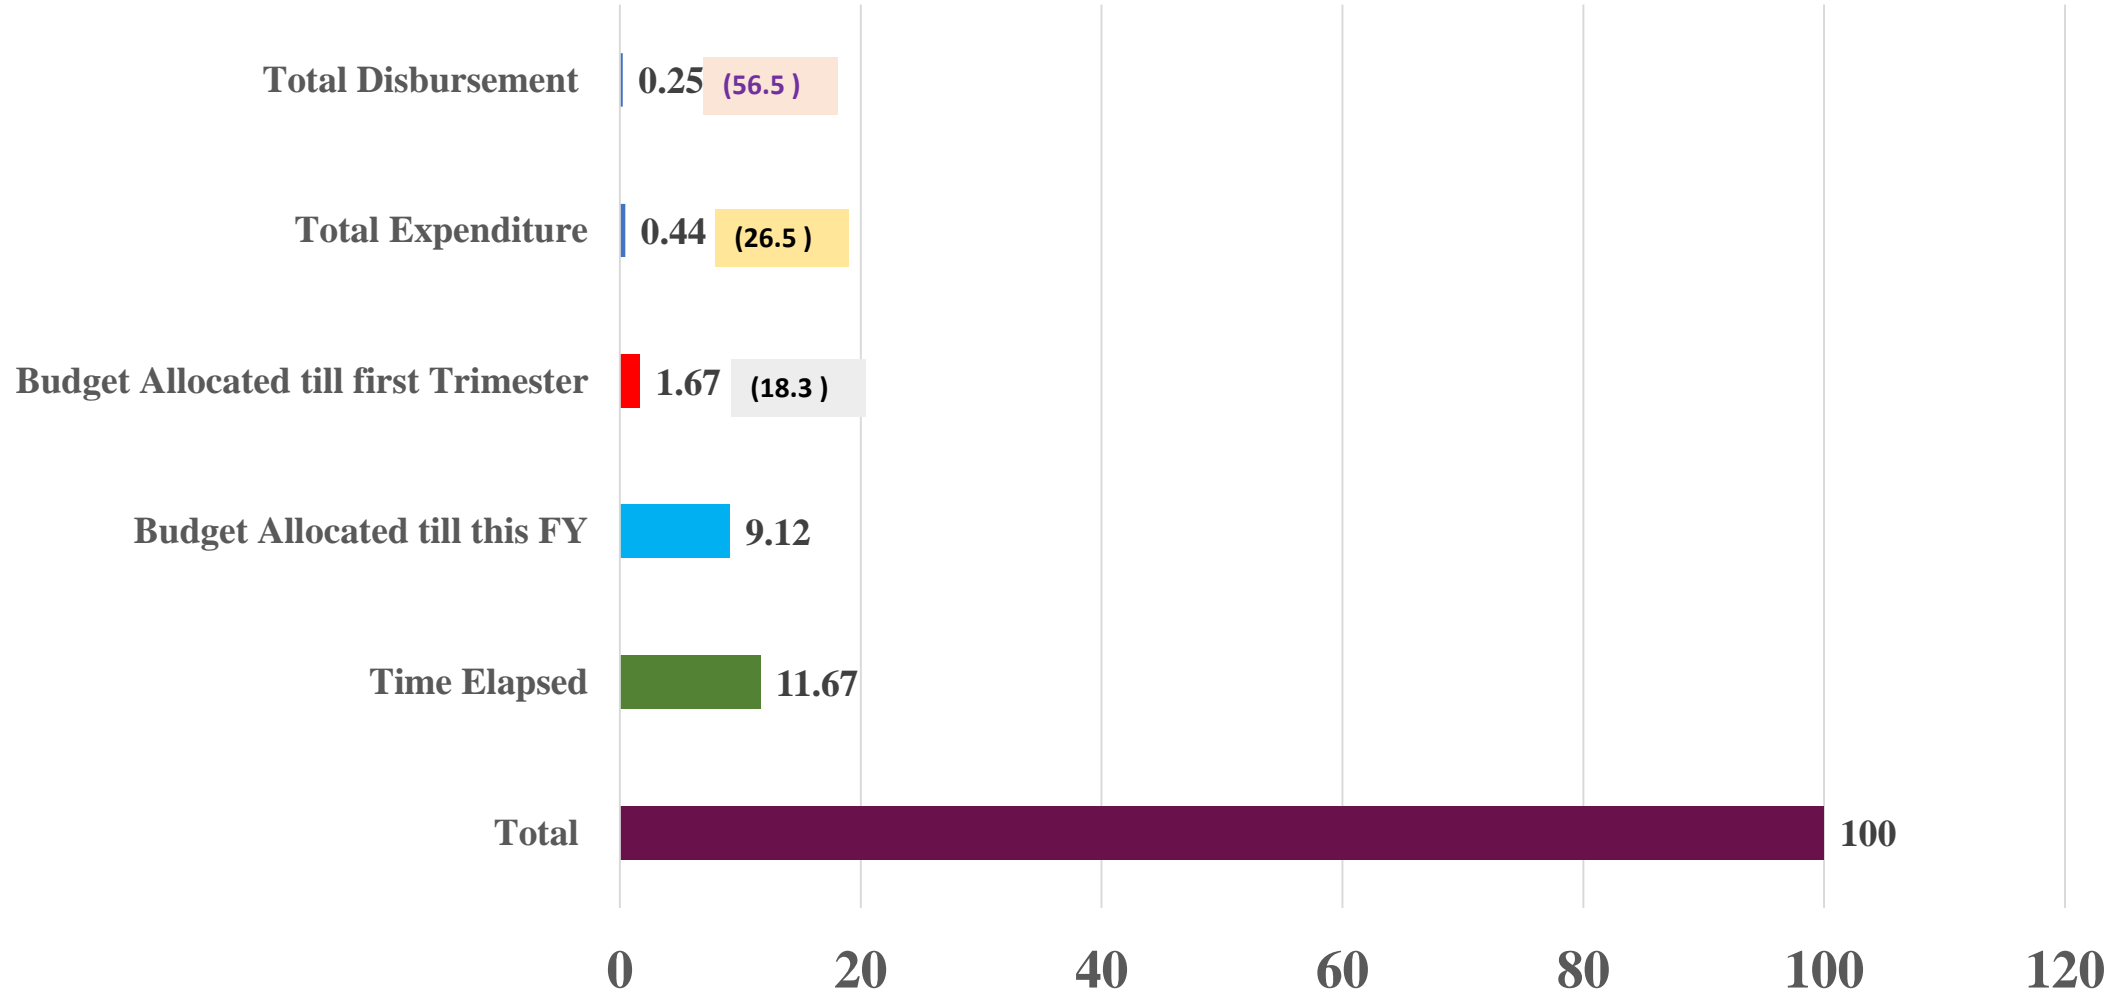



# सम्पन्न मुख्य मुख्य कृयाकलापहरु

- कार्यालय व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सवारी साधनहरु खरिद
- आयोजना निर्देशक समितिको बैठक मार्फत आयोजनाको **कार्यक्षेत्र निर्धारण**
- **Individual Consultants ( M&E, Social Safeguard, Environment Specialist, Financial Specialist ) हरूसँग Agreement सम्पन्न**
- आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा मार्फत २ वटा आयोजना संचालित क्षेत्रका प्रादेशिक तथा स्थानिय तहहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, ३ वटा LCC र १ वटा ECTCC सम्पन्न, २ वटा आयोजना समबद्ध सरोकारवालाहरूसंग अन्तरक्रिया गोष्ठी सम्पन्न ।
- आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिबास मार्फत प्रदेश २ मा ECTCC को बैठक सम्पन्न भएको तथा विभिन्न पालिकाहरूमा LCC सँग समन्वय कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल मार्फत लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा ECTCC को बैठक सम्पन्न भएको तथा भालुवाङ रोल्पा कोरिडोरका सबै पालिकाहरूमा LCC सँग समन्वय कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा मार्फत प्रदेश स्तरिय आर्थिक कोरिडोर प्राविधिक तथा अनुगमन समितिको बैठक सन्चालन तथा जोरायल गा.पा, चुरे गा.पा र अमरगढी न.पा मा पालिका स्तरिय स्थानियतह समन्वय समिति बैठक संचालन भएको ।

# मन्त्रालयबाट सहजिकरण हुनुपर्ने केही कार्यहरू

- कृषि क्षेत्रको **Capacity Enhancement Need Assessment** को लागि **ToR** तथा **लागत estimate** स्विकृति
- आयोजनाको लागि आवश्यक **प्राविधिक सहायता फर्मको ToR** तथा **लागत estimate** स्विकृति
- आयोजनाका लागि आवश्यक **प्राविधिक कर्मचारी करार सेवाका लागि कार्यविधि** स्विकृति पठाईएको
- आयोजनाको **गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि** स्विकृति

Grant Operating Manual तयारी लगायत केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका संशोधनका लागि पेश भएकोमा हालसालै स्विकृत भएको

# प्रगति नपुगको कारणहरु

## पुँजीगत कार्यक्रम तर्फः

१. गाडी, मोटरसाईकल खरिद भइसकेको भुक्तानी हुन बाँकी
२. मोडल Bid documents स्विकृतीमा ढिलाई हुँदा कम्प्यूटर लगायत IT उपकरणहरूको टेण्डर कार्यहरु समयमा हुन नसकेको
३. स्थानीय तहहरूमा सेवा केन्द्रहरु निर्माण र प्रादेशिक बजार निर्माणका लागि DPR तयारीको स्विकृत कार्यक्रममा World Bank बाट Procurement Plan स्विकृतीमा ढिलाई

## चालु कार्यक्रम तर्फः

१. दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु समयमा उपलब्ध नभएका
२. कार्यविधिहरु समयमा स्विकृत नहुँदा करारमा प्राविधिक नियुक्ति हुन नसकेको
३. कोभिड, चाडपर्व विदाका कारण Individual Consultants छनौट, स्थानीय र प्रदेशस्तरका विभिन्न अन्तरक्रिया, बैठक, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु सन्चालन हुन नसकेका

# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक



# कोरिडर कार्यालयका व्यवस्थापन



# आयोजना अभिमुखिकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रम



# आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा समन्वय समिति

## Economic Corridor Technical & Coordination Committee

### ECTCC बैठक

स्थान : विनायक ब्यान्केट एण्ड ईभेन्ट सेन्टर, बर्दिवास-१

मिति : २०७८/०६/१७

समय : अपरान्ह ४:०० बजे ।

आयोजक :



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्डी विकास मन्त्रालय  
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (REED)



## आर्थिक करिडोर कार्यालय, बर्दिवास



# ECTCC र LCC बैठक बुटवल करिडोर





# LCC बैठक राजबिराज:



# अन्तरक्रिया कार्यक्रम महोत्तरी, जलेश्वर :





## ८४ स्थानीय तहमा विकास आयोजना

■ विजयकुमार साह

दुल्केबर, असोज १८ गते। हुलाकी राजमार्गले छोएको प्रदेश २ को ८४ स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा पर्सा गरी आठवटा जिल्लामा हुलाकी राजमार्गले छोएको पालिकामा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनको तयारी गरिएको हो।

आयोजनाअन्तर्गत अनाज बीउ, फलफूल, तरकारी, मसला, कुखुन, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी र वन पैदावार उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न उत्पादकको प्रोत्साहन तथा उपकरणहरूको सञ्चालन



समिति बैठकमा सहभागी।

तस्बिर : विजयकुमार साह/दुल्केबर

**ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना**

तयारी एवं तालिम क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। पाँचौँ चरणमा आकस्मिक प्रतिकार्यका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ। प्रदेश २ का ८४ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू हुनेछ।

कार्तिक ४, २०७८ | कान्तिपुर संवाददाता  
पर्सा — कृषि कर्मलाई ग्रामीण उद्यम र  
गर्न, कृषिउपज बजारीकरणको सुनिश्चितता  
कृषि उपजसँगको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न  
सरोकारवालाहरुले दिएका छन्।



## ६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, होला त सफल ? || Palika Khabar

६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व....

## आर्थिक विकास आयोजना संचालनमा

६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व....





# धन्यवाद

