



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना निर्देशकको कार्यालय
हरिहरभवन, ललितपुर



RURAL ENTERPRISE AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT (REED)

Office of the Project Director

Hariharbhawan, Lalitpur

प्रथम त्रैमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०८०/८१

स्वागतम्

मिति: २०८०/०८/१३

स्थान: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार

प्रस्तुतीको खाका

१. आयोजनाको संक्षिप्त परिचय
२. आ.व २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति
३. सम्पन्न मुख्य मुख्य कृयाकलापहरु
४. प्रगति कम हुनुका कारणहरु
५. आयोजना कार्यान्वयनका समस्या तथा समाधानका प्रयासहरु
६. अन्य विवरणहरु
 - आयोजनाको दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था
 - आयोजनाको सोधभर्ना अवस्था
 - बेरुजु बिवरण
 - कार्यक्रम सचालनका केहि झलकहरु

आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी



आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

आयोजना

आयोजना सम्झौता मिति

आयोजना प्रभावकारी भएको मिति

आयोजना समाप्ती मिति

आयोजना अवधि

आयोजनाको कुल लागत
(मिलियन अमेरिकी डलर)

दातृ निकाय

आयोजना कार्यान्वयन निकाय

आयोजना लागू हुने प्रदेश संख्या

आयोजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक कोरिडोर

आयोजना लागू हुने पालिका संख्या

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय संख्या/रहने स्थान

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

२१ डिसेम्बर २०२० (२०७७ पुष ६)

१९ मार्च २०२१ (२०७७ चैत्र ६)

१५ जुलाई २०२५ (२०८२ आषाढ ३१)

सन् २०२१ - २०२५ सम्म (५ वर्ष)

१२० (दातृ निकाय: ८०, लाभग्राहीको योगदान: ४०)

विश्व बैंक

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

६ (कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम)

५ (मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ-रोल्पा राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग)

१७१

४ (पाखिबास, बर्दिबास, बुटवल, डडेल्धुरा)

आयोजनाको कार्यक्षेत्र



आर्थिक कोरिडोर	प्रदेश	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय
मध्य पहाडी लोकमार्ग	कोशी प्रदेश	७	२२	पाखिबास
	बागमती	६	१८	
मध्य पहाडी लोकमार्ग	गण्डकी	५	२१	बुटवल
भालुवाङ-रोल्पा लोकमार्ग	लुम्बिनी	४	९	
हुलाकी राजमार्ग	मधेश प्रदेश	८	८४	बर्दिबास
पूर्व पश्चिम राजमार्ग				
महाकाली राजमार्ग	सुदूरपश्चिम	५	१७	डडेल्धुरा
जम्मा		३५	१७१	

१००
उत्पादनमूलक
साझेदारी

साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय
विकास सहयोग

प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्राविधिकहरूको
क्षमता विकास
(२० महिला)

१० कृषि तथा पशुपन्छी सेवाकेन्द्रहरू,
४ प्रादेशिक बजारहरू र ५० मूल्य
श्रृंखला पूर्वाधार निर्माणबाट ग्रामीण
अल्पकालीन रोजगारी सृजना

२०%
उत्पादक संस्थाहरूको विक्रीको
औषत मूल्यमा वृद्धि
(महिला संस्थाहरूको हकमा ३५%)

आयोजनाको अपेक्षित
उपलब्धी तथा
सूचकहरू

Cash for work
Modality

२४०००
प्रत्यक्ष लाभान्वित कृषक
(४०% महिला)

१०० जना उद्यमीहरूलाई Business
Coaching र २५ जनालाई Intensive
Business Incubation support
८६ सरकारी निकाय
६- प्रादेशिक तथा ८० स्थानिय तह मा कार्यरत
प्राविधिकहरूको क्षमता विकास

५७००
अल्पकालिन ग्रामीण रोजगारी- कोभिड १९
प्रतिकार्य
(५०% महिला)
३५००
कृषक कृषि सेवाबाट लाभान्वित

आयोजनाको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण



बजेट विनियोजनको अवस्था (रु हजारमा)




क्र.सं.	कार्यालयको नाम	प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट			बार्षिक विनियोजित बजेट		
		चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	५२७५३.००	३००००.००	८२७५३.००	१८४९७०.००	३०००००.००	४८४९७०.००
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	३३२३९.००	५६७५०.००	८९९८९.००	२७१०७३.००	२२५५००.००	४९६५७३.००
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	९५७४.००	७८१२५.००	८७६९९.००	४९३१३३.००	३१२५००.००	८०५६३३.००
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	९१३८३.००	५००००.००	१४१३८३.००	३३५३६९.००	२२५०००.००	५६०३६९.००
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	५८७५६.००	५००००.००	१०८७५६.००	२३१९५५.००	२२५०००.००	४५६९५५.००
	जम्मा	२४५७०५.००	२६४८७५.००	५१०५८०.०० (१८.२%)	१५१६५००.००	१२८८०००.००	२८०४५००.००

श्रोतगत, निकायगत एवं संभाग अनुसार बजेटको अवस्था

कार्यालय अनुसार बजेट विनियोजन

संभाग अनुसार बजेट विनियोजन


श्रोतगत बजेट विनियोजन

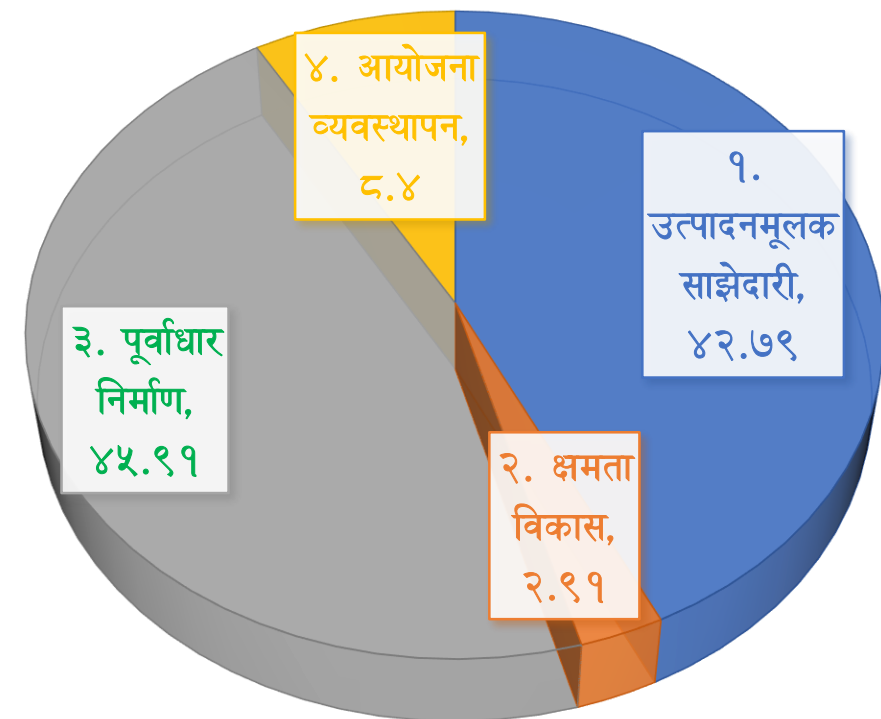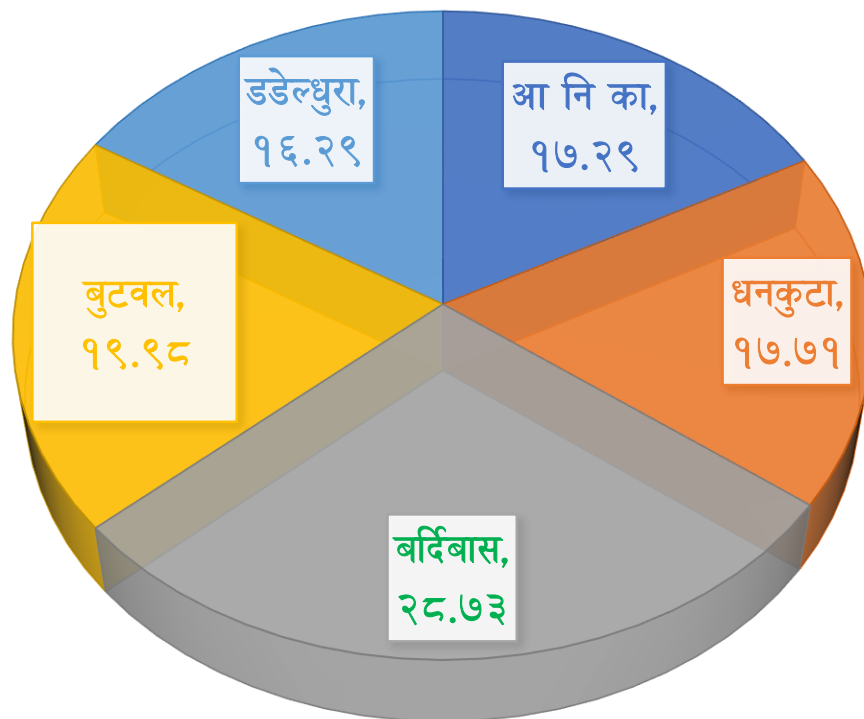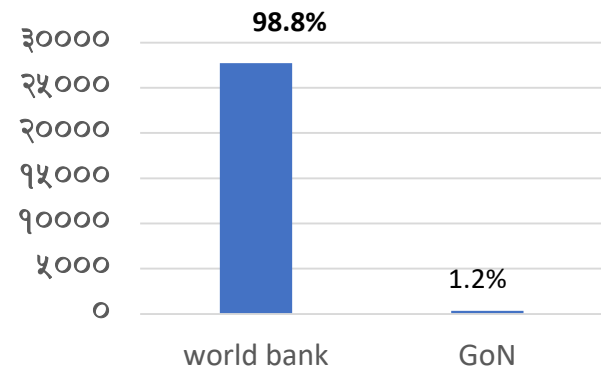

वार्षिक विनियोजन: कुल: २ अर्ब ८० करोड ४५ लाख
 चालु: १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख (५४.९%)
 पूँजिगत: १ अर्ब २८ करोड ८० लाख (४५.९%)

आ.व.२०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक भारित र वित्तीय प्रगति सारांश


निकायगत भारित र वित्तीय प्रगति प्रतिशत

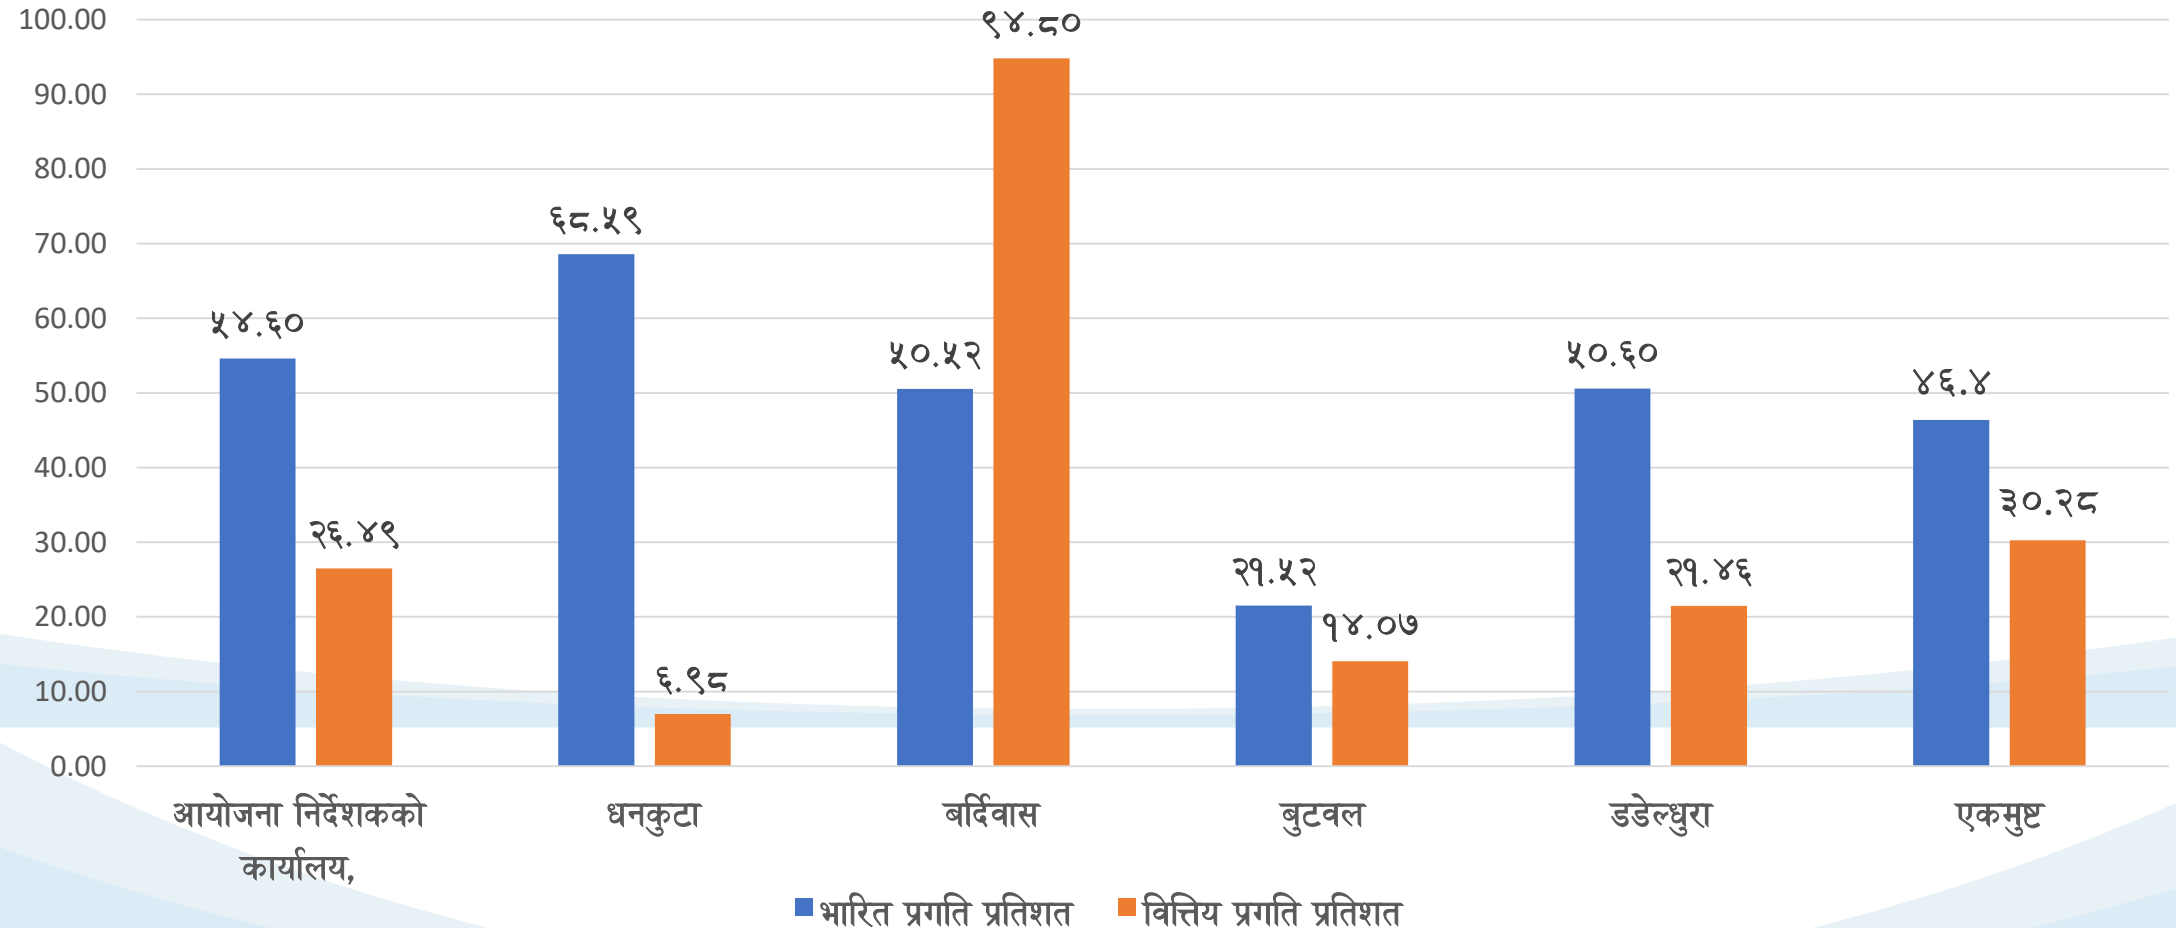

प्रथम त्रैमासिक बजेट, निकास र खर्च (रु हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट			प्रथम त्रैमासिक निकास/ खर्च			प्रथम त्रैमासिक विनियोजन को तुलनामा खर्चको प्रतिशत
		चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	कुल	
1	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	५२७५३.००	३००००.००	८२७५३.००	२१९१८.४४	०.००	२१९१८.४४	२६.४९
2	धनकुटा	३३२३९.००	५६७५०.००	८९९८९.००	६२८०.००	०.००	६२८०.००	६.९८
3	बर्दिवास	९५७४.००	७८१२५.००	८७६९९.००	५८७४.००	७७२६९.००	८३१४३.००	९४.८०
4	बुटवल	९१३८३.००	५००००.००	१४१३८३.००	४७८३.००	१५११३.००	१९८९६.००	१४.०७
5	डडेल्धुरा	५८७५६.००	५००००.००	१०८७५६.००	१७७५.०८	२१५६७.००	२३३४२.०८	२१.४६
	जम्मा	२४५७०५.००	२६४८७५.००	५१०५८०.००	४०६३०.५२	११३९४९.००	१५४५७९.५२	३०.२८
					16.5	43.0		

हाल सम्म बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था (बजेट रु दश लाखमा)

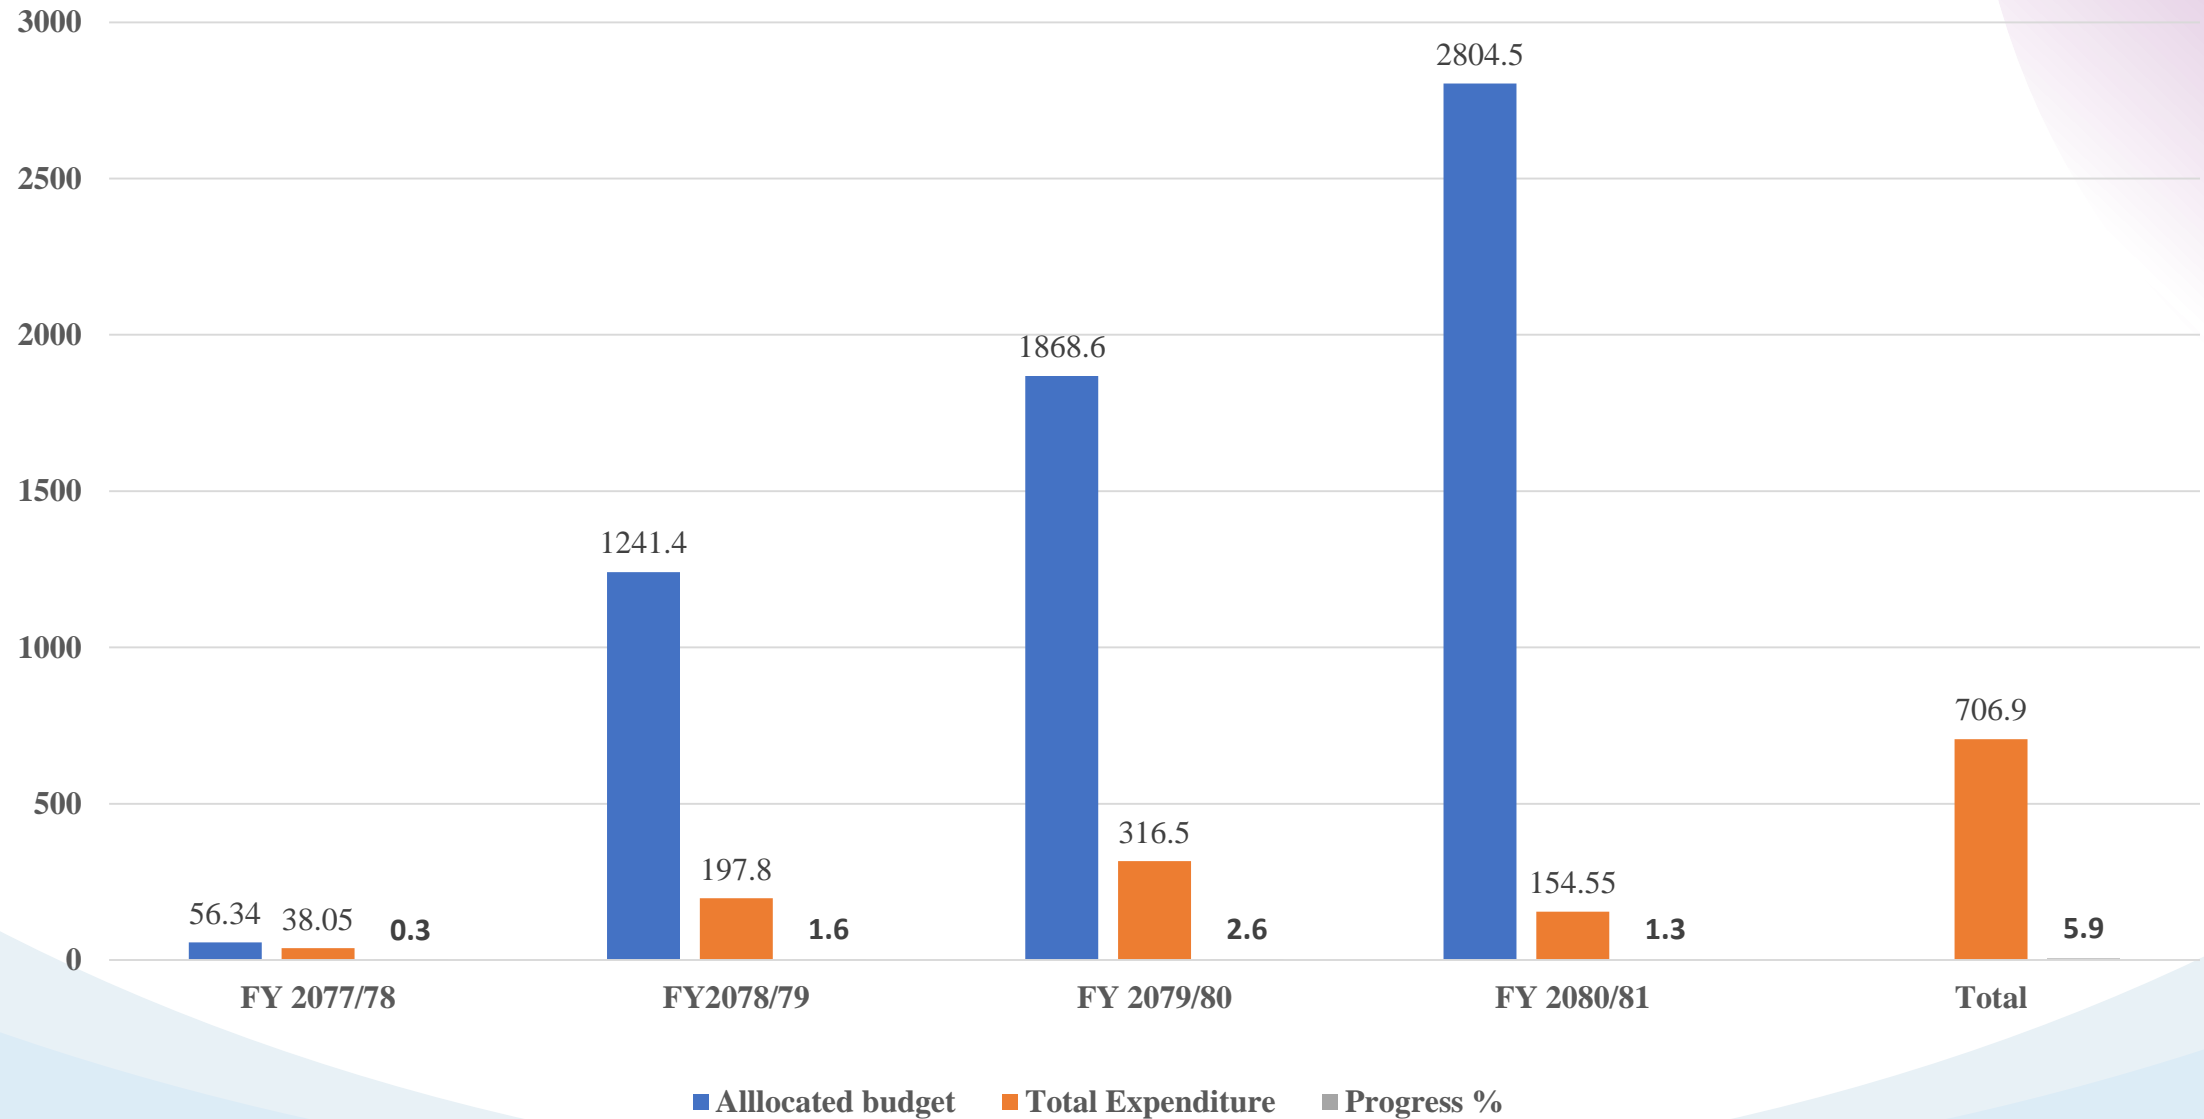


संभाग अनुसार सम्पन्न मुख्य कृत्याकलापहरु र प्रगति अवस्था

संभाग १


-स्टार्ट अप अनुदानका लागि १९०६ वटा संयुक्त प्रोफाइलहरू प्राप्त भई फिल्ड भेरिफिकेशन संग संगै व्यावसायिक योजना तयारी कार्य भै राखेको

No. of JPs received (ECOWISE)

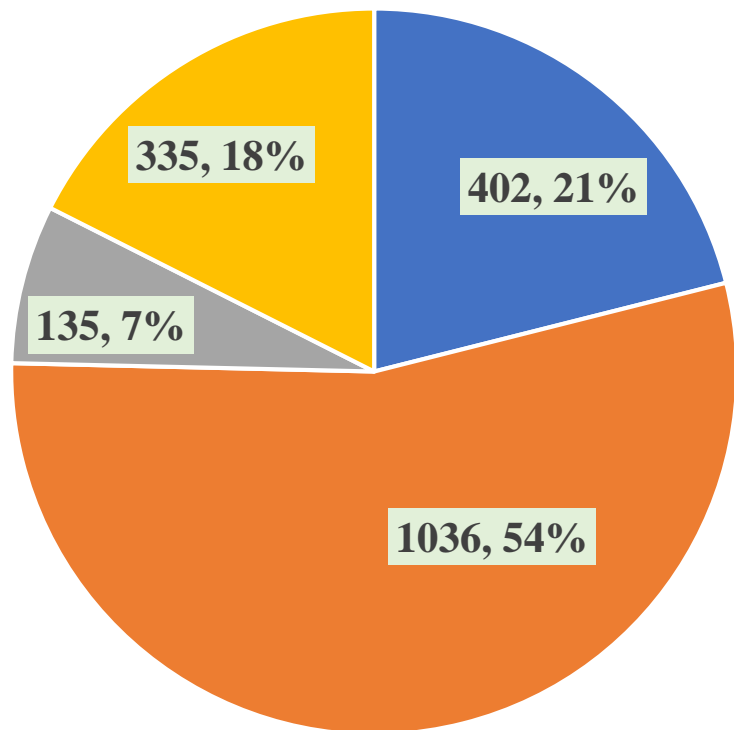


■ ECO Dhankuta ■ ECO Bardibas ■ ECO Butwal ■ ECO Dadeldhura

उत्पादक संस्थाहरूको आधारमा संयुक्त प्रोफाइलको संख्या

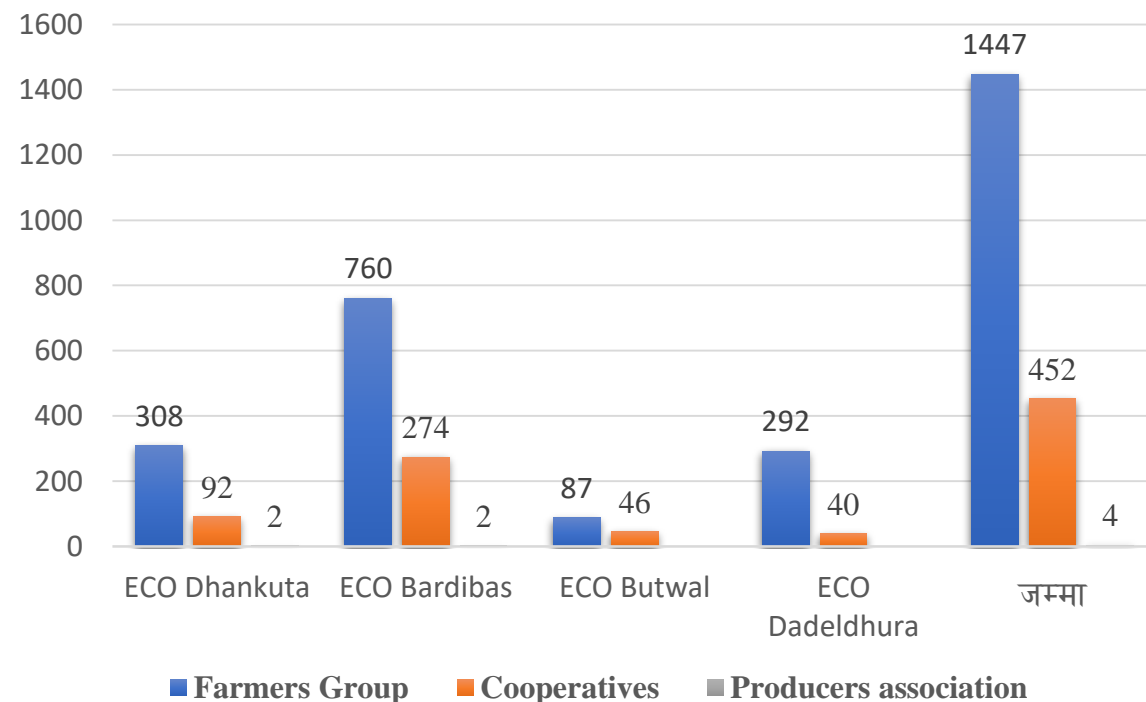

■ Farmers Group ■ Cooperatives ■ Producers association

Status of Joint Profile Evaluation officewise

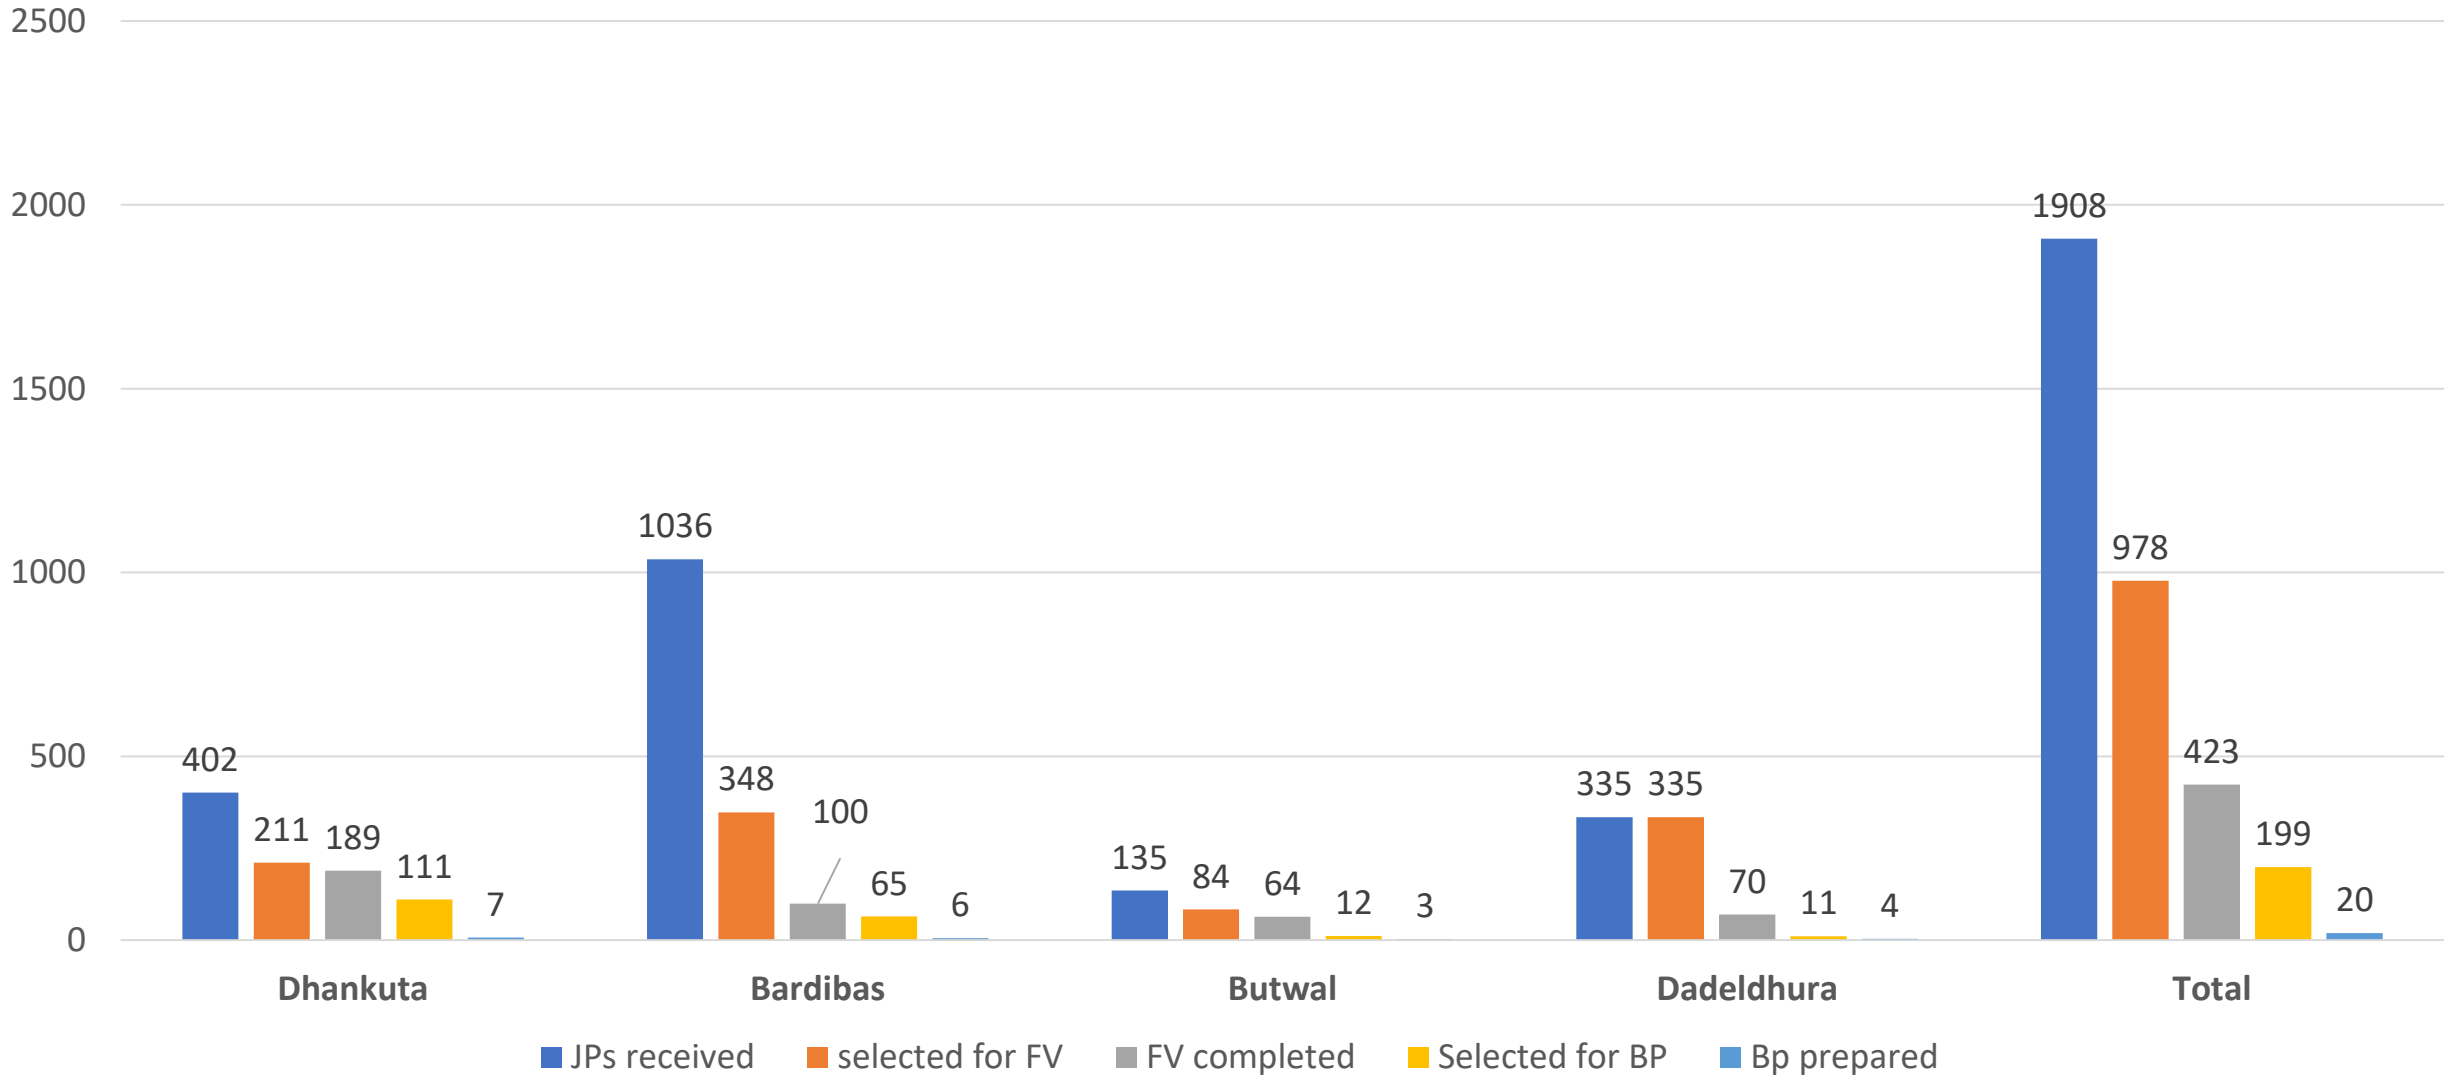



आयोजना निर्देशकको कार्यालयका पदाधिकारीको साथमा खरिदकर्ता सँग छलफल



तेह्रथुम



प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, बागमती सम्पर्क केन्द्र, धुलिखेल



प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, पाखीबास



भुम्लु गाउँपालिका



मादन कुडारी, चोरीदेउराली



चोरी देउराली गाउँपालिका



चोरी देउराली गाउँपालिका



कार्यालयमा उत्पादक संस्थाका पदाधिकारीहरु सँग छलफल



Desk Screening



शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट



पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोट



खरिदकर्ता संग भेटघाट



स्थलगत निरिक्षण



विदुर नगरपालिका, नुवाकोट



खरिदकर्ताको जानकारी लिँदै



निलकण्ठ नगरपालिका (बाखापालन)



निलकण्ठ नगरपालिका (दुध उत्पादन)




त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ



भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रे

Component 2B: Incubation support for SMEs

SMEs by commodities engaged in

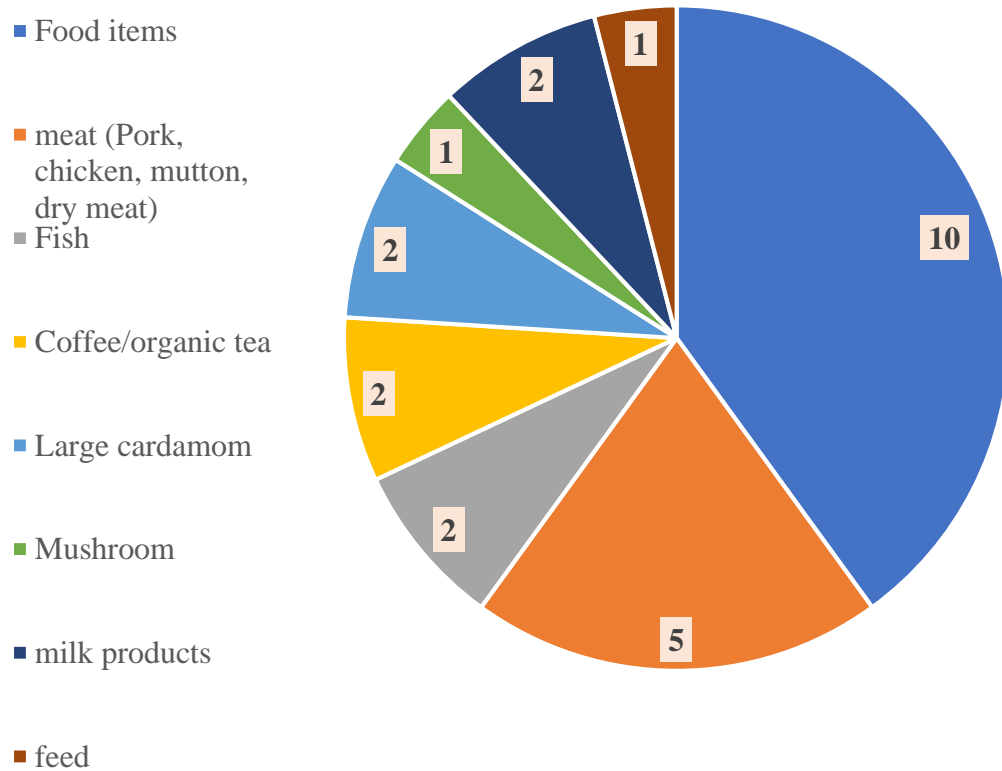

SMEs by Value chain activities



संभाग ३ अन्तर्गत पालिकास्तर कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रहरु र प्रादेशिक बजार निर्माण

क्र.सं.	आयोजना कार्यालयहरु	चालु आ वको लक्ष्य		प्रगति	
		सेवा केन्द्र	प्रादेशिक बजार	सेवा केन्द्र	प्रादेशिक बजार
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	०	४		२ वटाको DPR तयार भएको
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	१०		५	Concrete strength test पुन गर्नुपर्ने देखिएकाले हाललाई सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुलीको निर्माण स्थगन गरिएको
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	१०		१०	
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	१०		८	रोल्पा र बाग्लुङ्गको सम्झौता रद्द गरिएको
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	१०		९	गोदावरी जग्गा स्वामित्व विवादका कारण कार्य स्थगन गरिएको


पालिकास्तरमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण हुने स्थानीय तह

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर



त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ

टेम्केमैयुम गाउँपालिका, भोजपुर

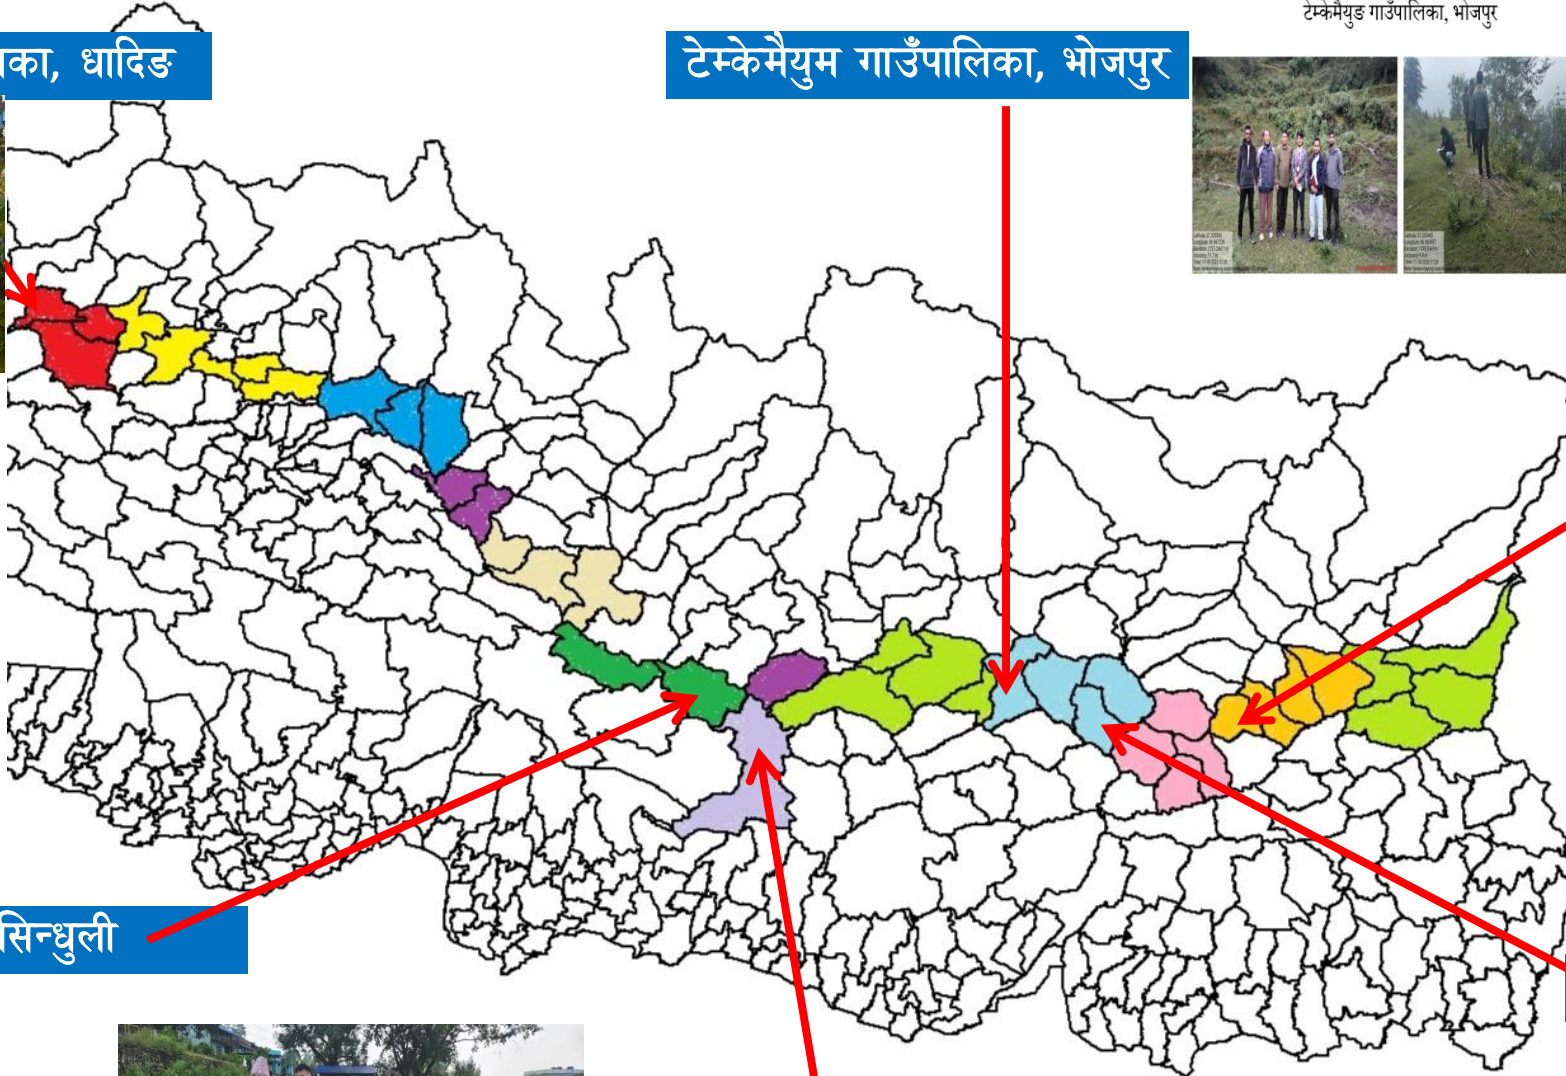

लालिगुँरास नगरपालिका, तेह्रथुम



फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली

पौवादुडमा गाउँपालिका, भोजपुर

पौवादुडमा गाउँपालिका




कटारी नगरपालिका, उदयपुर



२०८०/०७/२१ देखि २३ म

reedecodhankuta@gmail.com, 026-405171

पालिकास्तरमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण हुने स्थानीय तह

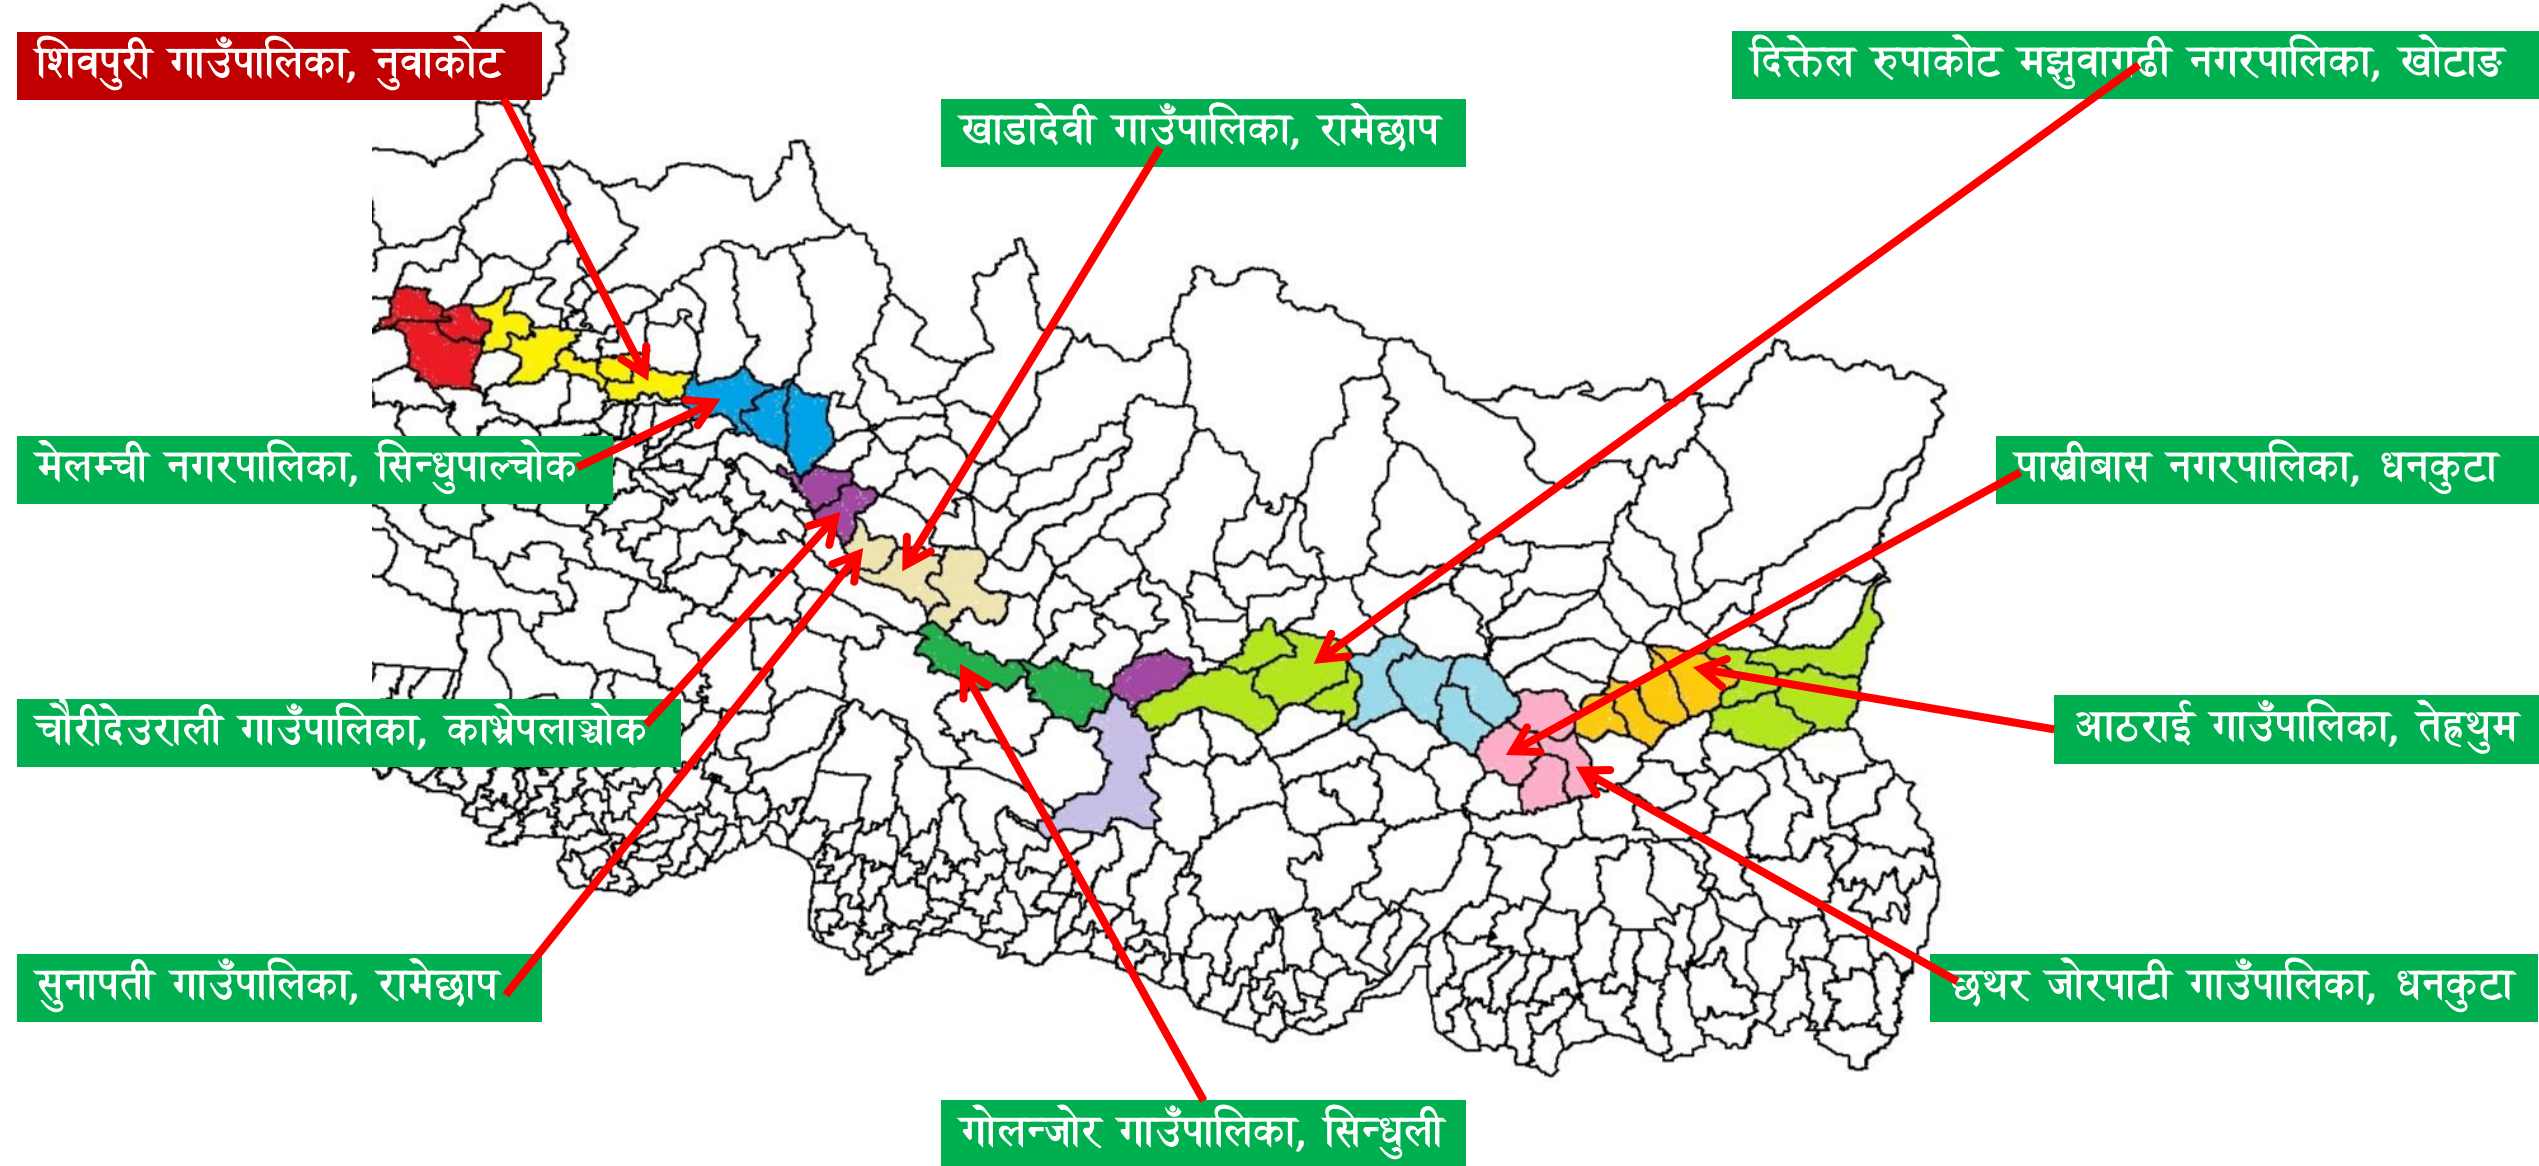



आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम



निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा जग खन्दा पानीको मुहान फेला परेको हुँदा आवश्यक व्यवस्थापन भइ निर्माण सामग्रीहरु निर्माण स्थलमा जुटाइ हाल निर्माण द्रुत गतिमा अगाडी बढी रहेको



पाख्रीबास नगरपालिका
धनकुटा



दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाड



ईन्जिनियरको सिफारीस अनुसार माटोको Bearing Test परिक्षणको लागि केन्द्रिय निर्माण वस्तु परिक्षण प्रयोगशालामा आवश्यक नमुना पठाइएको र परिक्षण भइ रहेको हुँदा हाल निर्माण कार्य रोकिएको



गोलन्जोर
गाउँपालिका
सिन्धुली





सुनापति गाउँपालिका रामेछाप

**Footing को Cube Test Fail भएको हुँदा
ईन्जिनियरबाट सिफारिस भए अनुसार
आवश्यक परिक्षण पश्चात मापदण्ड पुरा
भएको एकिन गरी यथासिघ्र कार्य अगाडी
बढाउन पत्राचार गरिएको**



Footing र Plinth Beam को Cube Test Fail भएको हुँदा ईन्जिनियरबाट सिफारिस भए अनुसार आवश्यक परिक्षण पश्चात मापदण्ड पुरा भएको एकिन गरी यथासिघ्र कार्य अगाडी बढाउन पत्राचार गरिएको

चौरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक



२०८०/०७/२१ देखि २३ गते सम्म

reedecodhankuta@gmail.com, 026-405171

बलान विहुल गा.पा.-०१, सप्तरी



औरही गा.पा.-०५, सिरहा



जगरनाथपुर गा.पा.-०५, पर्सा



भगवानपुर गा.पा.-०५, सिरहा



REDMI NOTE 11 PRO
108MP, AADESH

04/11/2023 13:11

मिथिला न.पा.-०७, धनुषा

कमला न.पा.-०२, धनुषा



कौडेना गा.पा.-०१, सर्लाही



REDMI NOTE 11
108MP, AADESH

3 10 10

सम्सी गा.पा.-०५, महोत्तरी



फेटा गा.पा.-०३, बारा



राजपुर गा.पा.-०१, रौतहट





आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुर्दिबास अन्तर्गत थप निर्माणका लागि DPR तयार भैरहेका सेवाकेन्द्रहरु

S.N	Name of Municipality	District
1	Bodebarsain Municipality	Saptari
2	Khadak Municipality	Saptari
3	Karjanaha Municipality	Siraha
4	Sabaila Municipality	Dhanusha
5	Ganeshman-charnath Municipality	Dhanusha
6	Ramgopalpur Municipality	Mahottari
7	Manara-siswa Municipality	Mahottari
8	Bagmati Municipality	Sarlahi
9	Baragadi Rural Municipality	Bara
10	Thori Rural Municipality	Parsa



MALSC District Location Wise

NEPAL: Administrative Unit - State 2 Map

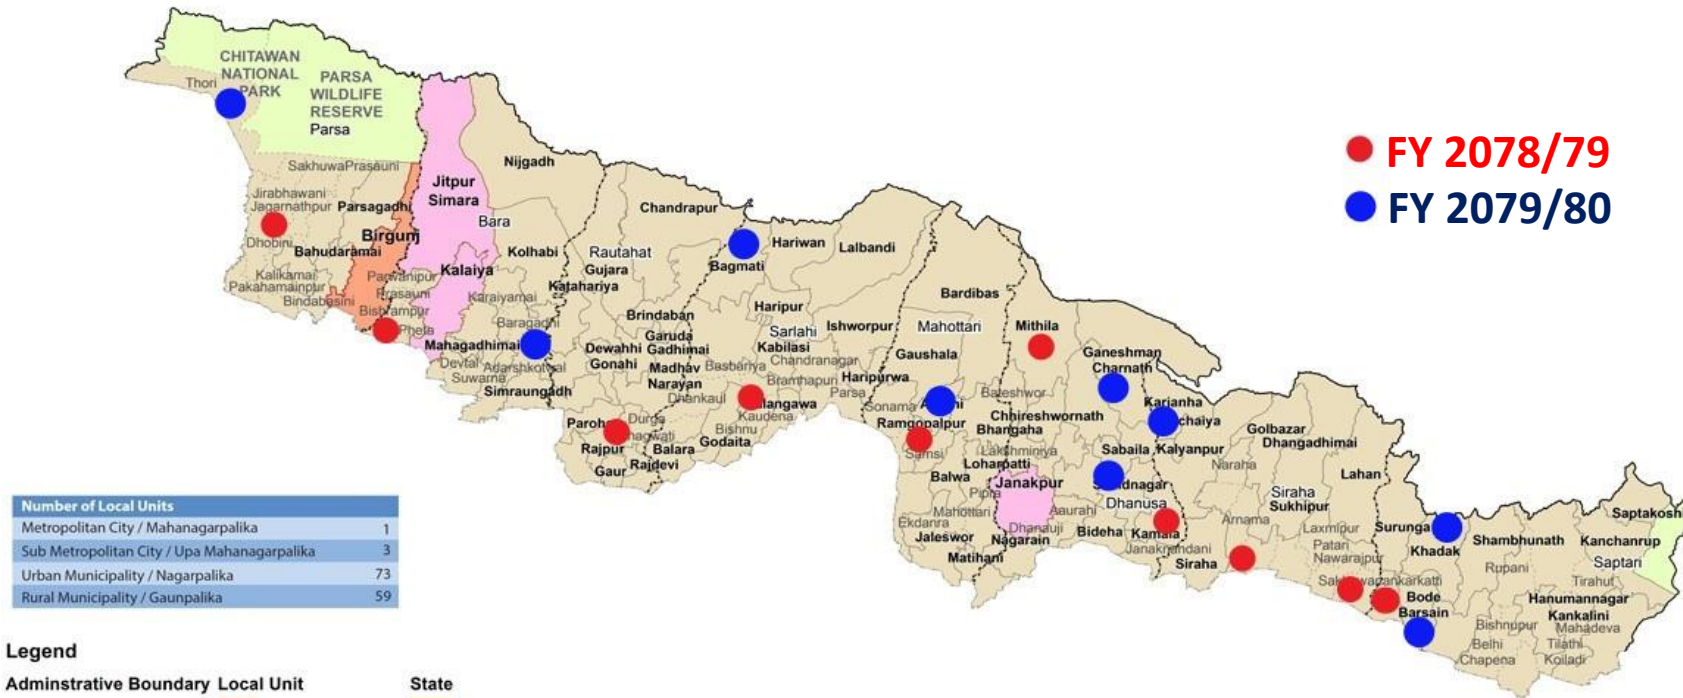

Number of Local Units	
Metropolitan City / Mahanagarpalika	1
Sub Metropolitan City / Upa Mahanagarpalika	3
Urban Municipality / Nagarpalika	73
Rural Municipality / Gaunpalika	59

Legend

Administrative Boundary Local Unit		State
----- International	Metropolitan City	1
----- State	Sub Metropolitan City	2
----- District	Designated Area	3
----- Metropolitan		4
----- Sub Metropolitan		5
----- Urban Municipality		6
----- Rural Municipality		7

0 155 310 620 KM
 Creation Date: 06 November 2017
 Map data source(s): Nepal Gazette, DoS, ECN GoN

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवल अन्तर्गत निर्माणका लागि सम्झौता भएका सेवाकेन्द्रहरु

S.N	Name of Municipality	District
1	Rapti Rural Minicipality	Dang
2	Sarumarani Rural Municipality	Pyuthan
3	Sunil Smriti Rural Municipality	Rolpa
4	Pokhara Metropolitan	Kaski
5	Annapurna Rural Municipality	Kaski
6	Rupa Rural Municipality	Kaski
7	Palungtar Municipality	Gorkha
8	Baglung municipality	Baglung
9	Sundarbazar Municipality	Lamjung
10	MadhyaNepal Municipality	Lamjung



MALSC Construction

Rapti Rural Municipality





Sarumarani Rural Municipality



Sundarbazar Municipality

MALSC Construction



Annapurna Rural Municipality



Pokhara Metropolitan


आर्थिक कोरिडोर कार्यालय डडेल्धुरा अन्तर्गत निर्माणका लागि सम्झौता भएका सेवाकेन्द्रहरु

S.N	Name of Municipality	District
1	गोदावरी नगरपालिका	कैलाली
2	चुरे गाउँपालिका	कैलाली
3	गन्यापधुरा गाउँपालिका	डडेल्धुरा
4	आलिताल गाउँपालिका	डडेल्धुरा
5	अजयमेरु गाउँपालिका	डडेल्धुरा
6	नबदुर्गा गाउँपालिका	डडेल्धुरा
7	पाटन नगरपालिका	बैतडी
8	मालिकाअर्जुन गाउँपालिका	दार्चुला
9	शैल्याशिखर नगरपालिका	दार्चुला
10	जोरायल गाउँपालिका	डोटी




दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति अवस्था


Total

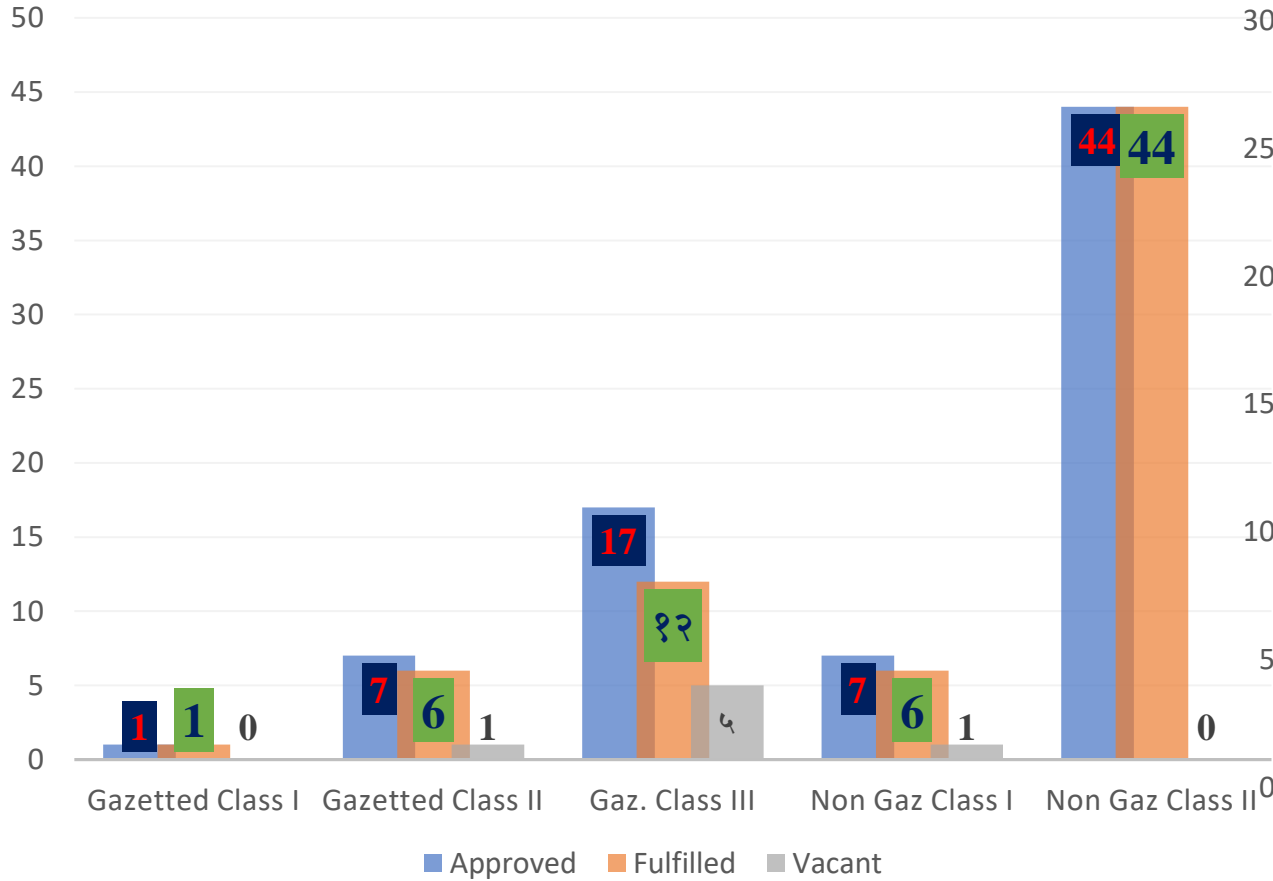

Officewise

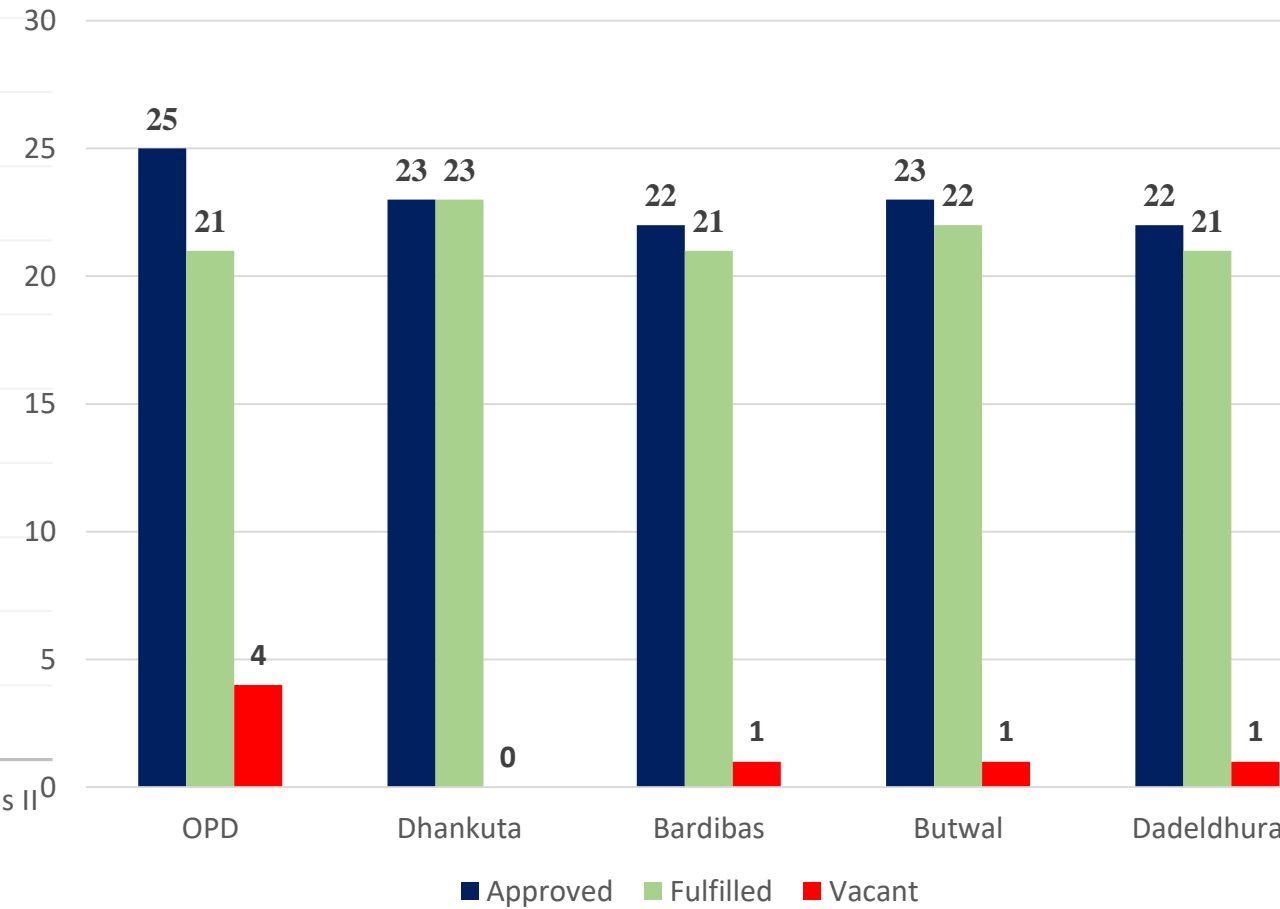

Disbursement Status (Million NPR)

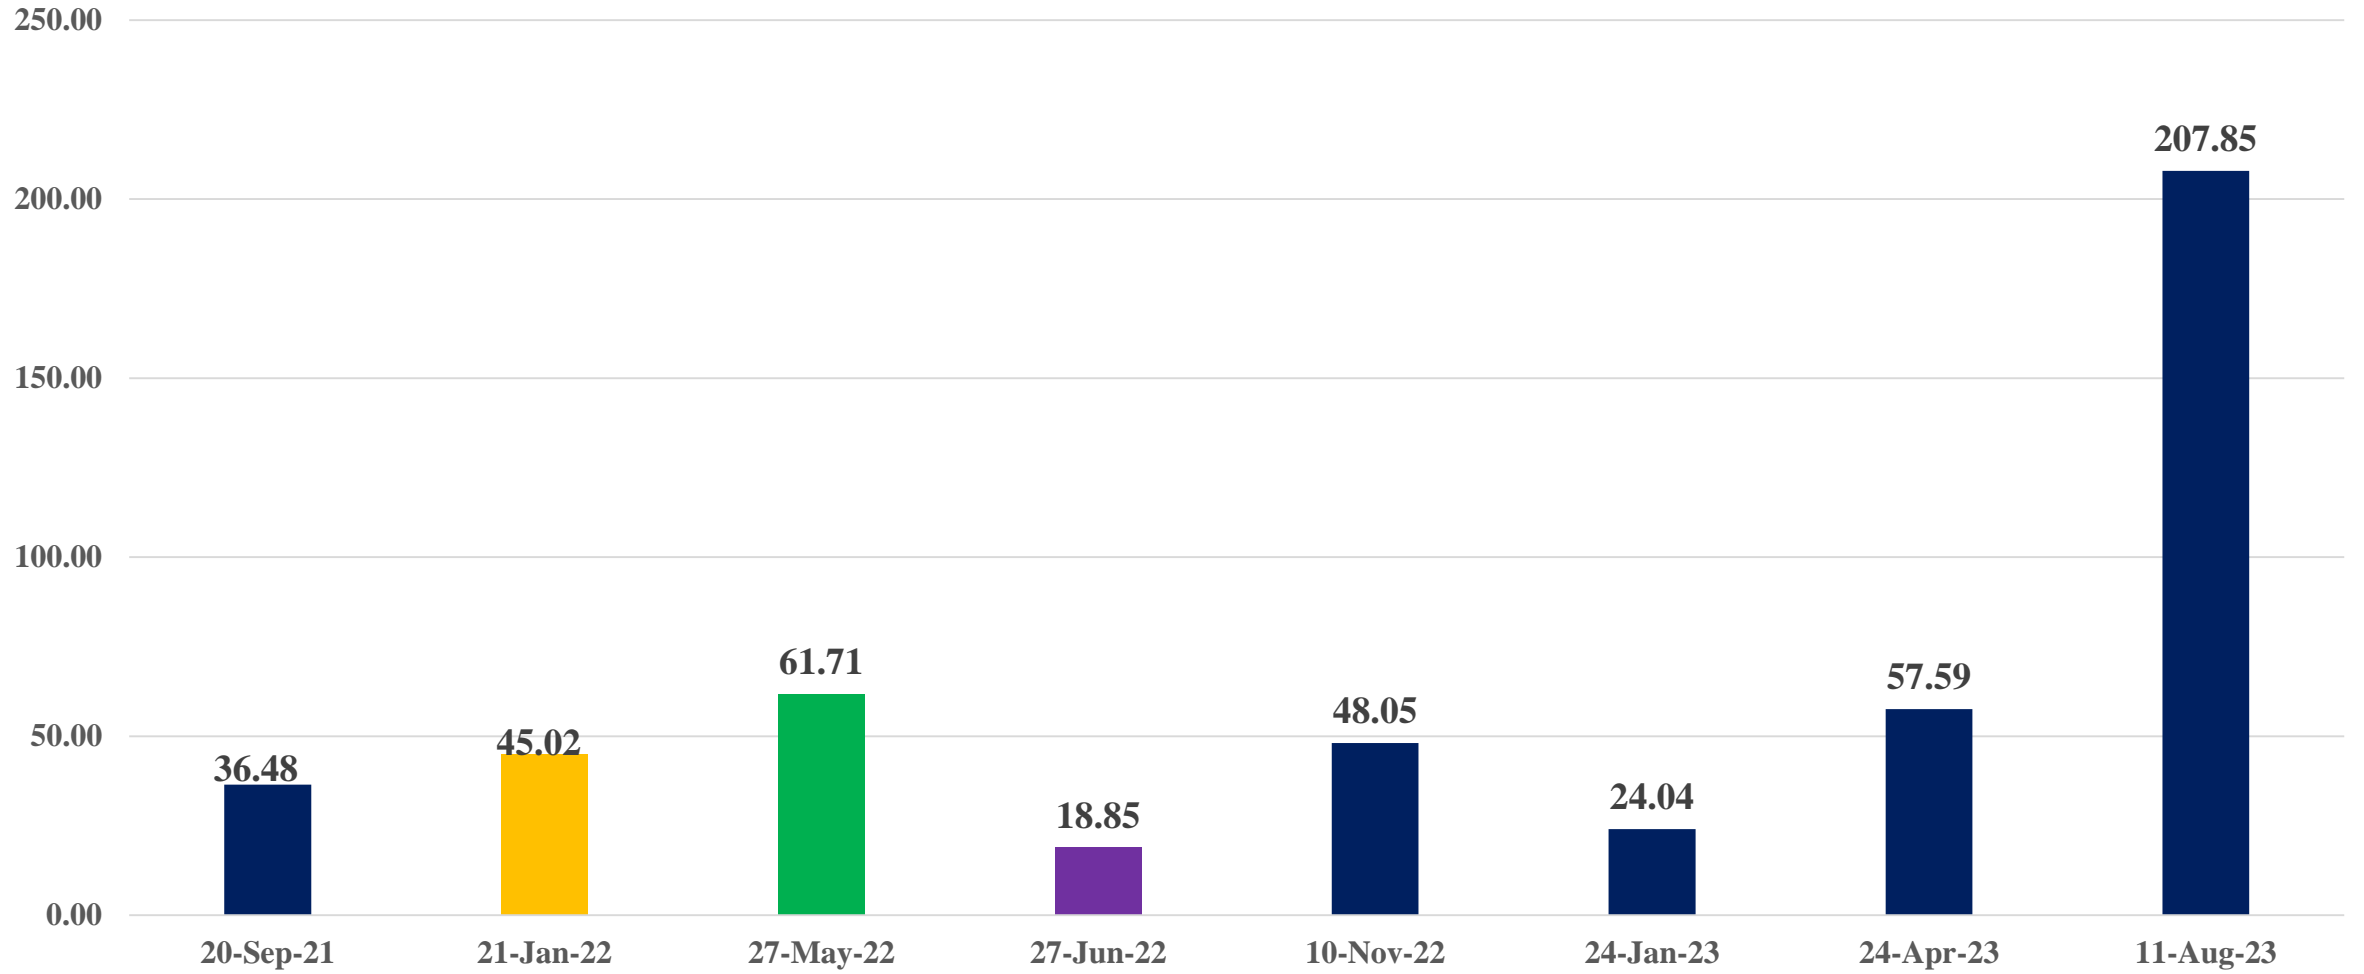

**Total Disbursement: NPR 499.599 million
USD: 3.75 Million (@133) i.e 4.68%**

बेरुजुको विवरण


बेरुजुको विवरण रकम रु

क्र	कार्यालयको नाम	फर्छौं गनुपर्ने कुल बेरुजु रकम	फर्छौं भएको बेरुजु	फर्छौं प्रतिशत	
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय हरिहरभवन	०	०	०	
२	आर्थिक करिडोर कार्यालय, धनकुटा	०	०	०	
३	आर्थिक करिडोर कार्यालय, बर्दिवास	०	०	०	
४	आर्थिक करिडोर कार्यालय, बुटवल	१८८०००।०	०	०	
५	आर्थिक करिडोर कार्यालय, डडेल्धुरा	२१९२९८.००	०	०	
	जम्मा	४०७२९८/-	०	०	

प्रगति नपुगको कारणहरु

क्र स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रगति नपुग हुनुका कारणहरु	कैफियत
१	प्रादेशिक कृषि बजार निर्माण	दातृ निकाय विश्व बैंकको निर्णय अनुसार हाललाई प्रस्तावित क्रियाकलाप स्थगन गरेको	
२.	CNA प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसार क्षमता विकास तालिम सन्चालन	दातृ निकायबाट प्राप्त सुझाव अनुसार निर्माणाधिन MALSCs को निर्माण सम्पन्न भएपश्चात संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन हुने	
३	व्यावसायिक योजना तयारी र अनुदान प्रवाह	प्राप्त प्रस्तावहरुको फिल्ड अनुगमनको भई व्यावसायिक योजनाहरुको तयारी र मूल्यांकनको चरणमा रहेको	

Budget comparison of project before and after restructuring

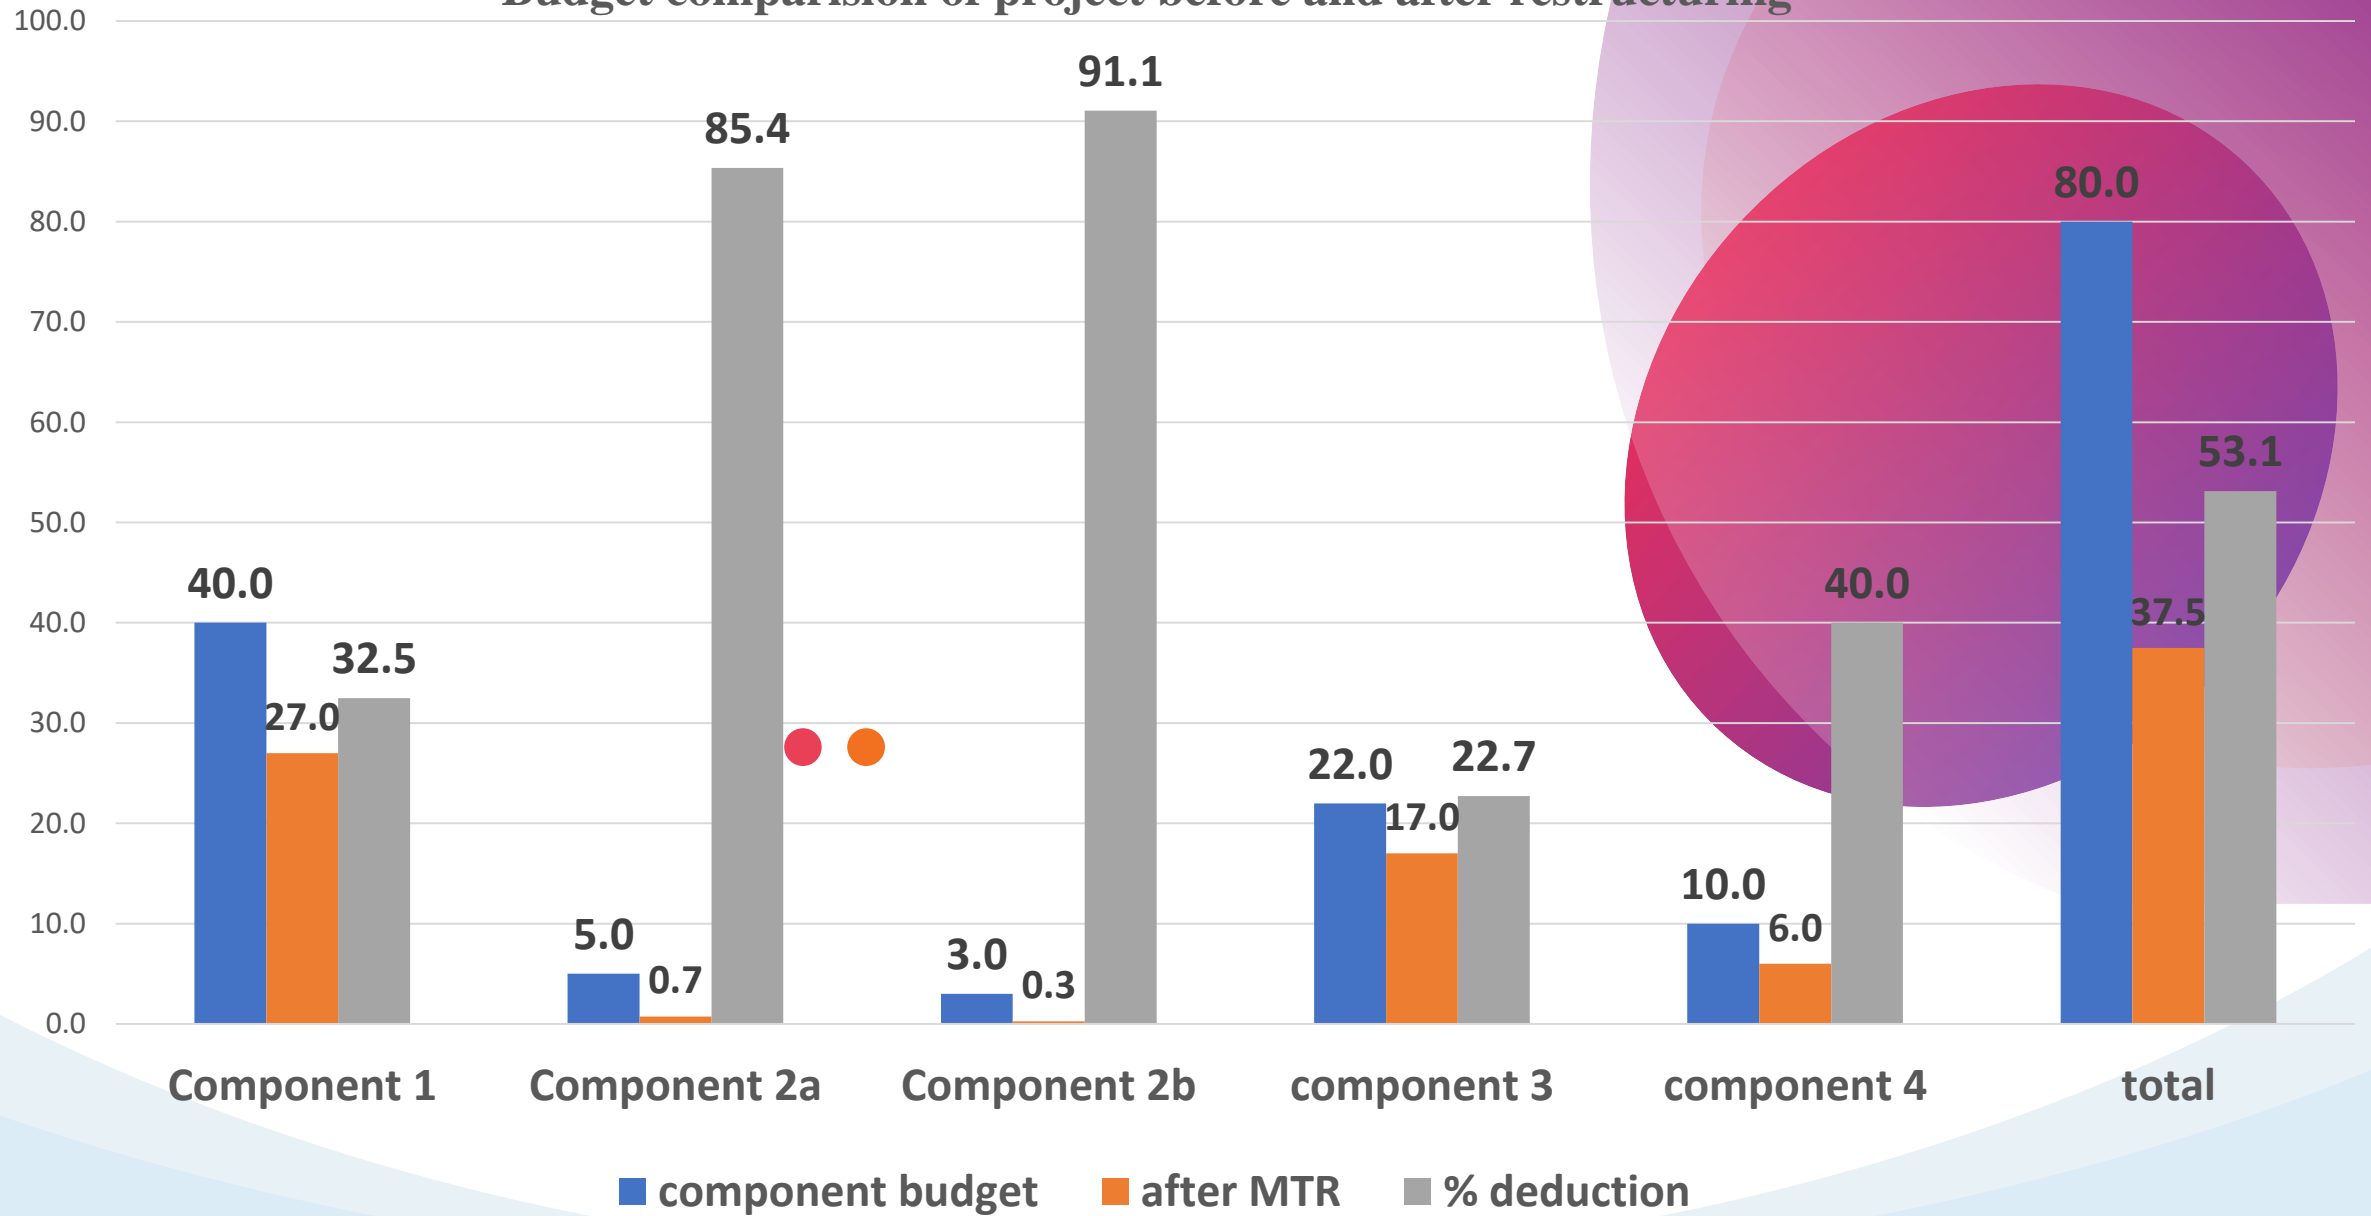

आयोजना समग्रमा नै प्रभावकारी हुन नसक्नुका केही कारणहरू

१. परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल तयारी पश्चात पुन आयोजनाका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू कार्यान्वयनका छुट्टा छुट्टै म्यानुअलहरू तर्जुमा र स्विकृती प्रकृत्याले गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाई
२. आयोजना परामर्शदाता संस्थाहरूको छनौटमा ढिलाई
३. आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हेरफेर भैरहने
४. दातृ निकाय र नेपाल सरकारका तर्फबाट पटक पटक स्विकृती र सहमती प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समेत कार्यक्रम सन्चालनमा ढिलाई हुने
५. निर्माण लगायतका कृयाकलापहरूमा उपयुक्त स्थान उपलब्धतामा समस्याहरू रहने

धन्यवाद
