



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना निर्देशकको कार्यालय
हरिहरभवन, ललितपुर



RURAL ENTERPRISE AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT (REED)

Office of the Project Director

Hariharbhawan, Lalitpur

दोश्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी
२०७९/८०

स्वागतम्

मिति: २०७९/१०/१६

स्थान: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार

प्रस्तुतीको खाका

१. आयोजनाको संक्षिप्त परिचय
२. चालु आ.व २०७९/८० को दोश्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
३. आयोजनाको दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था
४. आयोजनाको सोधभर्ना अवस्था
५. प्रगति कम हुनुका कारणहरु
६. आयोजना कार्यान्वयनका समस्याहरु

आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी



आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

आयोजना

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना सम्झौता मिति

२१ डिसेम्बर २०२० (२०७७ पुष ६)

आयोजना प्रभावकारी भएको मिति

१९ मार्च २०२१ (२०७७ चैत्र ६)

आयोजना समाप्ती मिति

१५ जुलाई २०२५ (२०८२ आषाढ ३१)

आयोजना अवधि

सन् २०२१ - २०२५ सम्म (५ वर्ष)

आयोजनाको कुल लागत
(मिलियन अमेरिकी डलर)

१२० (दातृ निकाय: ८०, लाभग्राहीको योगदान: ४०)

दातृ निकाय

विश्व बैंक

आयोजना कार्यान्वयन निकाय

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

आयोजना लागू हुने प्रदेश संख्या

६ (प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम)

आयोजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक कोरिडोर

५ (मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ-रोल्पा राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग)


आयोजना लागू हुने पालिका संख्या

१७१

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय संख्या/रहने स्थान

४ (पाख्रिबास, बर्दिबास, बुटवल, डडेल्धुरा)

आयोजनाको कार्यक्षेत्र

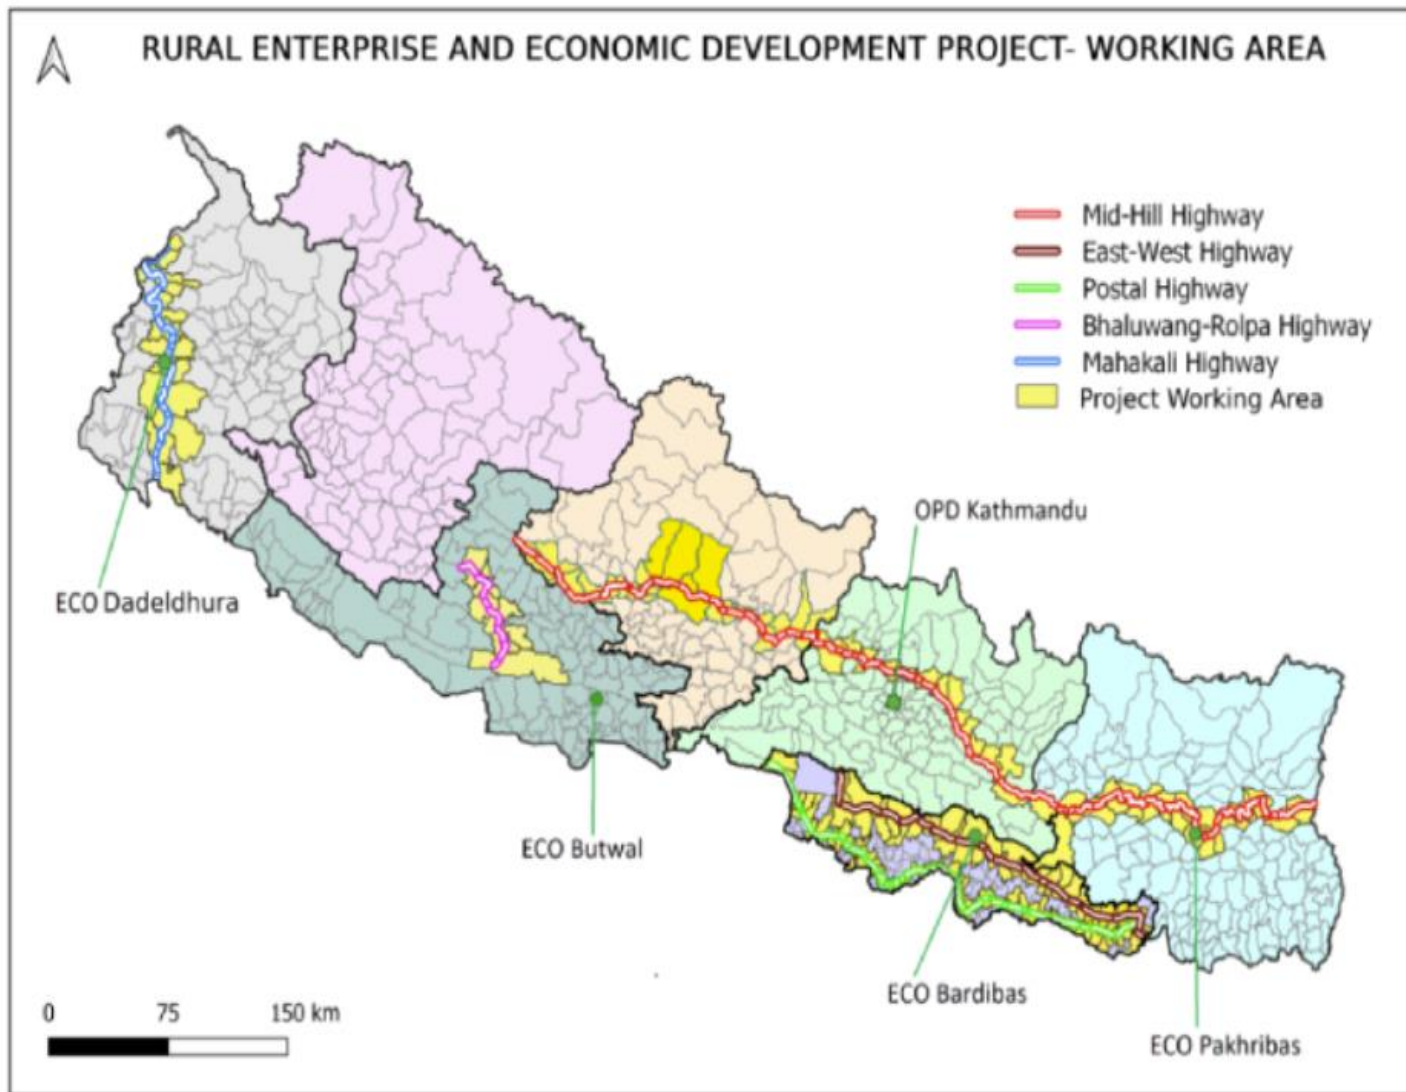

आर्थिक कोरिडोर	प्रदेश	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय
मध्य पहाडी लोकमार्ग	प्रदेश नं. १	७	२२	पाखिबास
	बाग्मती	६	१८	
मध्य पहाडी लोकमार्ग	गण्डकी	५	२१	बुटवल
भालुवाङ-रोल्पा लोकमार्ग	लुम्बिनी	४	९	
हुलाकी राजमार्ग	प्रदेश नं. २	८	८४	बर्दिबास
पूर्व पश्चिम राजमार्ग				
महाकाली राजमार्ग	सुदूरपश्चिम	५	१७	डडेल्धुरा
जम्मा		३५	१७१	

१४०
उत्पादन साझेदारी



५७००
अल्पकालिन ग्रामिण रोजगारी- कोभिड १९
प्रतिकार्य

१००
साना तथा मझौला उद्यम

आयोजनाको अपेक्षित
उपलब्धि

कृषक पालिकास्तर कृषि तथा पशुपन्छी
सेवा केन्द्र, बजार तथा मूल्यऋखला
पूर्वाधारबाट ३५०० कृषक
लाभान्वित ।

२४००००

साना उत्पादक कृषक तथा ग्रामिण
उत्पादकहरु

३५%

महिला लाभग्राही

८६

सरकारी निकाय
६- प्रादेशिक तथा ८० स्थानिय तह

आयोजनाको दोश्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति विवरण




बजेट विनियोजनको अवस्था (रु हजारमा)

बार्षिक विनियोजन: चालु: १ अर्ब १७ करोड ८९ लाख
पूँजिगत: ६८ करोड ९७ लाख हजार
कुल: १ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख


क्र.सं.	कार्यालयको नाम	द्वितीय त्रैमासिक विनियोजित बजेट			अर्धबार्षिक विनियोजित बजेट		
		चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	६९२५३.००	१४७४५.००	८३९९८.००	८८०९९.००	१५३४५.००	१०३४४४.००
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	४९१९७.००	०.००	४९१९७.००	५७४५४.००	१६००.००	५९०५४.००
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	७६३४२.००	०.००	७६३४२.००	८९५७६.००	१७०५.००	९१२८१.००
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	५१७१५.००	३००.००	५२०१५.००	६३६३१.००	२२३०.००	६५८६१.००
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	३१८८५.००	१८२०.००	३३७०५.००	४०५४९.००	१८२०.००	४२३६९.००
	जम्मा	२७८३९२.००	१६८६५.००	२९५२५७.०० बार्षिकको तुलनामा (१५.८%)	३३९३०९.००	२२७००.००	३६२००९.०० बार्षिकको तुलनामा (१९.४%)

श्रोतगत, निकायगत एवं संभाग अनुसार बजेटको अवस्था


कूल बजेट, रु लाखमा

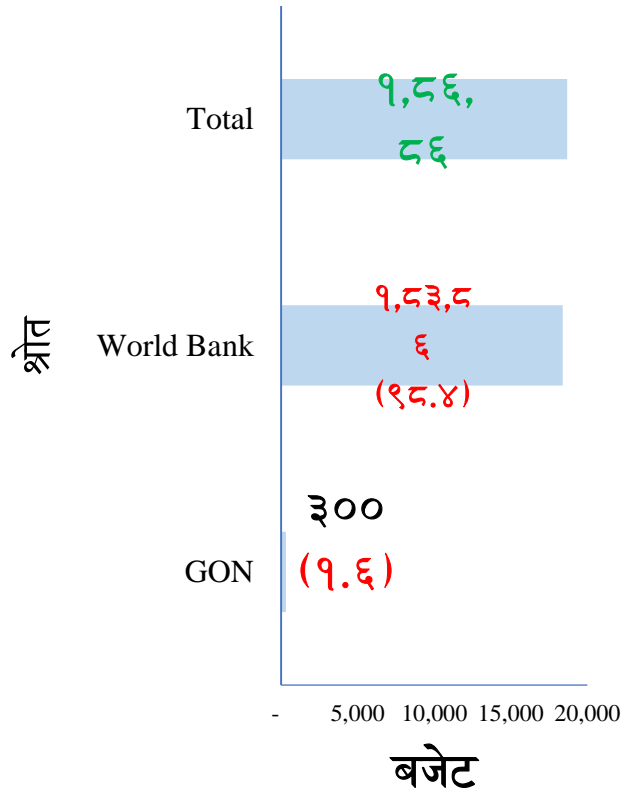

कार्यालय अनुसार बजेट विनियोजन

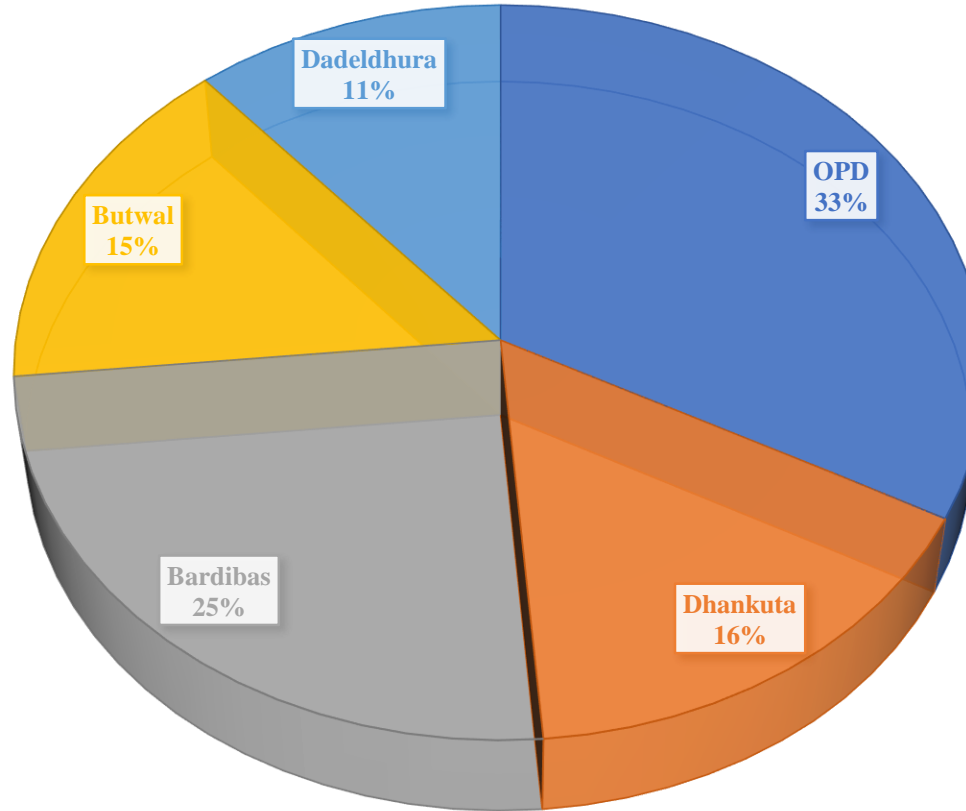

सम्भाग अनुसार बजेट विनियोजन

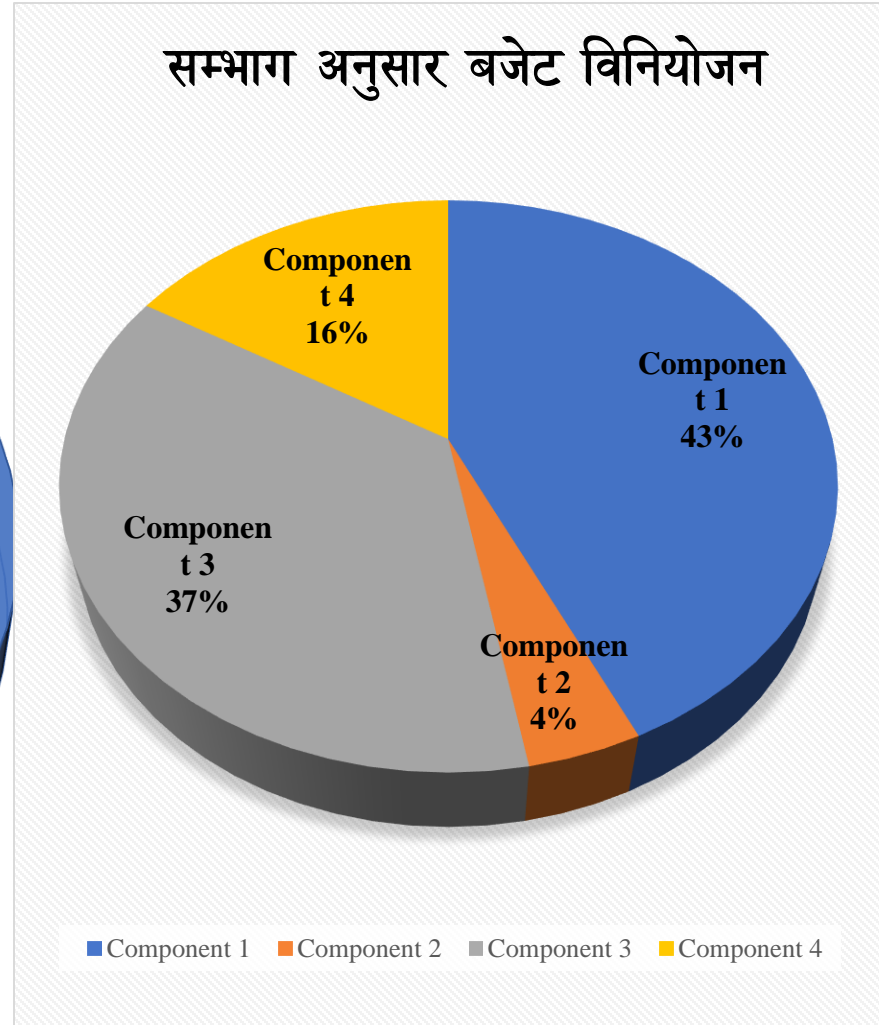

आ.व.२०७९/८० को दोश्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजना को नाम	दोश्रो त्रैमासिक		अर्धवार्षिक	
		विनियोजित बजेट	भारित प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट	भारित प्रगति प्रतिशत
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	८३९९८.००	२७.५७	१०३४४४.००	३४.७
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	४९१९७.००	११.२५	५९०५४.००	२१.१३
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	७६३४२.००	१४.८३	९१२८१.००	१६.२६
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	५२०१५.००	१४.६१	६५८६१.००	२४.८२
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	३३७०५.००	१२.८२	४२३६९.००	२४.९८
	जम्मा	२९५२५७.०		३६२००९.०	
	एकमुष्ट भारित प्रगति प्रतिशत:		१७.६		२४.९

आ.व.२०७९/८० को दोश्रो त्रैमासिक निकास/खर्च विवरण

कार्यालयको नाम	त्रैमासिक विनियोजित बजेट	त्रैमासिक पूँजगत		त्रैमासिक चालु		कुल	त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट	निकास/ खर्च	निकास/ खर्च	
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	८३९९८.००	१४७४५.००	५४५.८०	६९२५३.००	७३०९.६९	७८५५.४९	९.३५
आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	४९१९७.००	०.००	१०९.५०	४९१९७.००	३३७८.००	३४८७.५०	७.०९
आर्थिक करिडर कार्यालय, महोत्तरी	७६३४२.००	०.००	०.००	७६३४२.००	५२१३.५२	५२१३.५२	६.८३
आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	५२०१५.००	३००.००	०.००	५१७१५.००	२३६९.००	२३६९.००	४.५५
आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	३३७०५.००	१८२०.००	०.००	३१८८५.००	३९९५.६१	३९९५.६१	११.८५
जम्मा	२९५२५७.०	१६८६५.००	६५५.३०	२७८३९२.००	२२२६५.८२	२२९२१.१२	७.७६

आ.व.२०७९/८० को अर्धवार्षिक निकास/खर्च विवरण

कार्यालयको नाम	अर्धवार्षिक विनियोजित बजेट		पूँजिगत		चालु		कुल	अर्धवार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट	निकास/ खर्च	निकास/ खर्च		
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१०३४४४.००	१५३४५.००	५४५.८०	८८०९९.००	१३७८८.४६	१४३३४.२६	१३.८६	
आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	५९०५४.००	१६००.००	१५९७.३३	५७४५४.००	९३९३.४०	१०९९०.७३	१८.६१	
आर्थिक करिडर कार्यालय, महोत्तरी	९१२८१.००	१७०५.००	०.००	८९५७६.००	१०६२२.४७	१०६२२.४७	११.६४	
आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	६५८६१.००	२२३०.००	०.००	६३६३१.००	६६३६.९०	६६३६.९०	१०.०८	
आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	४२३६९.००	१८२०.००	०.००	४०५४९.००	८१२५.८१	८१२५.८१	१९.१८	
जम्मा	३६२००९.०	२२७००.००	२१४३.१३	३३९३०९.००	४८५६७.०४	५०७१०.१७	१४.०१	

सम्पन्न मुख्य मुख्य कृयाकलापहरु

प्राविधिक सहायता फर्म छनौट: आयोजनाको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनका लागि परामर्शदाता संस्थाका रूपमा Joint venture of Environment and Resource Management Consultant (ERMC), CMS Engineering Consultant Private Ltd र Fulbright Consultancy Private Ltd. छनौट भएको ।

Start up Grant Operating Manual तयारी: आयोजनाको संभाग १ अन्तर्गत आयोजनाबाट कृषक समुह/सहकारीहरुलाई प्रवाह हुने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि Start up Grant Operating Manual को ड्राफ्ट तयार भएको । उक्त ड्राफ्ट दातृ निकाय विश्व बैंक बाट सहमती प्राप्त भई आयोजना निर्देशक समितिबाट अनुमोदन पश्चात स्विकृतीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश भएको ।

यसै संभाग अन्तर्गत आयोजनाको **Communication Strategy** तयार भएको र सोही अनुसार **Communication materials** तयार भई प्रकासनको क्रममा रहेका ।

उद्यमशिल बातावरण निर्माणका लागि मध्यस्थकर्ता संस्था छनौट: आयोजनाको संभाग २ ख अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यमीहरुको लागि Business Incubation सन्चालनका लागि परामर्शदाता संस्था छनौटको कार्य पुरा भई यस संभाग अन्तर्गत १०० जना नव उद्यमीहरुलाई Business Coaching समेत सम्पन्न भएको छ । यशपश्चात **२५ जनालाई Intensive Incubation support** प्रदान गर्नका लागि उद्यमीहरु shortlisting को कार्य सम्पन्न भएको ।

आयोजनाबाट निर्माण गरिने एकिकृत **कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र (४०)** तथा प्रादेशिक बजार (२) को DPR को ड्राफ्ट प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएको

Status of Human resources (OPD)

S.N	Position	Approved	Fulfilled	vacant	Service type
1	Technical				
	Gaz I	1	1	0	Permanent
	Gaz II	3	3	0	
	Gaz III	4	3	1 (Ag eng)	
	Non Gaz I	1	0	1	
	Non Gaz II	2	2	0	Contract
2	Non Technical				
	Gaz III (Finance)	1	1	0	Permanent
	Non Gaz I	2	2	0	
	Computer Operator	3	3	0	contract
	Driver	4	4	0	
	Office Assistant	4	4	0	
Total		25	23	2	


Status of Human resources (ECO)

S.N	Position	Approved	Dhankuta		Bardibas		Butwal		Dadeldhura		Service Type
			Fulfilled	Vacant	Fulfilled	Vacant	Fulfilled	Vacant	Fulfilled	Vacant	
1	Technical										
	Gaz II	1	1	0	1	0	1	0	1	0	Permanent
	Gaz III	3	2	1	3	0	3	0	2	1	
	Non Gaz II	10	10	0	10	0	10	0	10	0	Permanent Contract
2	Non Technical										
	Non Gaz I/II	2	2	0	2	0	2	0	2	0	Permanent
	Computer Operator	1	1	0	1	0	1	0	1	0	Contract
	Driver	2	2	0	2	0	2	0	2	0	Contract
	Office Assistant	2/3	3	0	2	0	3	0	2	0	Contract
Total		21/22	21	1	21	0	22	0	20	1	

सोधभर्नाको अवस्था

आयोजनाको नाम	ऋण र अनुदान संकेत नं	दातृ संस्था	सम्झौतामा व्यवस्था भएको कुल रकम (अमेरिकी डलर)	नेपाली रुपैयाँमा		
				गत आ व सम्मको प्राप्त सोधभर्ना	चालु आ वको हालसम्मको अवधिमा प्राप्त सोधभर्ना रकम रु	कुल जम्मा सोधभर्ना रु
२	३	४	५	६	७	८
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना	IDA Credit Number IDA 67870-NP	IDA	८०,०००,०००.०	२१०,११८,८३१.०१	२४,०३८,८०९.६५	२३,४१,५७,६४०.७ (२३ करोड ४१ लाख ५७ हजार ६४० रुपैया) (\$ 1.998443) 2.49%

Status of Disbursement in Nrs. ('000)

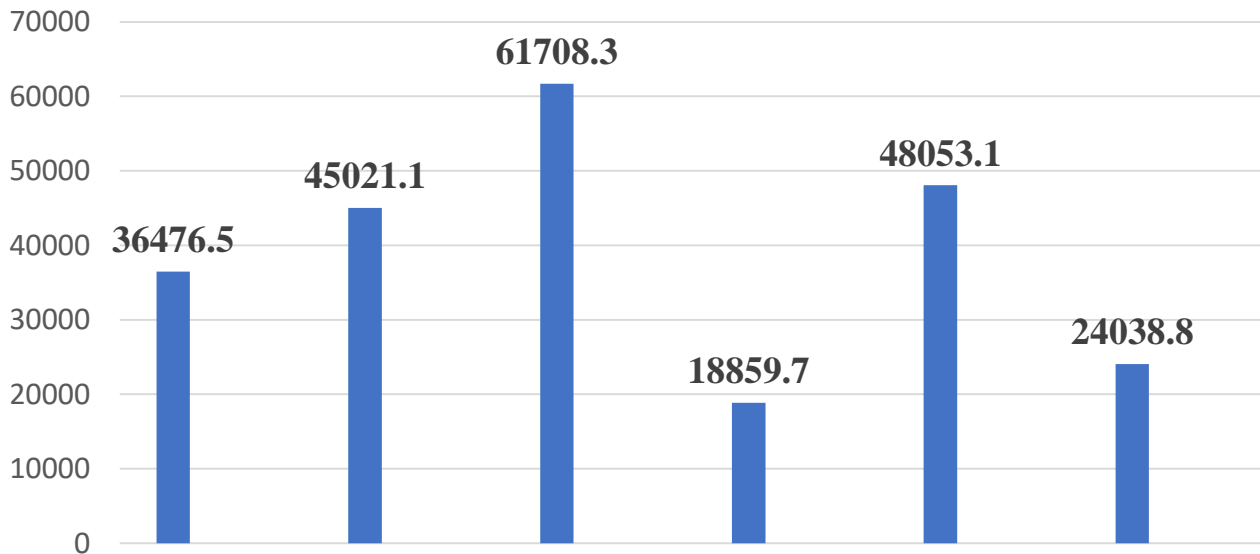

Date of Request	Disbursed Amount NRs
5-Sep-21	३६४७६५०१.१
5-Jan-22	४५०२११६२.३६
19-May-22	६१७०८३२८.३९
22-Jun-22	१८८५९७०१.९६
6-Nov-22	४८०५३१३७.२
13-Jan-23	२४०३८८०९.६५
जम्मा	२३,४१,५७,६४०.७
कुल शोधभर्ना रकम रु: २३ करोड ४१ लाख ५७ हजार ६४० रुपैया	

कुल खर्च रकम रु: २८ करोड ५९ लाख ८२ हजार

बेरुजुको विवरण

बेरुजुको विवरण रकम रु हजारमा

क्र	कार्यालयको नाम	फछ्रौँट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम	फछ्रौँट भएको बेरुजु	फछ्रौँट प्रतिशत	
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय हरिहरभवन	०	०	०	
२	आर्थिक करिडोर कार्यालय, धनकुटा	०	०	०	
३	आर्थिक करिडोर कार्यालय, बर्दिवास	०	०	०	
४	आर्थिक करिडोर कार्यालय, बुटवल	१५३२१०	०	०	
५	आर्थिक करिडोर कार्यालय, डडेल्धुरा	२१९२९८.००	०	०	
	जम्मा	३,७२,५०८/-	०	०	

प्रगति नपुगको कारणहरु

क्र स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रगति नपुग हुनुका कारणहरु
१	पालिकास्तर कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको DPR निर्माण	DPR तयारीका लागि परामर्शदाता संस्थासंग सम्झौता सम्पन्न भई ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तर किस्ता भुक्तानी भैनसकेको
२.	प्रादेशिक बजारको DPR निर्माण	DPR तयारीका लागि परामर्शदाता संस्थासंग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य सन्चालन भैरहेको तर किस्ता भुक्तानी भैनसकेको
३	communication campaign संचालन सम्बन्धि प्रचार प्रसार सामाग्री तयारी तथा प्रकाशन प्रसारण	आयोजनाको communication strategy हालसालै तयार भएको र सो अनुसारका प्रचार सामाग्रीहरु तयार भई प्रकाशनको क्रममा रहेको
४.	CNA प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसार क्षमता विकास तालिम सन्चालन	प्रतिवेदन अनुसार तालिम कार्यक्रमहरु छनौट गरि दातृ निकायको लागि मिति २०७९ भाद्र ९ गते पठाइएकोमा प्राप्त सुझावहरु सार्थै चौथो मिसनमा प्राप्त सुझावहरु समेत समेटी पुन सहमतीका लागि पेश भएकोमा हाल सम्म सहमती प्राप्त हुन नसकेकोले कार्यक्रम सन्चालन गर्न नसकिएको
५.	व्यवसायिक योजना मूल्यांकनकर्ताको पारिश्रमिक	Grant Operating Manual को ड्राफ्ट आयोजना निर्देशक समितिमा छलफल पश्चात प्राप्त सुझावहरु समेटी स्विकृतीका लागि मिति २०७९ मन्त्रालयमा पेश भएको । उक्त दस्तावेजमा स्विकृती पश्चात प्रस्ताव आह्वान गरि प्राप्त व्यवसायिक योजनाहरु मूल्यांकन गरिने

आयोजनाका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सहजिकरण हुनुपर्ने विषयहरू

मन्त्रालयको तर्फबाट

१. आयोजनाको Start up grant manual स्विकृतीका लागि आवश्यक सहजिकरण
२. आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरूमा रहेका रिक्त दरबन्दीहरूको पदपूर्ति

दातृ निकाय विश्व बैंकको तर्फबाट

१. संभाग २ क अन्तर्गतका क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सन्चालनका लागि सहमती
२. निर्माणका लागि तयार भएका DPR हरूमा सहमती

मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक



Proposed MALSC Sites and Field visits by E and S safeguards team



Palungtar Municipality-4,
Gorkha



Rajapur Municipality-4,
Rautahat



Golanjor RM-3, Sindhuli



Patan Municipality-6, Baitadi



Madhyanepal Municipality-6,
Lamjung



Khandadevi RM-6,
Ramechhap



Annapurna RM-2, Kaski



Diktel Rupakot Majhuwagadi
Mun-1, Khotang

Proposed RMC Sites and Field Activities....



Duhabi Municipality, Sunsari

Proposed RMC Sites and Field Activities....



Bardibas Municipality, Mahottari

Joint monitoring with WB team



Province 1



Joint monitoring with WB team



Madhesh
Province



Fourth implementation and support review mission(ISRM) November 7-11, 2022



Monitoring and review meetings with intermediary Institution(OPD Hariharbhawan and Kaski



Monitoring and review meetings with consulting firms(DPR preparation)



17-12-2023

Field visits



ECTCC र LCC बैठक बुटवल करिडोर



Second trimester and half-annual review workshop





कार्तिक ४, २०७८ | कान्तिपुर संवाददाता
पर्सा — कृषि कर्मलाई ग्रामीण उद्यम
गर्न, कृषिउपज बजारीकरणको सुनिश्चि
कृषि उपजसँगको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्
सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।

आर्थिक करिडोर कार्यालय
बर्दिवास, महोत्तरी
RURAL ENTERPRISE AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT (REED)
ECONOMIC CORRIDOR OFFICE
Bardibas, Mahottari

६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागु, होला त सफल ? || Palika Khabar

६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागु, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व....

Narayani News
FM 103.8 MHz
BIRGUNJ

साझ छ बजेको नारायणी समाचार

About us : Road Birgunj, Parsa, Nepal,

FLASH NEWS 055 19273058

उपकरणहरु पनि विग्रदै प्रदेश-२ मा व्यावसायिक

आर्थिक विकास आयोजना संचालनमा

६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागु, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व....

A photograph showing a group of people in a meeting or discussion. One person is speaking into a microphone while others listen.

धन्यवाद
