



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना निर्देशकको कार्यालय  
हरिहरभवन, ललितपुर



RURAL ENTERPRISE AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT (REED)

Office of the Project Director

Hariharbhawan, Lalitpur

तृतीय त्रैमासिक तथा नौ महिनाको प्रगति समिक्षा  
गोष्ठी २०७९/८०

स्वागतम्

मिति: २०८०/०९/२०

स्थान: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार

# प्रस्तुतीको खाका

१. आयोजनाको संक्षिप्त परिचय
२. चालु आ.व २०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिक तथा नौ महिनाको प्रगति
३. आयोजनाको दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था
४. आयोजनाको सोधभर्ना अवस्था
५. सम्पन्न मुख्य मुख्य कृयाकलापहरु
६. प्रगति कम हुनुका कारणहरु
७. बेरुजु बिवरण
८. आयोजना कार्यान्वयनका समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु
९. कार्यक्रम सचालनका केहि झलकहरु

# आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी



# आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

## आयोजना

## ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना सम्झौता मिति

२१ डिसेम्बर २०२० (२०७७ पुष ६)

आयोजना प्रभावकारी भएको मिति

१९ मार्च २०२१ (२०७७ चैत्र ६)

आयोजना समाप्ती मिति

१५ जुलाई २०२५ (२०८२ आषाढ ३१)

आयोजना अवधि

सन् २०२१ - २०२५ सम्म (५ वर्ष )

आयोजनाको कुल लागत  
(मिलियन अमेरिकी डलर)

१२० (दातृ निकाय: ८०, लाभग्राहीको योगदान: ४०)

दातृ निकाय

विश्व बैंक

आयोजना कार्यान्वयन निकाय

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

आयोजना लागू हुने प्रदेश संख्या

६ (कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम)

आयोजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक कोरिडोर

५ (मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ-रोल्पा राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग)

आयोजना लागू हुने पालिका संख्या

१७१

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय संख्या/रहने स्थान

४ (पाखिबास, बर्दिबास, बुटवल, डडेल्धुरा)

# आयोजनाको कार्यक्षेत्र



आर्थिक कोरिडोर	प्रदेश	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय
मध्य पहाडी लोकमार्ग	कोशी प्रदेश	७	२२	पाखिबास
	बागमती	६	१८	
मध्य पहाडी लोकमार्ग	गण्डकी	५	२१	बुटवल
भालुवाङ-रोल्पा लोकमार्ग	लुम्बिनी	४	९	
हुलाकी राजमार्ग	मधेश प्रदेश	८	८४	बर्दिबास
पूर्व पश्चिम राजमार्ग				
महाकाली राजमार्ग	सुदूरपश्चिम	५	१७	डडेल्धुरा
जम्मा		३५	१७१	

१४०

उत्पादन साझेदारी



५७००

अल्पकालिन ग्रामिण रोजगारी- कोभिड १९  
प्रतिकार्य

१००

साना तथा मझौला उद्यम

आयोजनाको अपेक्षित  
उपलब्धि

कृषक पालिकास्तर कृषि तथा पशुपन्छी  
सेवा केन्द्र, बजार तथा मूल्यऋखला  
पूर्वाधारबाट ३५०० कृषक  
लाभान्वित ।

२४००००

साना उत्पादक कृषक तथा ग्रामिण  
उत्पादकहरु

३५%

महिला लाभग्राही

८६


सरकारी निकाय  
६- प्रादेशिक तथा ८० स्थानिय तह

आयोजनाको तेश्रो त्रैमासिक तथा  
नौ महिनाको प्रगति विवरण




# श्रोतगत, निकायगत एवं संभाग अनुसार बजेटको अवस्था


कूल बजेट, रु लाखमा

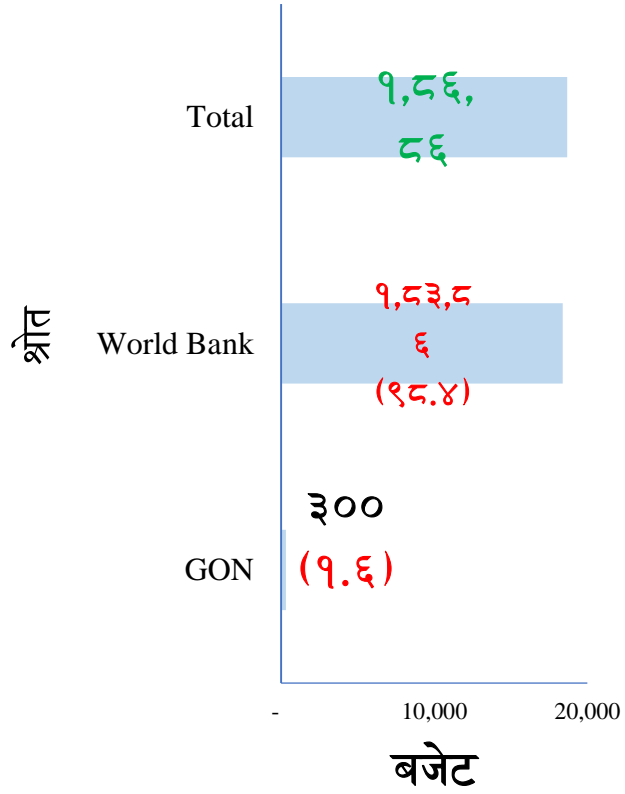

कार्यालय अनुसार बजेट विनियोजन

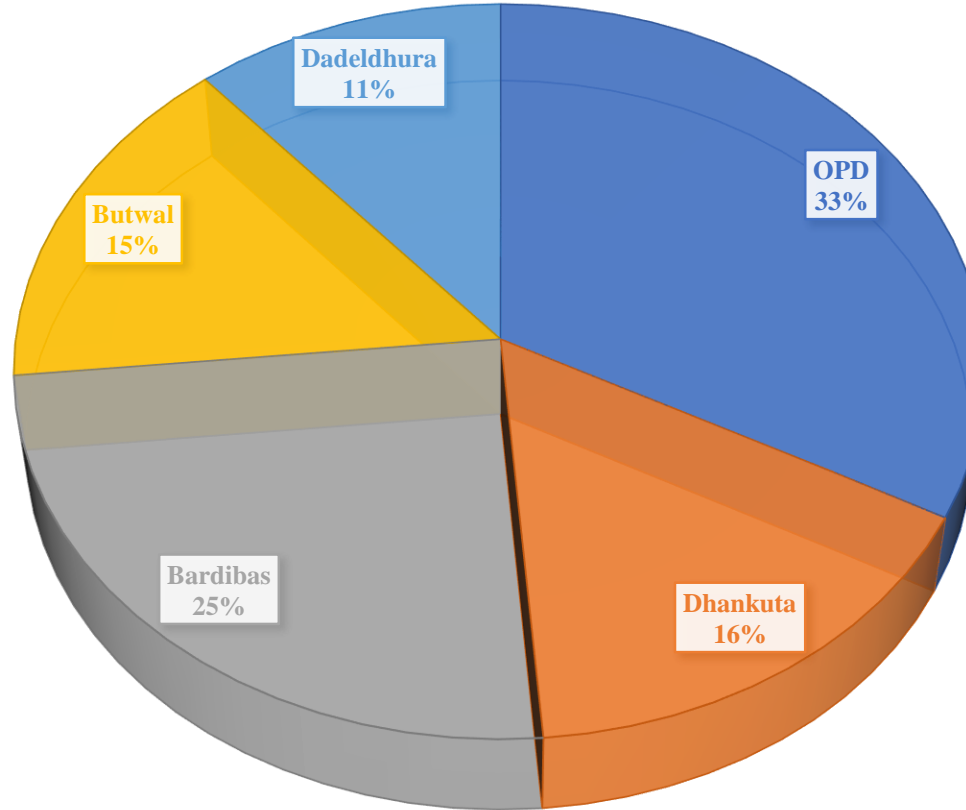

सम्भाग अनुसार बजेट विनियोजन

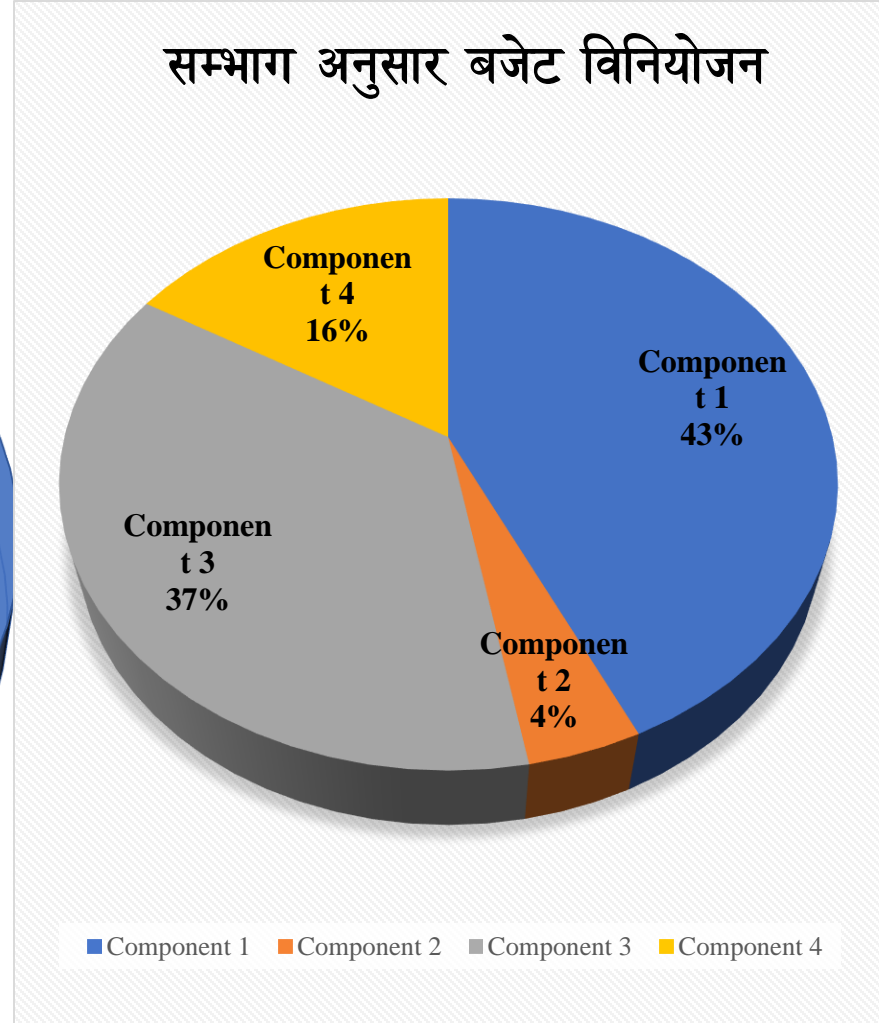



# बजेट विनियोजनको अवस्था (रु हजारमा)

बार्षिक विनियोजन: चालु: १ अर्ब १७ करोड ८९ लाख  
पूँजिगत: ६८ करोड ९७ लाख हजार  
कुल: १ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	तृतीय त्रैमासिक विनियोजित बजेट			नौ महिनाको विनियोजित बजेट		
		चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२६६२४६.००	७५८००.००	३४२०४६.००	३५४३४५.००	९११४५.००	४४५४९०.००
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	४४१२२.००	७००००.००	११४१२२.००	१०१५७६.००	७१६००.००	१७३१७६.००
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	६८६०६.००	१०२०००.००	१७०६०६.००	१५८१८२.००	१०३७०५.००	२६१८८७.००
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	४६४५५.००	५७५२०.००	१०३९७५.००	११००८६.००	५९७५०.००	१६९८३६.००
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	३१०४४.००	५२५००.००	८३५४४.००	७१५९३.००	५४३२०.००	१२५९१३.००
	जम्मा	४५६४७३.०	३५७८२०.०	८१४२९३.०	७९५७८२.००	३८०५२०.००	११७६३०२.००

# आ.व.२०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिक तथा नौ महिनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजना को नाम	तेश्रो त्रैमासिक		नौ महिनाको	
		विनियोजित बजेट	भारित प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट	भारित प्रगति प्रतिशत
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	३४२०४६.००	१५.६४	४४५४९०.००	२३.३८
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	११४१२२.००	९.१२	१७३१७६.००	१२.१२
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	१७०६०६.००	७.४८	२६१८८७.००	९.४८
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	१०३९७५.००	६.०३	१६९८३६.००	११.२८
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	८३५४४.००	५.९२	१२५९१३.००	१०.२८
	जम्मा	८१४२९३.०		११७६३०२.००	
	एकमुष्ट भारित प्रगति प्रतिशत:	१०.८		१५.५	

# आ.व.२०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिक निकास/खर्च विवरण

कार्यालयको नाम	त्रैमासिक विनियोजित बजेट		त्रैमासिक पूँजगत		त्रैमासिक चालु		कुल	त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट	निकास/ खर्च	निकास/ खर्च		
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	३४२०४६.००	७५८००.००	०.००	२६६२४६.००	३२९४०.६९	३२९४०.६९	९.६३	
आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	११४१२२.००	७००००.००	०.००	४४१२२.००	६५३०.००	६५३०.००	५.७२	
आर्थिक करिडर कार्यालय, महोत्तरी	१७०६०६.००	१०२०००.००	१६६८.५९	६८६०६.००	११०८७.२४	१२७५५.८३	७.४८	
आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	१०३९७५.००	५७५२०.००	०.००	४६४५५.००	८८१५.००	८८१५.००	८.४८	
आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	८३५४४.००	५२५००.००	०.००	३१०४४.००	४४९०.४१	४४९०.४१	५.४१	
जम्मा	८१४२९३.०	३५७८२०.००	१६६८.५९	४५६४७३.००	६३८६३.३४	६५५३१.९३	८.०५	

# आ.व.२०७९/८० को नौ महिनाको निकास/खर्च विवरण

कार्यालयको नाम	नौ महिनाको विनियोजित बजेट		पूँजिगत		चालु		कुल	नौ महिनाको विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट	निकास/ खर्च	निकास/ खर्च		
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	४४५४९०.००	९९९४५.००	५४५.८०	३५४३४५.००	४६७९९.७०	४७२५७.५०	९०.६९	
आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	९७३९७६.००	७९६००.००	९५९७.३३	९०९५७६.००	९५९२३.४०	९७५२०.७३	९०.९२	
आर्थिक करिडर कार्यालय, महोत्तरी	२६९८८७.००	९०३७०५.००	९६६८.५९	९५८९८२.००	२९७०९.७९	२३३७८.३०	८.९३	
आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	९६९८३६.००	५९७५०.००	०.००	९९००८६.००	९५४५९.९०	९५४५९.९०	९.९०	
आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	९२५९९३.००	५४३२०.००	०.००	७९५९३.००	९२६९६.२२	९२६९६.२२	९०.०२	
जम्मा	९९७६३०२.००	३८०५२०.००	३८९९.७२	७९५७८२.००	९९२४९२.९३	९९६२२४.६५	९.८८	

# तेस्रो चैमासिक अवधिमा सम्पन्न मुख्य मुख्य कृयाकलापहरू

- ❖ आयोजनाबाट प्रवाह हुने अनुदानलाई व्यवस्थित एवं पार्दर्शिताका लागि तयार भएको Grant Operating Manual माननीय मन्त्रीस्तर मिति २०७९/११/०८ को निर्णयानुसार स्विकृत भएको र अनुदानका लागि सूचना प्रकासन भएको
- ❖ विभिन्न कोरिडोर कार्यालयको पालिकास्तरमा निर्माण हुने एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रहरू ३० वटाको DPR स्विकृत भइ निर्माणका लागि सूचना आव्हान भएक

आयोजनाको संभाग २क अन्तर्गत Intermediary Institutions छनौट भइ Business Incubation का लागि साना तथा उद्यमीहरू छनौट भएको ।


२ वटा प्रादेशिक बजारको DPR को प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।

आयोजनाको Communication Strategy तयार भई प्रशारण सामग्रीहरू तयार भएको ।

आयोजनाको प्राविधिक सहायता फर्मसंग सम्झौता सम्पन्न भएको ।

संभाग अनुसार सम्पन्न मुख्य कृयाकलापहरु र प्रगति अवस्था

# संभाग १ उत्पादनमूलक साझेदारी मार्फत बजार सम्बद्धता सुदृढीकरण गर्ने

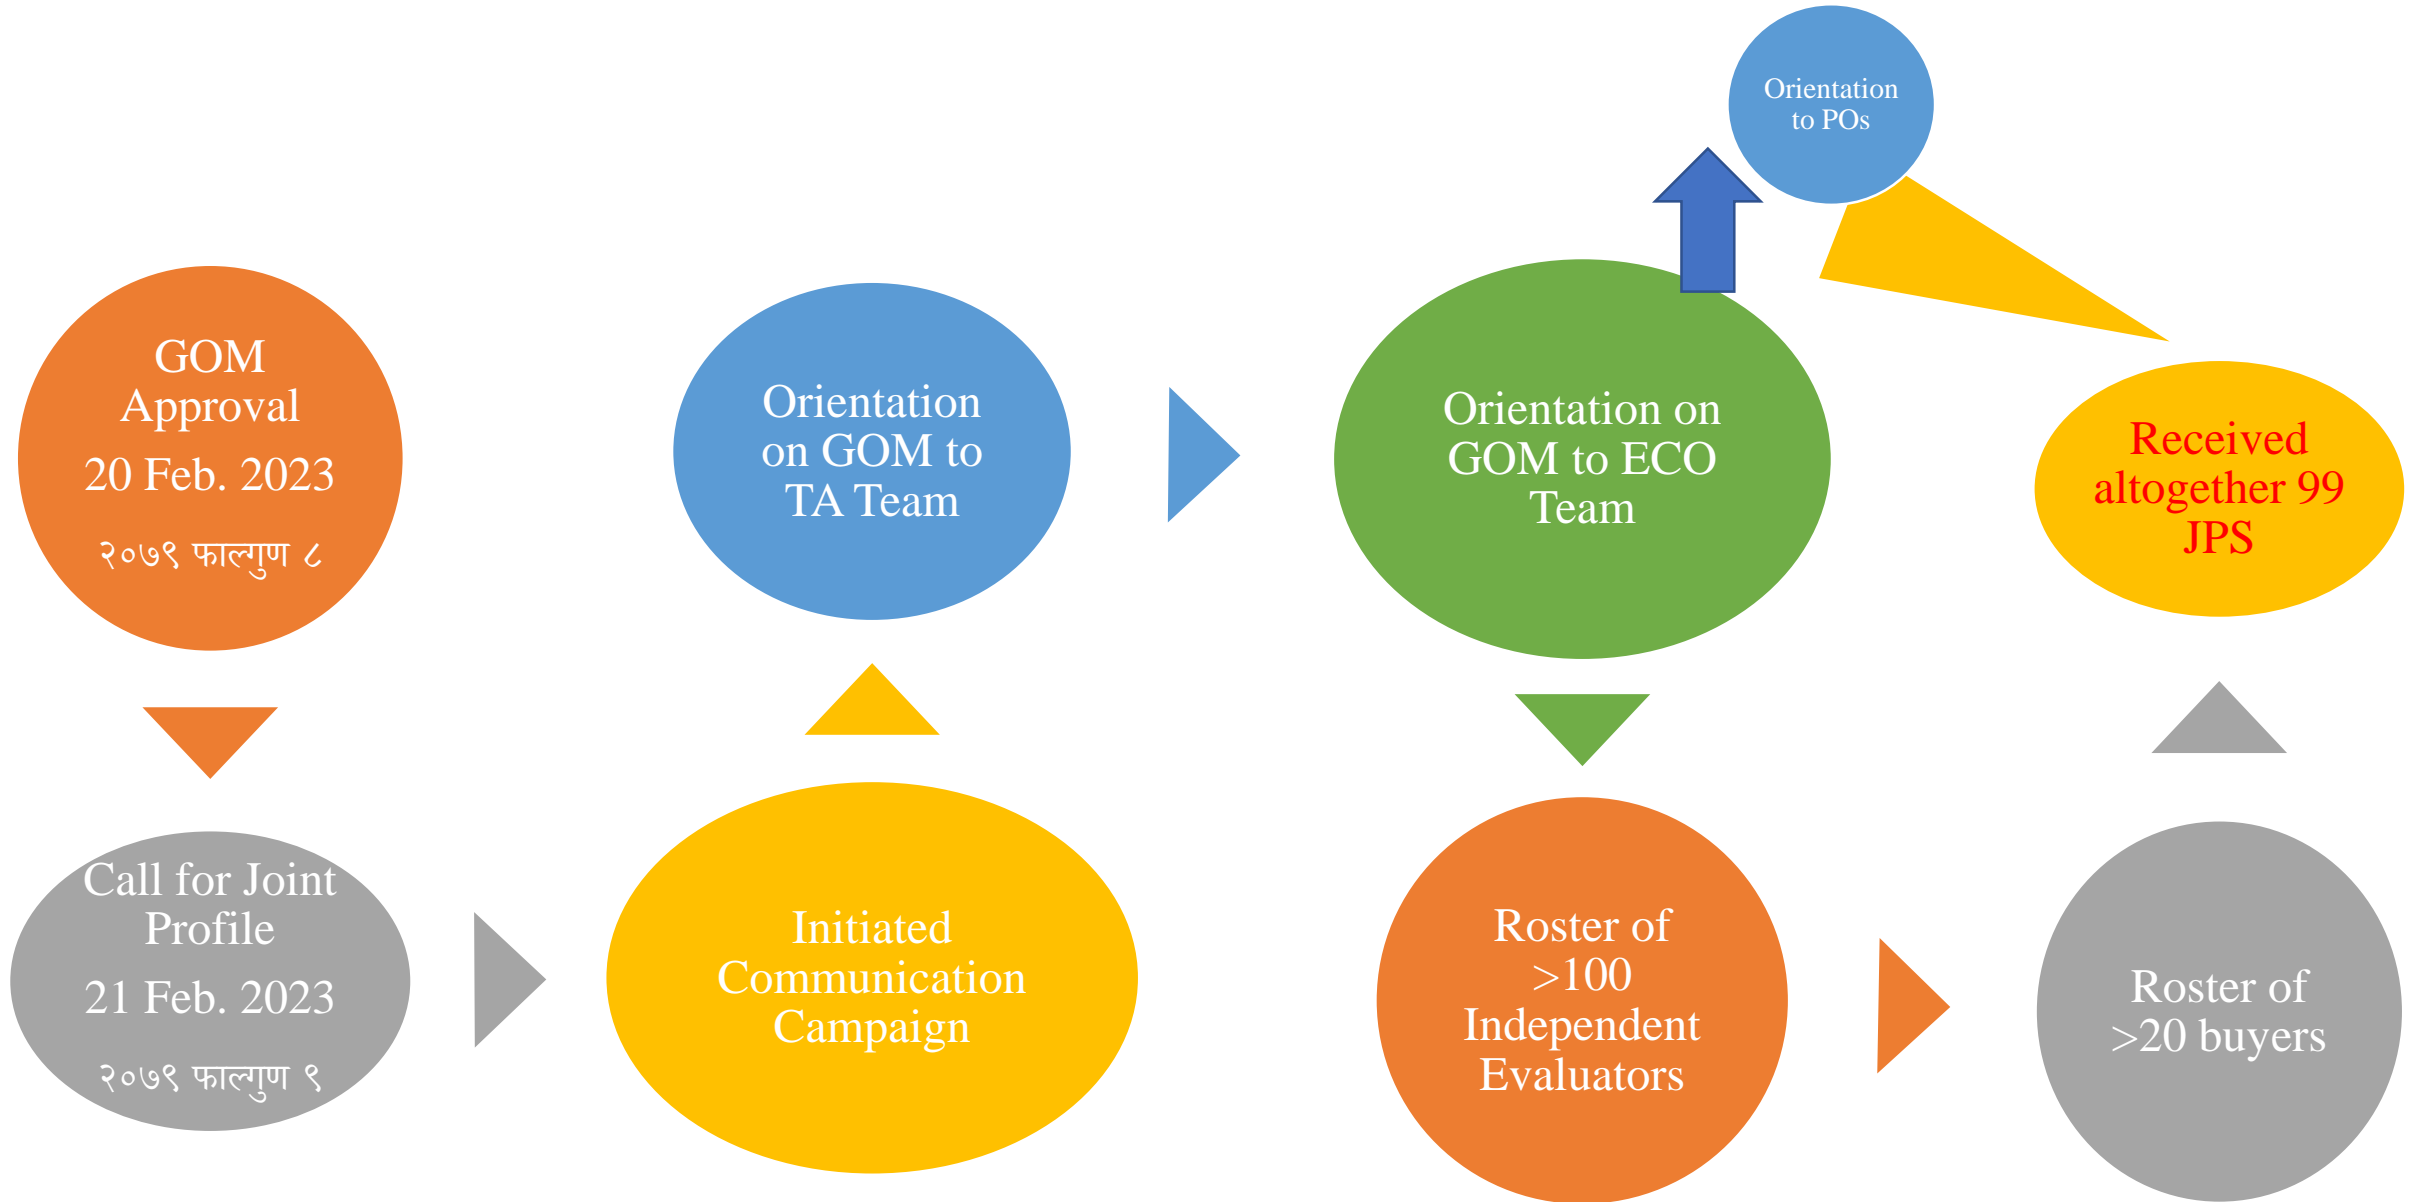

## Details of Joint Profile Progress Status

ECO	No. of JPs	Coverage		Commodity	No. of JPs
		District	Municipalities		
Dhankuta	5	2	2	Livestock (Buffalo, Cow, Goat & Swine)	2
Bardibas	87	7	30	Fruits and Vegetables	20
				Livestock (Buffalo, Cow, Goat & Swine)	40
				Fish farming	15
				Seed production	12
Butwal	4	2	2	Fruits and Vegetables	2
				Livestock (Buffalo, Cow, Goat & Swine)	2
Dadeldhura	4	2	2	Fruits and Vegetables	4
<b>Total</b>	<b>९९</b>	<b>13</b>	<b>36</b>		<b>९९</b>



# Progress on Supporting Activities Contd...

Activity

Joint profile evaluation  
and selection

Progress

99 JPs received

Field verification ongoing

JP evaluation and  
selection process will be  
started immediately after  
field visit (need to address  
some issues)

# संभाग २ अन्तर्गत संघीय संरचनामा उद्यमशील वातावरण निर्माण

## संभाग २क प्रदेश र स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास

Theme/title		Target	Duration	Progress
<b>Service Delivery</b>				
1	Understanding role of agriculture/livestock extension service delivery within the context of federalism (provincial and local levels) and alternatives for service provision	10	6 days	2
2	Training of Trainer (TOT) on participatory planning, monitoring and reporting with the purpose of bridging the gap between service demand and supply.	10	5 days	2
<b>Resource planning</b>				
3	Training on Agricultural Program planning (activities, budget, indicator development and definition, monitoring arrangement), reporting and feedback.	10	6 days	2
<b>Climate change and mitigation</b>				
4	Program design for adaptation and resilience in the agriculture sector (Climate Smart Agriculture, watershed management, etc.)	10	5 days	2
5	Integrated pest management (safe pesticides, types and time of spray of various chemicals, waiting period etc. based on WHO/GON guidelines for both crops and dairy	10	5 days	3
6	Clean, green and ethical animal/poultry production	10	5 days	2
<b>Fiduciary (finance and procurement)</b>				
7	Understanding of procurement and financial management, the need for compliances.	10	6 days	0
	total	70		13

# Business coaching services

- In total **five batches** of capacity building events were organized,
- a total of 102 agribusiness SMEs and agritech startups participated in these events
- Coaching on importance of business ecosystem and analyse business feasibility and importance of business plan
- Will it fly tool introduced to select 25 growth oriented SMEs for in-depth incubation



Of the total 16.7% women led enterprise



## Progress on component 2B

### Progress on Business coaching



Workshop Date	Total Participants	Female	Male	Janjati	Dalit	BCTN
26- Nov 2022	25	6	19	10	1	14
27- Nov	22	1	21	2	0	20
28- Nov	12	3	9	3	0	9
29- Nov	20	5	15	3	0	17
30- Nov	23	2	21	0	0	23
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>83</b>

## List of SMEs receiving incubation services

SN	SME Name	Value chain	Function
1	Aama Agro Products P. Ltd	Food items	Processing
2	MIMIK Agro P. Ltd	Pork meat	Slautaring and marketing
3	SAFA Meat Industries P. Ltd	Chicken	Slautaring and marketing
4	Sarvaguna Kitchen P. Ltd.	Food items	Food processing and catering
5	KHETI Venture P. Ltd	Food items	Platform service provider
6	Poshilo Food Products P. Ltd*	Satu	Food processing
7	Gandaki Rainbow Trout Fish Farm	Fish	Processing/Kitchen
8	Phewa Meat Product Pvt.Ltd.	Meat	Processing
9	Lwang Tea Estate Pvt Ltd	O. Tea	Production and processing
10	Aandhikhola Agro Product	Food	Processing
11	Annapaat Agro Pvt Ltd	Food	Processing
12	Harilo Agro Industries P. Ltd	Dry meat, Achar	Processing
13	Madi Himalyan Krishi Farm, Madi Gaupalika, Kaski	Large Cardamom	Production, processing and marketing
14	Bishal Alaichi Farm, Annapuran Gaupalika, Kaski	Large Cardamom	Production, processing and marketing
15	Mother's Food Products	Food items	Processing
16	Nepal Blue Mountain Organic Coffee	Coffee	Processing
17	Green Bio-Tech Research Center	Mushroom	production, marketing
18	Luv Kush Dairy Udhyog	Milk and Milk products	Processing
19	S & S Dairy Udhyog	Milk and Milk products	Processing
20	Chhetradip Annapurna Trout Fish and Reseach Center	Trout Fish	Production and processing
21	Valley Food Products*	Food items	processing
22	Manakhushi Multipurpose*	Food items	processing
23	Pokhara Meat*	Meat	processing
24	Pokhareli Didibahini*	Food items	processing
25	Shuklagandaki Feed*	Feed	production/processing

## संभाग ३ अन्तर्गत पालिकास्तर कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रहरु र प्रादेशिक बजार निर्माण

क्र.सं.	आयोजना कार्यालयहरु	चालु आ वको लक्ष्य		प्रगति	
		सेवा केन्द्र	प्रादेशिक बजार	सेवा केन्द्र	प्रादेशिक बजार
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	०	४		२ वटाको DPR तयार भएको
२	आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	१०		DPR तयार भएको र निर्माण सूचना प्रकासन	
३	आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	१०		DPR तयार भएको र निर्माण सूचना प्रकासन	
४	आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	१०		DPR तयार भएको र निर्माण सूचना प्रकासन	
५	आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	१०		DPR तयारको क्रममा	

## संभाग ४ आयोजना व्यवस्थापन

आयोजना प्राविधिक सहायता परामर्शदाता संस्थाका रूपमा ERM (P) Ltd., CMS Engineering consult Private Limited, Full Bright Consultancy (Pvt) Ltd छनौट भएको

कुल ७ जना विज्ञहरु आयोजना निर्देशकको कार्यालय र अन्य ६ वटा स्थानहरुमा ३ जनाको दरले जम्मा २५ विज्ञहरु परिचालन भएको

हाल संयुक्त प्रोफाइल तयारीका लागि संचार अभियान सन्चालन, फिल्ड अनुगमन, व्यवसायिक योजना तयारी र खरिदकर्ताहरुको सूची तयारी लगायतका कार्यहरुमा परिचालित गरिएको

### TA Team Composition

Team leader – 1

Value chain specialist –13

Agri finance expert – 1

Engineers-7

SPS Expert -1

Agri Training specialist -1

Communication expert -1


### Individual consultants

Procurement specialist -1


M&E Specialist, Environmental specialist, social safeguard specialist, finance specialist छनौट प्रकृत्यामा रहेको

# दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति अवस्था

## Total

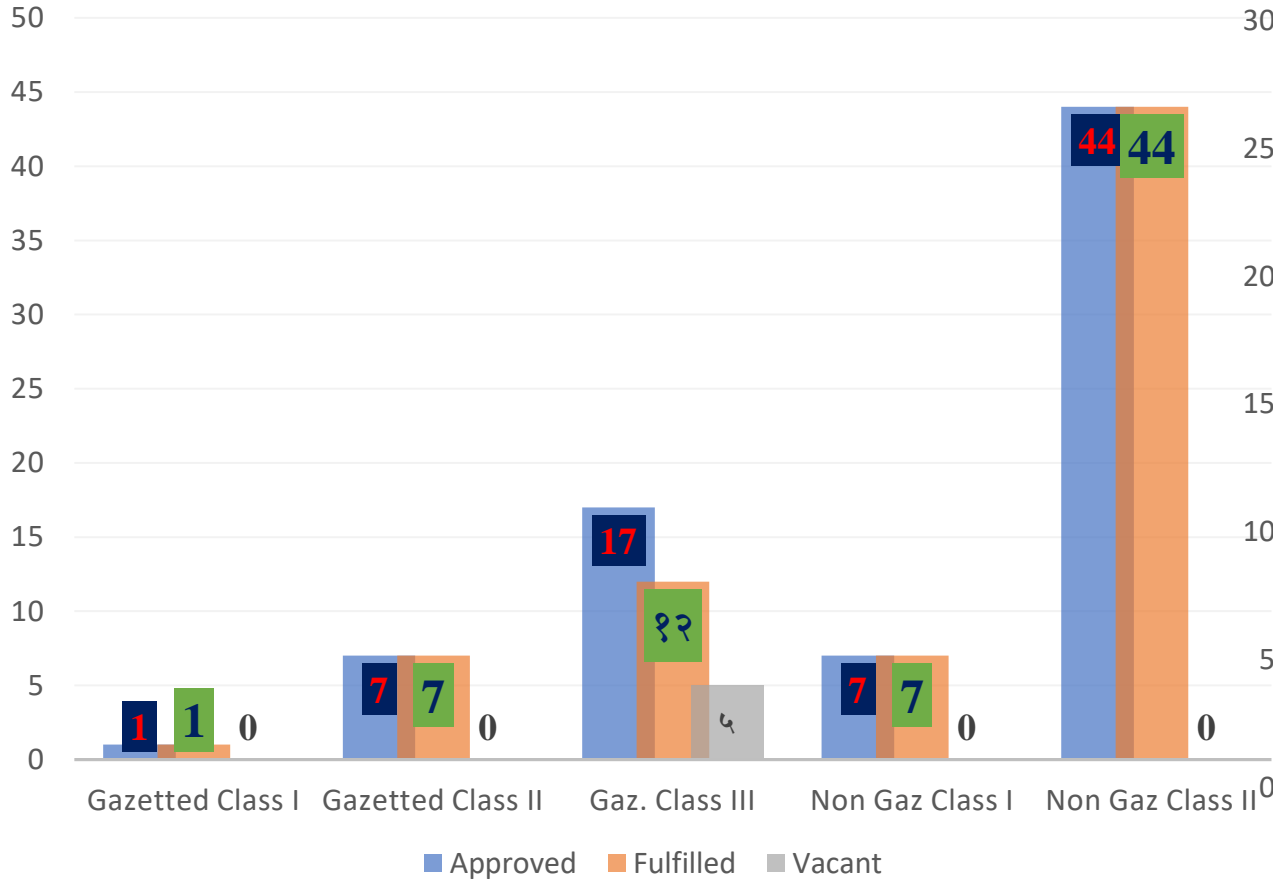

## Officewise

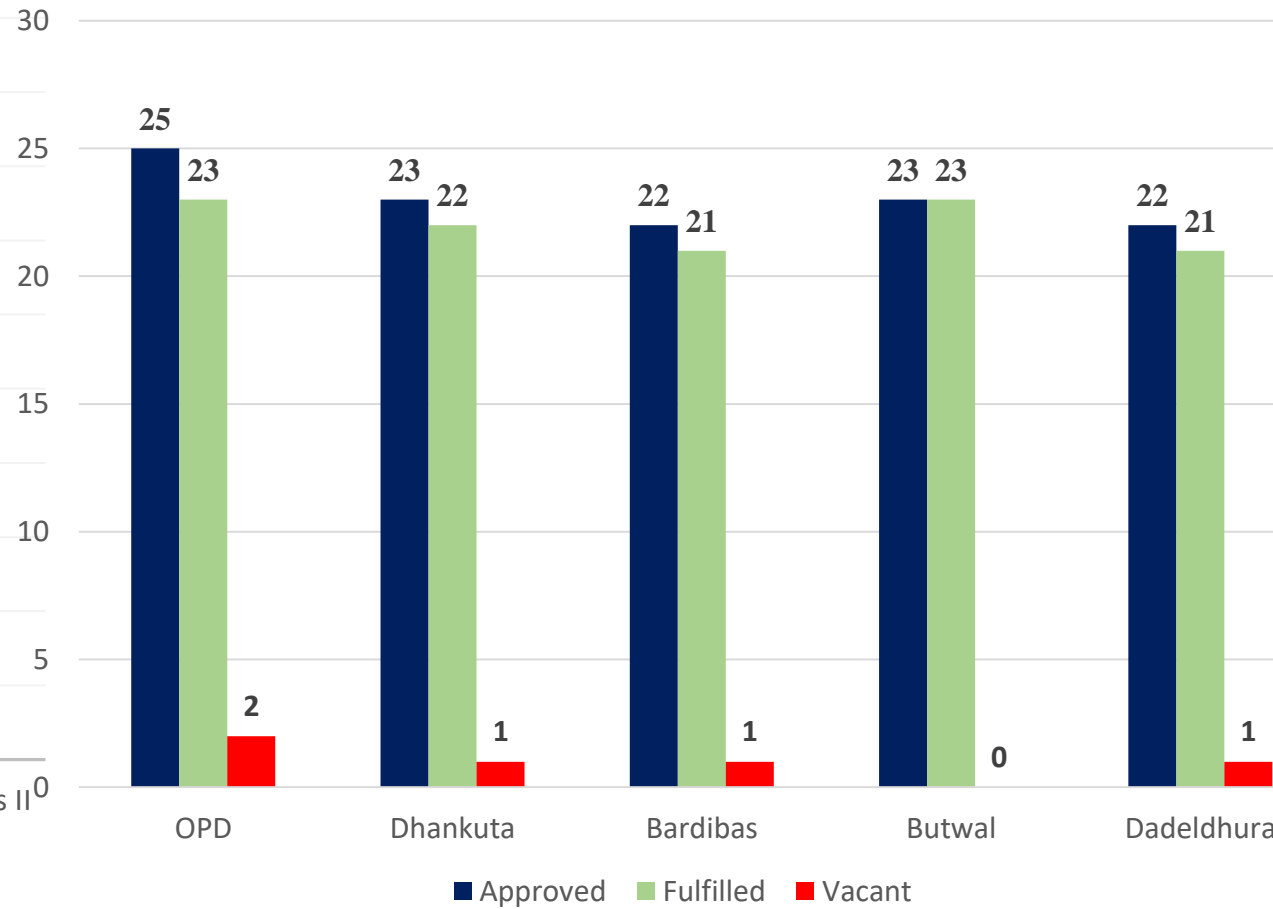




# सोधभर्नाको अवस्था

आयोजनाको नाम	ऋण र अनुदान संकेत नं	दातृ संस्था	सम्झौतामा व्यवस्था भएको कुल रकम (अमेरिकी डलर)	नेपाली रुपैयाँमा		
				गत आ व सम्मको प्राप्त सोधभर्ना	चालु आ वको हालसम्मको अवधिमा प्राप्त सोधभर्ना रकम रु	कुल जम्मा सोधभर्ना रु
२	३	४	५	६	७	८
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना	IDA Credit Number IDA 67870-NP	IDA	६०,०००,०००.०	२१०,११८,८३१.०१	२४,०३८,८०९.६५	२३,४१,५७,६४०.७ (२३ करोड ४१ लाख ५७ हजार ६४० रुपैया) <b>(1.99 Million USD)</b> <b>2.49%</b>

Status of Disbursement in Nrs. ('000)

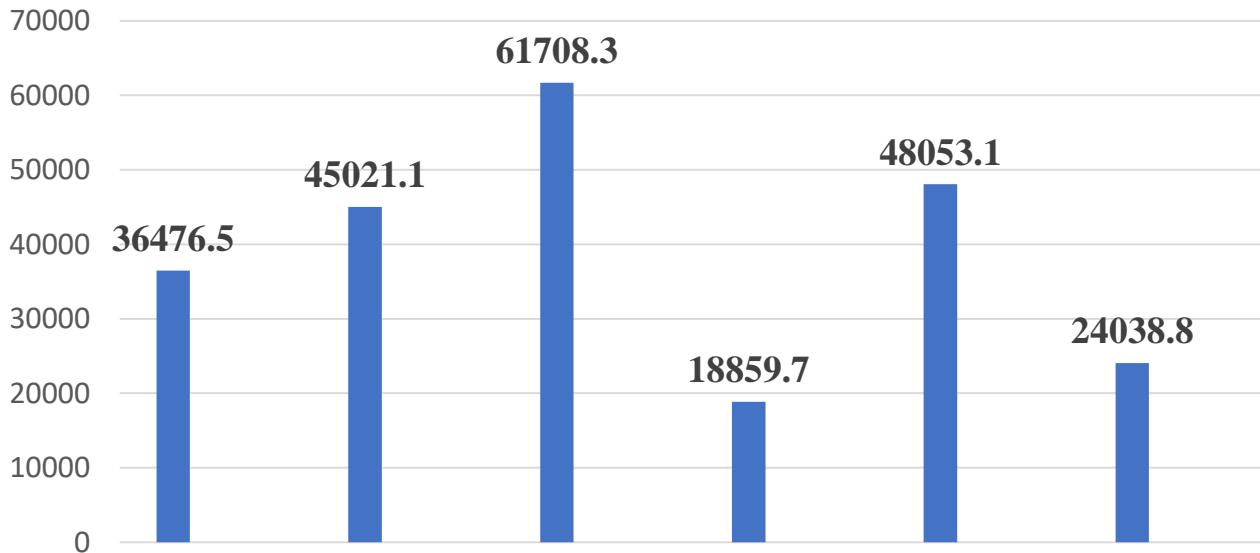


Date of Request	Disbursed Amount NRs
5-Sep-21	३६४७६५०१.१
5-Jan-22	४५०२११६२.३६
19-May-22	६१७०८३२८.३९
22-Jun-22	१८८५९७०१.९६
6-Nov-22	४८०५३९३७.२
13-Jan-23	२४०३८८०९.६५
<b>जम्मा</b>	<b>२३,४१,५७,६४०.७</b>
<b>कुल शोधभर्ना रकम रु: २३ करोड ४१ लाख ५७ हजार ६४० रुपैया</b>	

**कुल खर्च रकम रु: ३० करोड ७२ लाख**

# आयोजनाको हालसम्मको खर्च र सोधभर्नाको अवस्था

Particulars	Budget (million USD)	%
<b>Cumulative</b>		
<b>Total project budget</b>	<b>80.00</b>	
Expenditure till date	3.90	4.875
Disbursement till date	3.24	4.05
<b>Current FY</b>		
<b>Allocated budget</b>	<b>14.71</b>	<b>18.39</b>
<b>Expenditure</b>		
IDA source only	0.79	<b>5.37</b>
IDA and GoN	0.96	<b>6.42</b>
<b>Disbursement</b>		
Q1	0.37	2.52
Q2	0.19	1.29
<b>Total disbursement</b>	<b>0.56</b>	<b>3.81</b>
Q3		
Disbursement request submitted	0.46 (NRs 5 crore 57 Lakhs)	3.13
Disbursement yet to be requested	0.14 (NRs 1 crore 74 Lakhs)	0.95

# Overall status of project Progress (%)

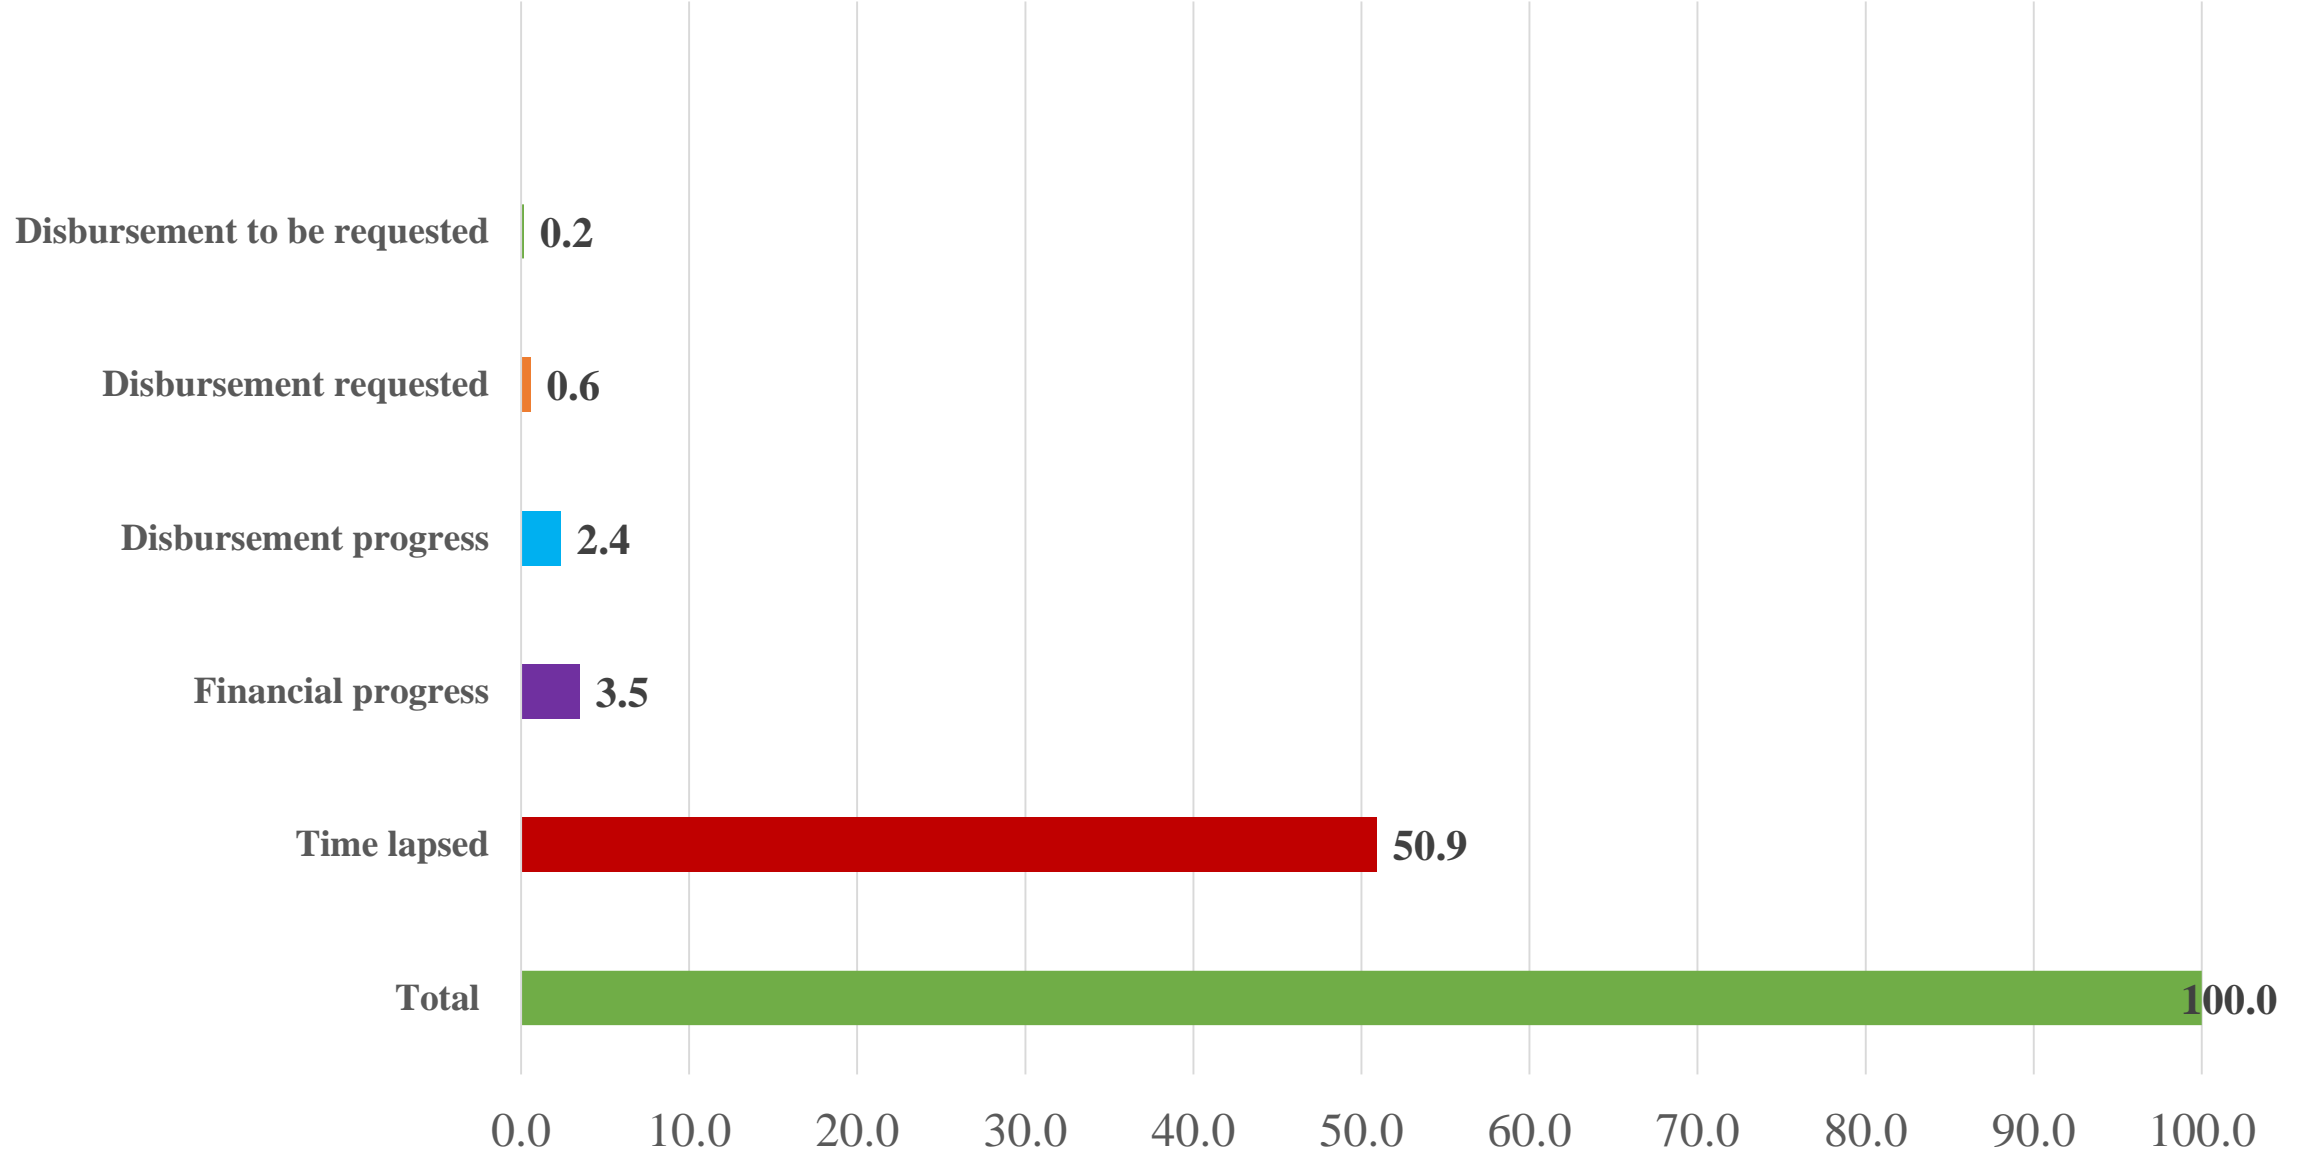

# बेरुजुको विवरण

बेरुजुको विवरण रकम रु हजारमा


क्र	कार्यालयको नाम	फर्छौट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम	फर्छौट भएको बेरुजु	फर्छौट प्रतिशत	
१	आयोजना निर्देशकको कार्यालय हरिहरभवन	०	०	०	
२	आर्थिक करिडोर कार्यालय, धनकुटा	०	०	०	
३	आर्थिक करिडोर कार्यालय, बर्दिवास	०	०	०	
४	आर्थिक करिडोर कार्यालय, बुटवल	१८८०००।०	०	०	
५	आर्थिक करिडोर कार्यालय, डडेल्धुरा	२१९२९८.००	०	०	
	जम्मा	४०७२९८/-	०	०	

# प्रगति नपुगको कारणहरु

क्र स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रगति नपुग हुनुका कारणहरु
१	पालिकास्तर कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र को DPR निर्माण	DPR तयारीका लागि परामर्शदाता संस्थासंग सम्झौता सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको । धनकुटा बुटवल र बर्दिवासमा निर्माणका लागि सूचना प्रकाशित भैसकेको ।
२.	प्रादेशिक बजारको DPR निर्माण	DPR तयारीका लागि परामर्शदाता संस्थासंग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य सन्चालन भैरहेको
३	CNA प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसार क्षमता विकास तालिम सन्चालन	प्रतिवेदन अनुसार तालिम कार्यक्रमहरु छनौट गरि दातृ निकायको लागि मिति २०७९ भाद्र ९ गते पठाइएकोमा प्राप्त सुझावहरु साथै चौथो मिसनमा प्राप्त सुझावहरु समेत समेटी पुन सहमतीका लागि पेश भएकोमा ढिलो गरि सहमती प्राप्त भएकाले लक्ष्य अनुसार तालिम सम्पन्न हुन नसकेको ।
४.	उत्पादक संस्था/साझेदारहरुलाई startup grant सहयोग	Grant Operating Manual मिति २०७९ फाल्गुण ८ गते स्जिकृती पश्चात अनुदानका लागि सूचना प्रवाह भएको
५.	प्राविधिक सहायता (Technical Assistance Firm) को परामर्श सेवा	हालसालै मात्र प्राविधिक परामर्शदाता फर्म छनौट भइ सम्झौता सम्पन्न भएकाले भुक्तानी हुन बाँकी

# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक



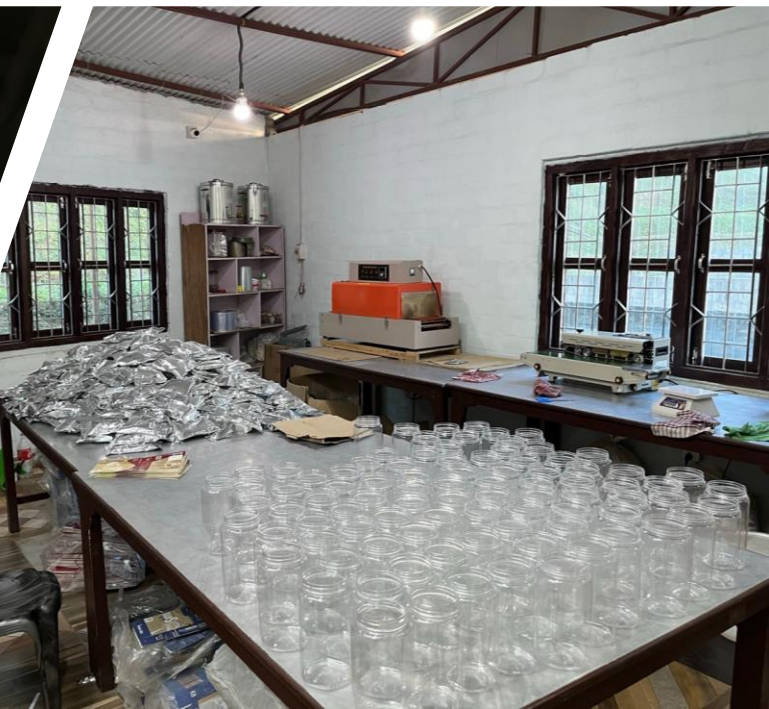











## Proposed MALSC Sites and Field visits by E and S safeguards team



Palungtar Municipality-4,  
Gorkha



Rajapur Municipality-4,  
Rautahat



Golanjor RM-3, Sindhuli



Patan Municipality-6, Baitadi



Madhyanepal Municipality-6,  
Lamjung



Khandadevi RM-6,  
Ramechhap



Annapurna RM-2, Kaski



Diktel Rupakot Majhuwagadi  
Mun-1, Khotang

## Proposed RMC Sites and Field Activities....



Duhabi Municipality, Sunsari

# Proposed RMC Sites and Field Activities....



Bardibas Municipality, Mahottari

# Joint monitoring with WB team



Koshi  
Province



# Joint monitoring with WB team



Madhesh  
Province



# Implementation and support review mission(ISRM)



# Monitoring and review meetings with intermediary Institution(OPD Hariharbhawan and Kaski



# Monitoring and review meetings with consulting firms(DPR preparation)



17-12-2023

# ECTCC र LCC बैठक बुटवल करिडोर



धन्यवाद
